


放射線量マップ【柏第七小学校】

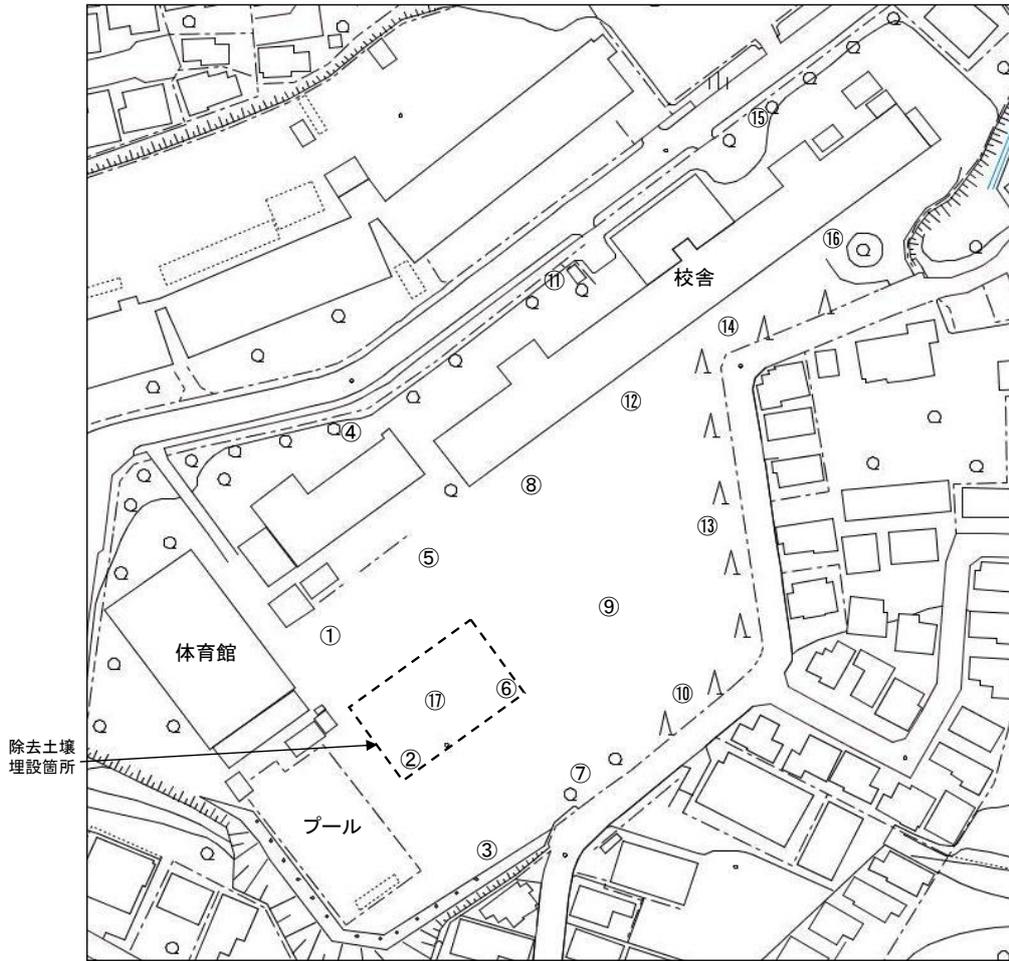

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成28年11月8日(前回:平成28年5月26日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.045	0.060	0.058	0.065	0.077	0.057
②	グラウンド	土	0.036	0.044	0.043	0.050	0.054	0.057
③	グラウンド	土	0.042	0.035	0.044	0.054	0.047	0.066
④	校舎裏	土	0.064	0.080	0.074	0.084	0.069	0.082
⑤	グラウンド	土	0.053	0.060	0.046	0.068	0.066	0.082
⑥	グラウンド	土	0.058	0.067	0.048	0.088	0.056	0.089
⑦	グラウンド	側溝	0.051	0.067	0.044	0.071	0.037	0.069
⑧	校舎前	土	0.060	0.061	0.045	0.046	0.057	0.049
⑨	グラウンド	土	0.061	0.065	0.063	0.055	0.062	0.055
⑩	グラウンド	土	0.055	0.058	0.058	0.055	0.046	0.045
⑪	校舎裏	土	0.063	0.063	0.057	0.074	0.062	0.080
⑫	校舎前	土	0.055	0.067	0.057	0.080	0.072	0.073
⑬	グラウンド	土	0.058	0.067	0.056	0.054	0.055	0.060
⑭	校舎前	アスファルト	0.078	0.087	0.086	0.106	0.079	0.102
⑮	校舎裏	土	0.069	0.087	0.054	0.110	0.083	0.089
⑯	校舎前	アスファルト	0.070	0.087	0.054	0.081	0.056	0.075
⑰	グラウンド	土	0.057	0.044	0.049	0.047	0.060	0.049
平均			0.057	0.065	0.055	0.070	0.061	0.069

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
