


放射線量マップ【逆井小学校】

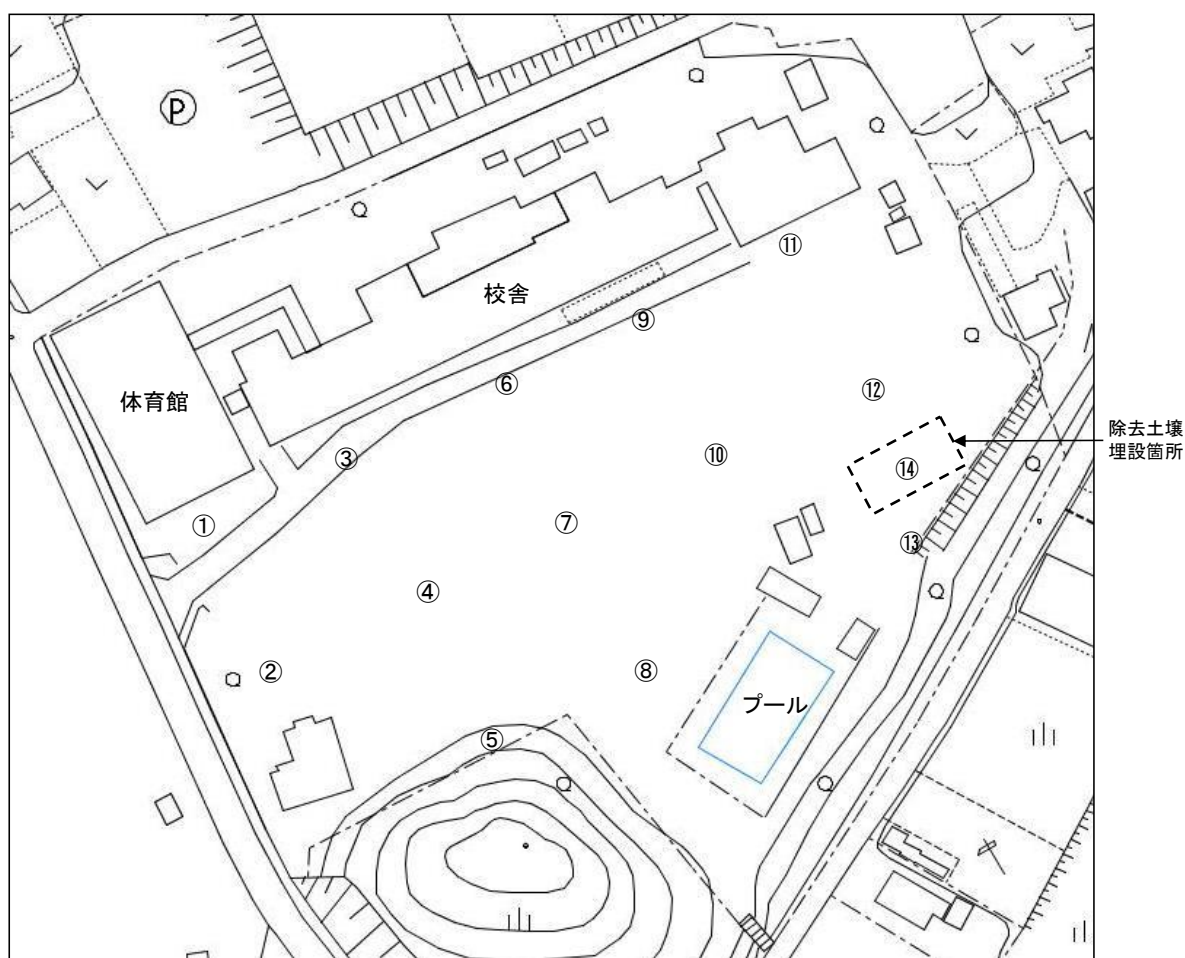

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成28年11月1日(前回:平成28年5月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.006	0.053	0.074	0.072	0.073	0.084
②	グラウンド	土	0.050	0.050	0.045	0.054	0.026	0.038
③	グラウンド	舗装	0.061	0.049	0.066	0.058	0.080	0.048
④	グラウンド	土	0.038	0.046	0.038	0.041	0.037	0.039
⑤	グラウンド	土	0.063	0.061	0.058	0.081	0.057	0.088
⑥	グラウンド	舗装	0.054	0.054	0.052	0.050	0.051	0.046
⑦	グラウンド	土	0.058	0.039	0.053	0.046	0.060	0.044
⑧	グラウンド	土	0.066	0.072	0.050	0.081	0.054	0.102
⑨	グラウンド	舗装	0.045	0.039	0.057	0.051	0.056	0.064
⑩	グラウンド	土	0.057	0.061	0.054	0.055	0.079	0.060
⑪	グラウンド	舗装	0.064	0.061	0.045	0.056	0.058	0.064
⑫	グラウンド	土	0.054	0.041	0.044	0.059	0.040	0.068
⑬	グラウンド	土	0.067	0.090	0.082	0.086	0.108	0.084
⑭	グラウンド	土	0.047	0.050	0.053	0.062	0.046	0.042
平均			0.052	0.055	0.055	0.061	0.059	0.062

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
