


放射線量マップ【高柳西小学校】

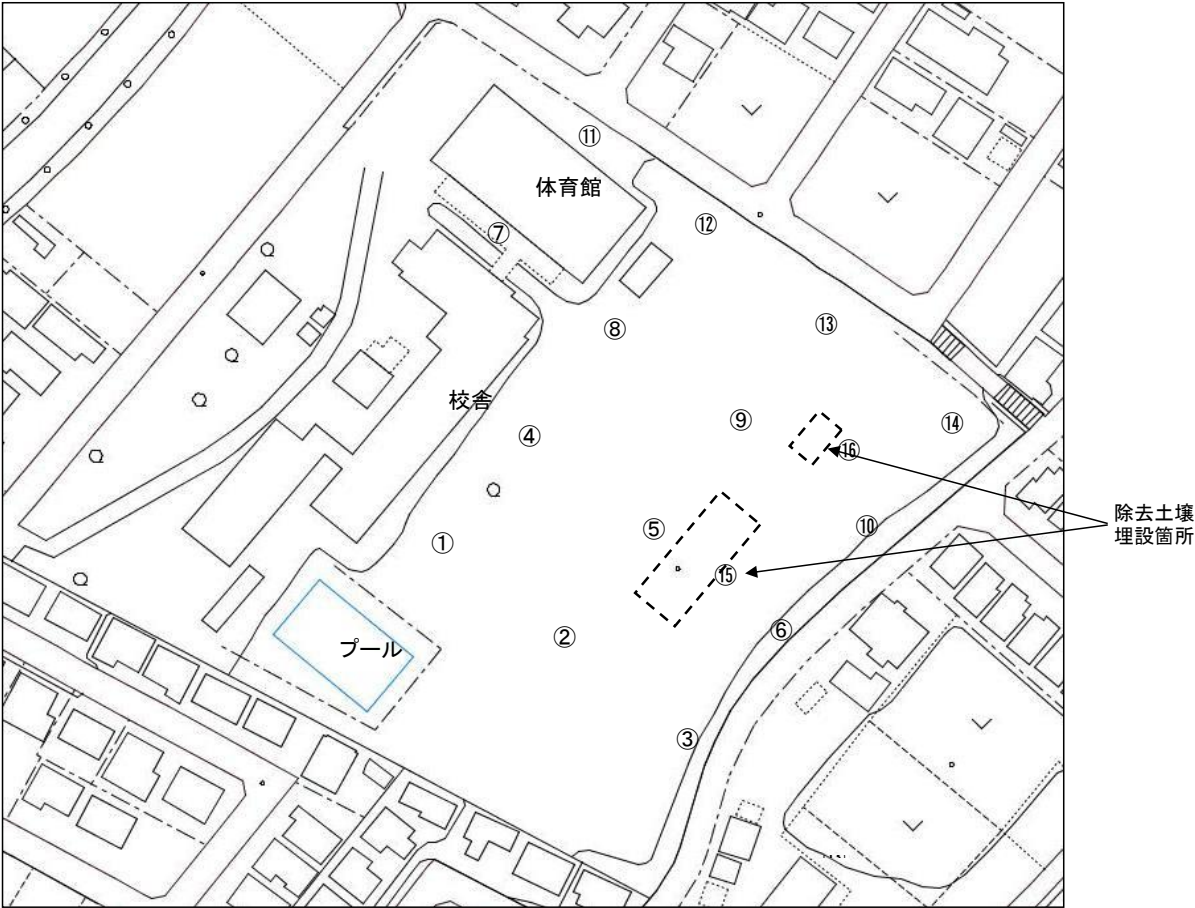

○除染完了日:平成24年7月12日
○測定日:平成28年11月10日(前回:平成28年5月19日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.048	0.038	0.026	0.058	0.033	0.051
②	グラウンド	土	0.080	0.073	0.076	0.075	0.071	0.088
③	グラウンド	土	0.047	0.067	0.036	0.043	0.042	0.044
④	グラウンド	土	0.062	0.056	0.063	0.072	0.055	0.074
⑤	グラウンド	土	0.031	0.047	0.038	0.053	0.041	0.039
⑥	グラウンド	土	0.041	0.048	0.047	0.047	0.047	0.047
⑦	グラウンド	舗装	0.046	0.056	0.075	0.077	0.075	0.087
⑧	グラウンド	土	0.040	0.047	0.039	0.051	0.047	0.038
⑨	グラウンド	土	0.051	0.063	0.064	0.052	0.039	0.047
⑩	グラウンド	土	0.038	0.046	0.038	0.046	0.046	0.054
⑪	グラウンド	舗装	0.056	0.065	0.049	0.051	0.053	0.053
⑫	グラウンド	土	0.056	0.050	0.053	0.068	0.046	0.050
⑬	グラウンド	土	0.075	0.051	0.081	0.049	0.079	0.039
⑭	グラウンド	土	0.034	0.037	0.056	0.031	0.032	0.042
⑮	グラウンド	土	0.038	0.035	0.050	0.056	0.044	0.050
⑯	グラウンド	土	0.041	0.046	0.045	0.051	0.046	0.051
平均			0.049	0.052	0.052	0.055	0.050	0.053

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
