


放射線量マップ【柏中学校】

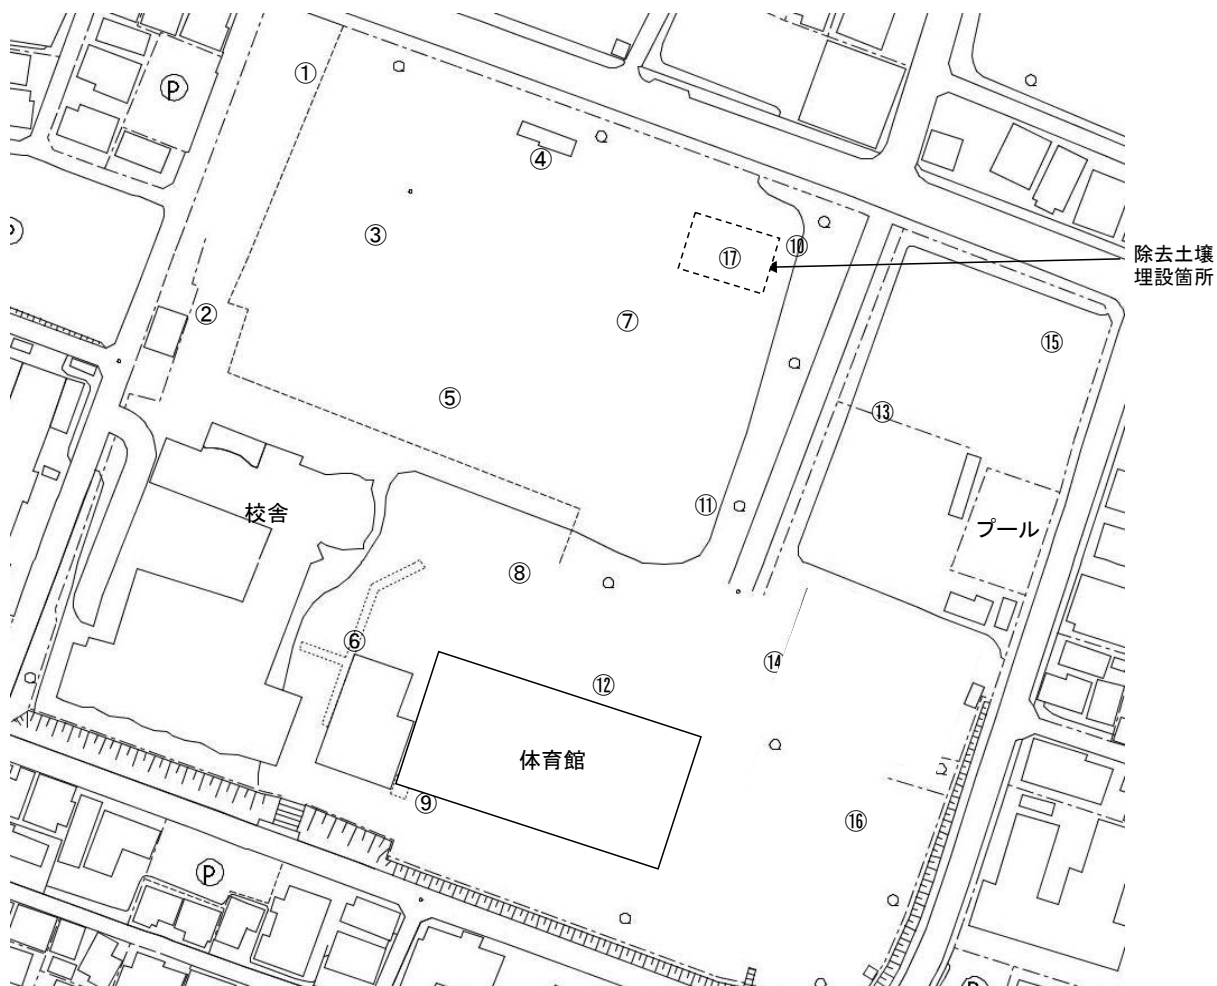

○除染完了日：平成24年11月29日

○測定日：平成29年5月29日（前回：平成28年11月21日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		今回	前回
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.092	0.092	0.076	0.101	0.117	0.105
②	グラウンド	土	0.101	0.062	0.085	0.086	0.095	0.090
③	グラウンド	土	0.088	0.082	0.088	0.080	0.098	0.078
④	グラウンド	土	0.070	0.088	0.078	0.086	0.084	0.080
⑤	グラウンド	土	0.082	0.069	0.074	0.076	0.063	0.090
⑥	校舎前	舗装	0.061	0.067	0.050	0.061	0.067	0.071
⑦	グラウンド	土	0.083	0.067	0.084	0.067	0.069	0.068
⑧	通路	舗装	0.067	0.060	0.063	0.054	0.054	0.071
⑨	体育館裏	土	0.045	0.036	0.053	0.034	0.047	0.042
⑩	グラウンド	土	0.080	0.070	0.073	0.087	0.062	0.073
⑪	グラウンド	土	0.089	0.089	0.092	0.098	0.095	0.089
⑫	体育館下	土	0.071	0.056	0.072	0.061	0.063	0.058
⑬	バレーコート	土	0.052	0.039	0.046	0.030	0.041	0.032
⑭	グラウンド	土	0.069	0.056	0.058	0.047	0.053	0.055
⑮	テニスコート	土	0.039	0.046	0.029	0.050	0.042	0.048
⑯	グラウンド	土	0.059	0.056	0.073	0.078	0.064	0.074
⑰	バスケコート	土	0.063	0.080	0.084	0.057	0.047	0.063
平均			0.071	0.066	0.069	0.068	0.068	0.070

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
