


### 放射線量マップ【風早北部小学校】

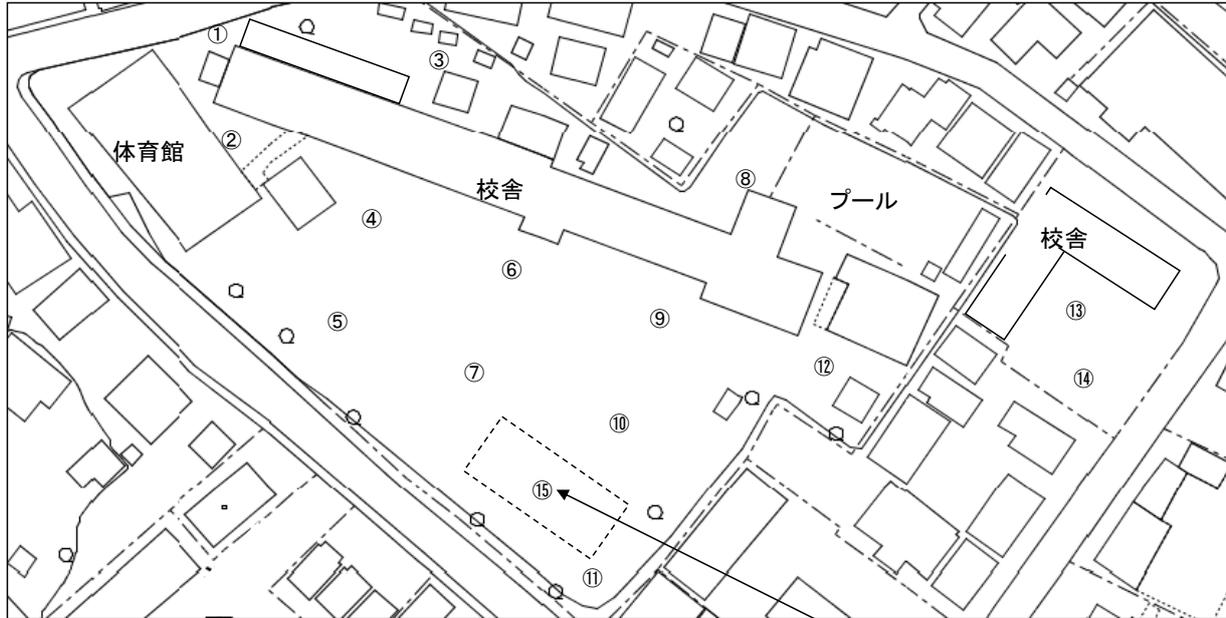

除去土壤  
埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成29年5月15日(前回:平成28年11月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.048	0.041	0.056	0.064	0.051	0.052
②	校舎前	土	0.073	0.075	0.086	0.081	0.087	0.080
③	校舎裏	舗装	0.069	0.067	0.069	0.067	0.065	0.072
④	校舎前	土	0.046	0.059	0.042	0.058	0.031	0.045
⑤	グラウンド	土	0.047	0.036	0.057	0.040	0.059	0.032
⑥	校舎前	土	0.038	0.061	0.047	0.058	0.043	0.044
⑦	グラウンド	土	0.035	0.045	0.042	0.044	0.040	0.041
⑧	校舎裏	舗装	0.062	0.060	0.086	0.087	0.076	0.068
⑨	校舎前	土	0.054	0.047	0.076	0.059	0.063	0.073
⑩	グラウンド	土	0.038	0.040	0.035	0.043	0.030	0.030
⑪	グラウンド	側溝	0.057	0.059	0.065	0.061	0.048	0.044
⑫	校舎前	土	0.064	0.055	0.049	0.042	0.053	0.040
⑬	グラウンド	人工芝	0.062	0.066	0.054	0.066	0.069	0.058
⑭	グラウンド	人工芝	0.078	0.057	0.071	0.070	0.064	0.065
⑮	グラウンド	土	0.043	0.043	0.053	0.036	0.045	0.050
平均			0.054	0.054	0.059	0.058	0.055	0.053

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
