


放射線量マップ【柏第五小学校】

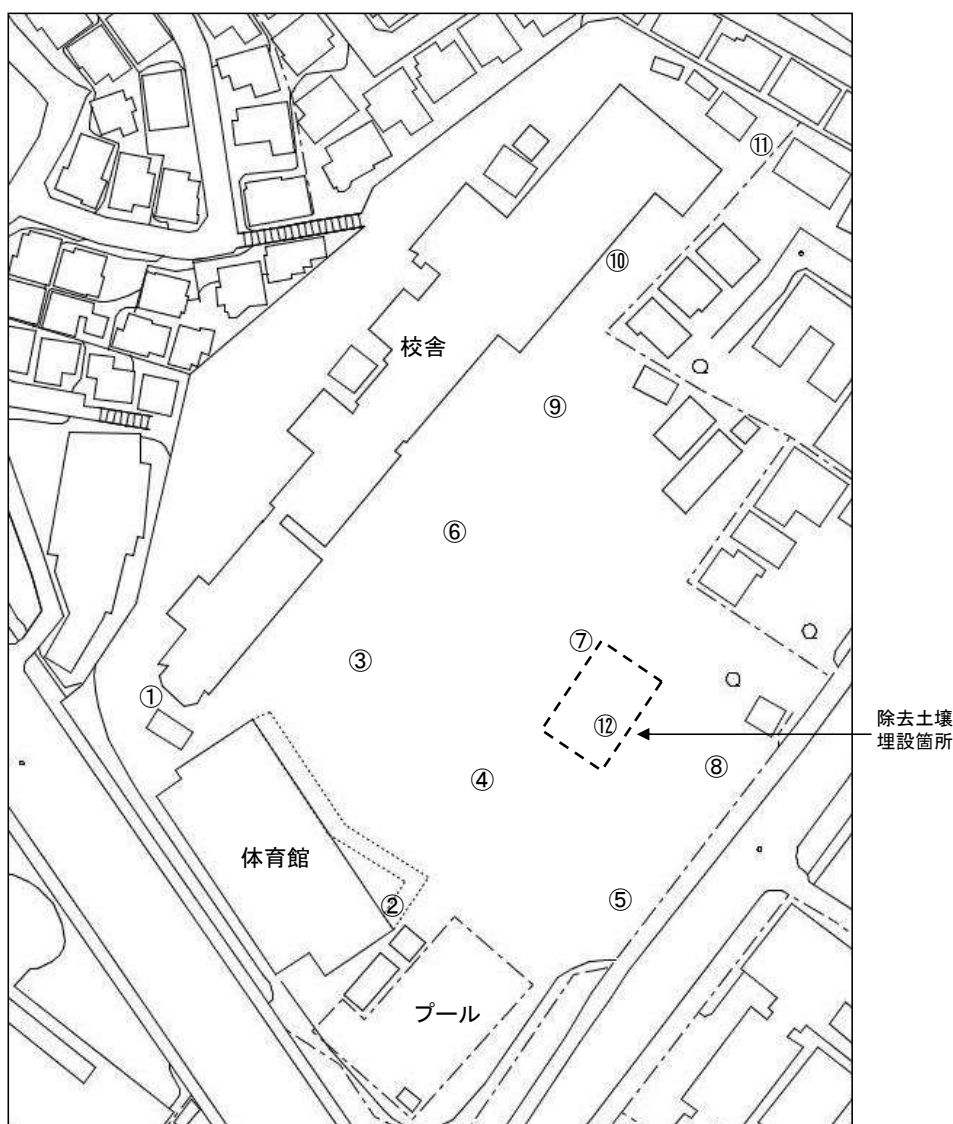

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年12月20日(前回:平成29年5月18日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.055	0.061	0.058	0.047	0.045	0.050
②	体育館前	土	0.058	0.053	0.068	0.072	0.061	0.052
③	グラウンド	土	0.033	0.049	0.049	0.047	0.040	0.050
④	グラウンド	土	0.028	0.031	0.026	0.036	0.034	0.032
⑤	グラウンド	土	0.023	0.036	0.048	0.041	0.051	0.043
⑥	グラウンド	土	0.046	0.031	0.041	0.030	0.051	0.040
⑦	グラウンド	土	0.034	0.028	0.027	0.029	0.041	0.030
⑧	グラウンド	土	0.044	0.044	0.039	0.062	0.043	0.056
⑨	グラウンド	土	0.032	0.042	0.037	0.042	0.050	0.055
⑩	校舎前	土	0.063	0.055	0.061	0.063	0.062	0.054
⑪	校舎横	舗装	0.066	0.059	0.071	0.080	0.072	0.069
⑫	グラウンド	土	0.025	0.036	0.033	0.043	0.035	0.028
平均			0.042	0.044	0.047	0.049	0.049	0.047

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
