


放射線量マップ【土小学校】

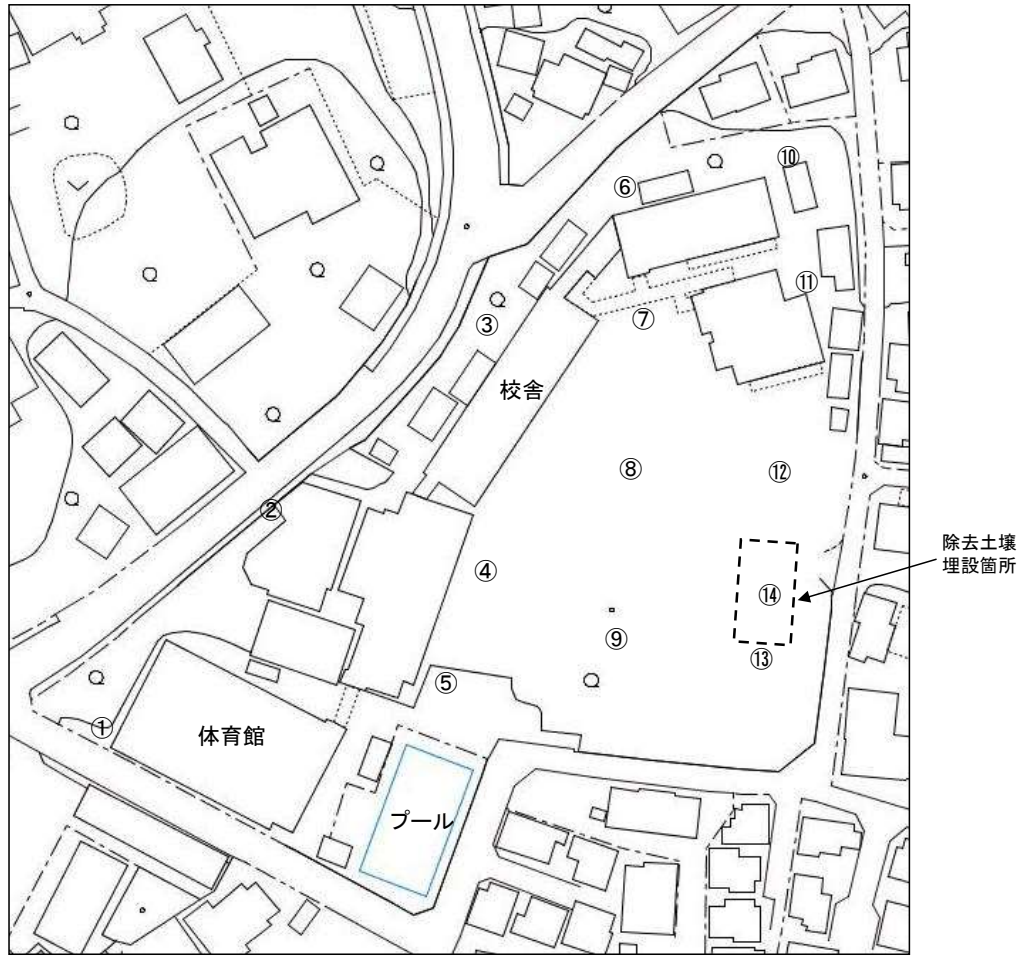

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年12月8日(前回:平成29年5月23日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.062	0.069	0.072	0.074	0.100	0.086
②	校舎前	アスファルト	0.078	0.032	0.057	0.081	0.059	0.065
③	校舎前	土	0.066	0.101	0.059	0.094	0.068	0.088
④	グラウンド	土	0.053	0.053	0.049	0.064	0.043	0.064
⑤	グラウンド	池横の芝	0.065	0.069	0.085	0.100	0.092	0.122
⑥	校舎裏	土	0.067	0.065	0.068	0.079	0.083	0.093
⑦	校舎前	土	0.063	0.099	0.051	0.093	0.056	0.160
⑧	グラウンド	土	0.048	0.042	0.041	0.053	0.049	0.056
⑨	グラウンド	土	0.036	0.066	0.048	0.059	0.051	0.073
⑩	グラウンド	土	0.125	0.088	0.137	0.090	0.160	0.108
⑪	校舎前	土	0.096	0.084	0.091	0.115	0.104	0.093
⑫	グラウンド	アスファルト	0.053	0.050	0.063	0.067	0.068	0.061
⑬	グラウンド	土	0.067	0.056	0.049	0.050	0.059	0.048
⑭	グラウンド	土	0.057	0.056	0.056	0.053	0.047	0.045
平均			0.067	0.066	0.066	0.077	0.074	0.083

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
