


放射線量マップ【市立柏高等学校】

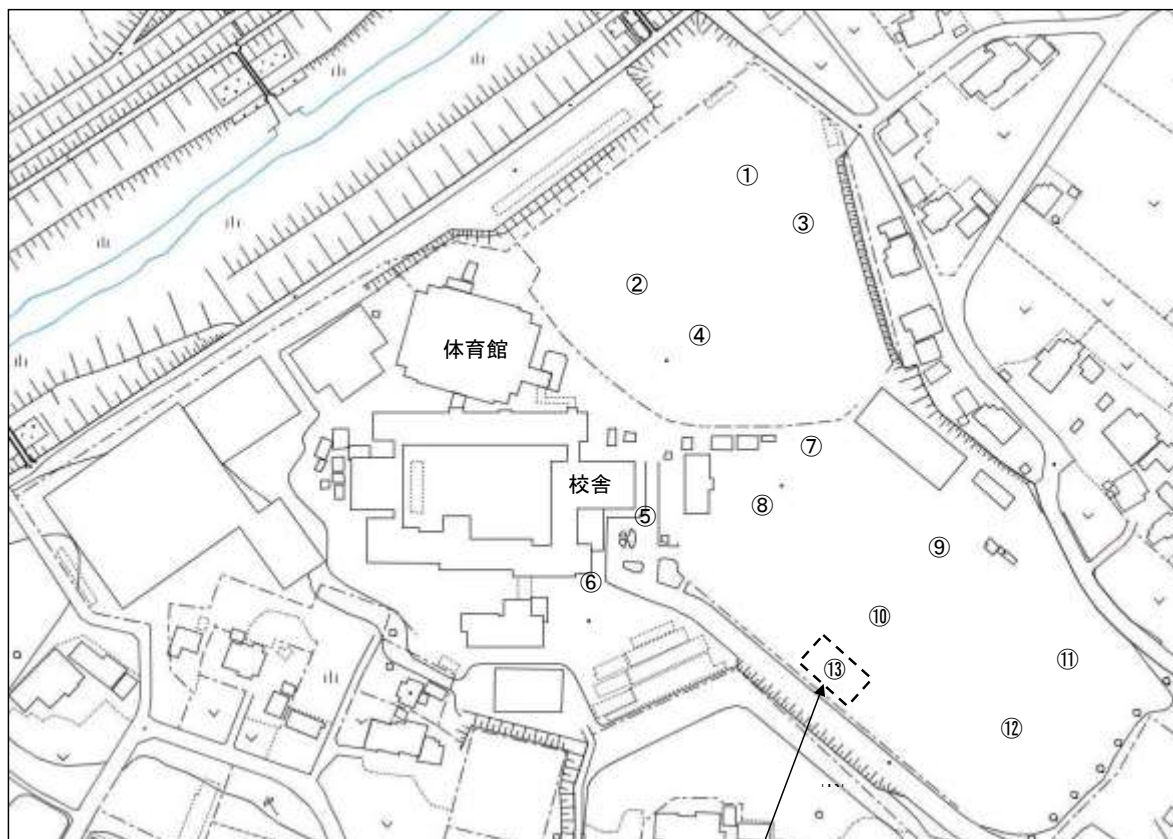

除去土壤
埋設箇所

○除染完了日:平成25年2月23日

○測定日:平成29年11月29日(前回:平成29年5月30日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | ※2柏市目標 | | | |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | 野球場 | 土 | 0.068 | 0.080 | 0.064 | 0.090 | 0.076 | 0.075 |
| ② | 野球場 | 土 | 0.089 | 0.094 | 0.091 | 0.092 | 0.076 | 0.095 |
| ③ | 野球場 | 土 | 0.099 | 0.076 | 0.098 | 0.065 | 0.096 | 0.062 |
| ④ | 野球場 | 土 | 0.063 | 0.097 | 0.058 | 0.075 | 0.073 | 0.090 |
| ⑤ | 通路 | 舗装 | 0.083 | 0.080 | 0.094 | 0.069 | 0.090 | 0.052 |
| ⑥ | 通路 | 舗装 | 0.089 | 0.083 | 0.073 | 0.096 | 0.081 | 0.098 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.087 | 0.082 | 0.097 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.103 | 0.103 | 0.111 | 0.107 | 0.132 | 0.113 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.101 | 0.102 | 0.097 | 0.104 | 0.097 | 0.108 |
| ⑩ | グラウンド | 土 | 0.105 | 0.085 | 0.111 | 0.081 | 0.086 | 0.100 |
| ⑪ | グラウンド | 土 | 0.093 | 0.109 | 0.110 | 0.088 | 0.101 | 0.102 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.088 | 0.101 | 0.094 | 0.105 | 0.089 | 0.107 |
| ⑬ | グラウンド | 土 | 0.110 | 0.098 | 0.095 | 0.090 | 0.106 | 0.099 |
| 平均 | | | 0.091 | 0.093 | 0.092 | 0.088 | 0.091 | 0.092 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
