


### 放射線量マップ【高田小学校】

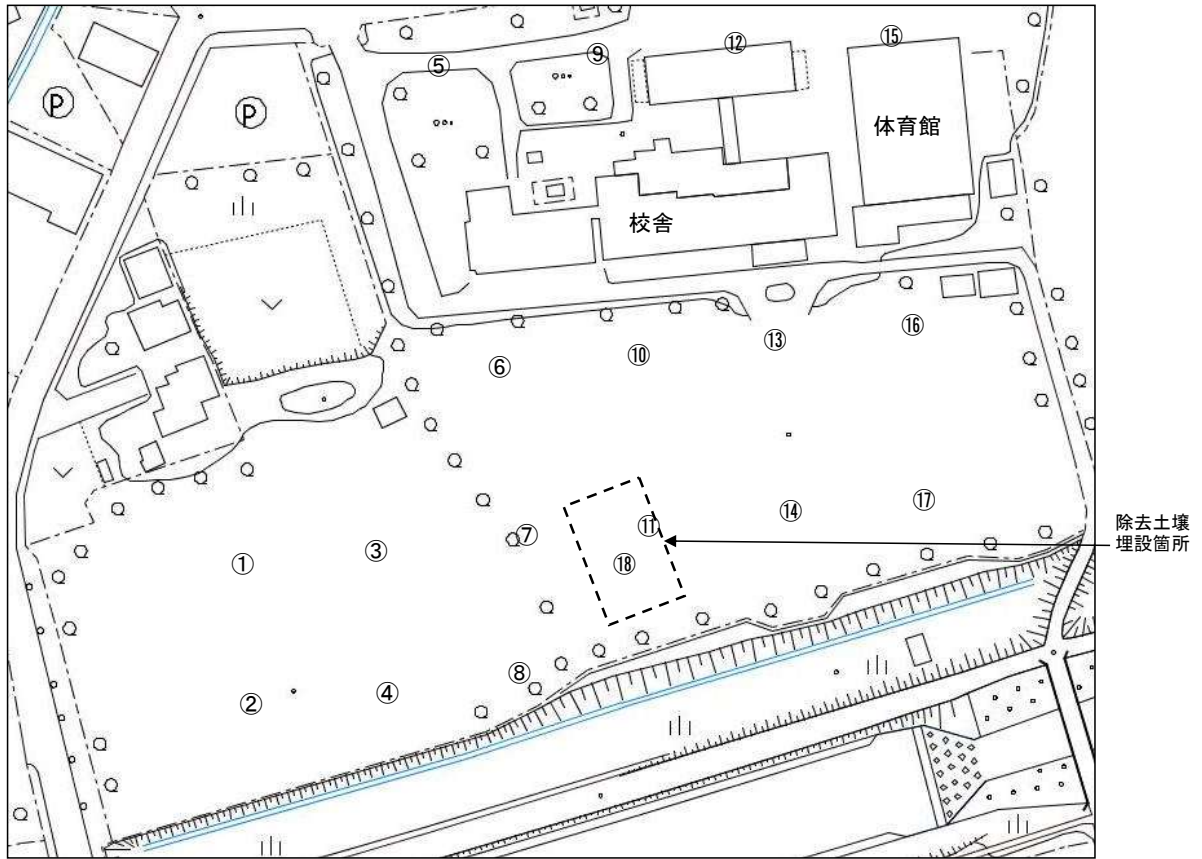

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年11月24日(前回:平成29年5月19日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.056	0.056	0.055	0.065	0.051	0.051
②	グラウンド	土	0.076	0.055	0.084	0.075	0.074	0.065
③	グラウンド	土	0.059	0.044	0.065	0.042	0.078	0.049
④	グラウンド	土	0.046	0.052	0.040	0.045	0.040	0.056
⑤	花壇付近	土	0.049	0.057	0.057	0.073	0.056	0.088
⑥	グラウンド	土	0.039	0.052	0.047	0.059	0.030	0.050
⑦	グラウンド	土	0.052	0.037	0.054	0.048	0.041	0.038
⑧	グラウンド	土	0.058	0.099	0.037	0.087	0.060	0.092
⑨	花壇脇	土	0.058	0.059	0.049	0.051	0.053	0.042
⑩	グラウンド	土	0.037	0.058	0.045	0.057	0.050	0.056
⑪	グラウンド	土	0.040	0.028	0.032	0.040	0.037	0.032
⑫	校舎裏	土	0.049	0.064	0.054	0.055	0.074	0.041
⑬	グラウンド	土	0.047	0.041	0.033	0.040	0.031	0.035
⑭	グラウンド	土	0.049	0.037	0.034	0.036	0.045	0.043
⑮	体育館裏	土	0.063	0.050	0.071	0.051	0.083	0.061
⑯	グラウンド	土	0.050	0.038	0.035	0.030	0.054	0.033
⑰	グラウンド	土	0.045	0.058	0.042	0.058	0.049	0.046
⑱	グラウンド	土	0.034	0.035	0.034	0.036	0.036	0.043
平均			0.050	0.051	0.048	0.053	0.052	0.051

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
