


放射線量マップ【増尾西小学校】

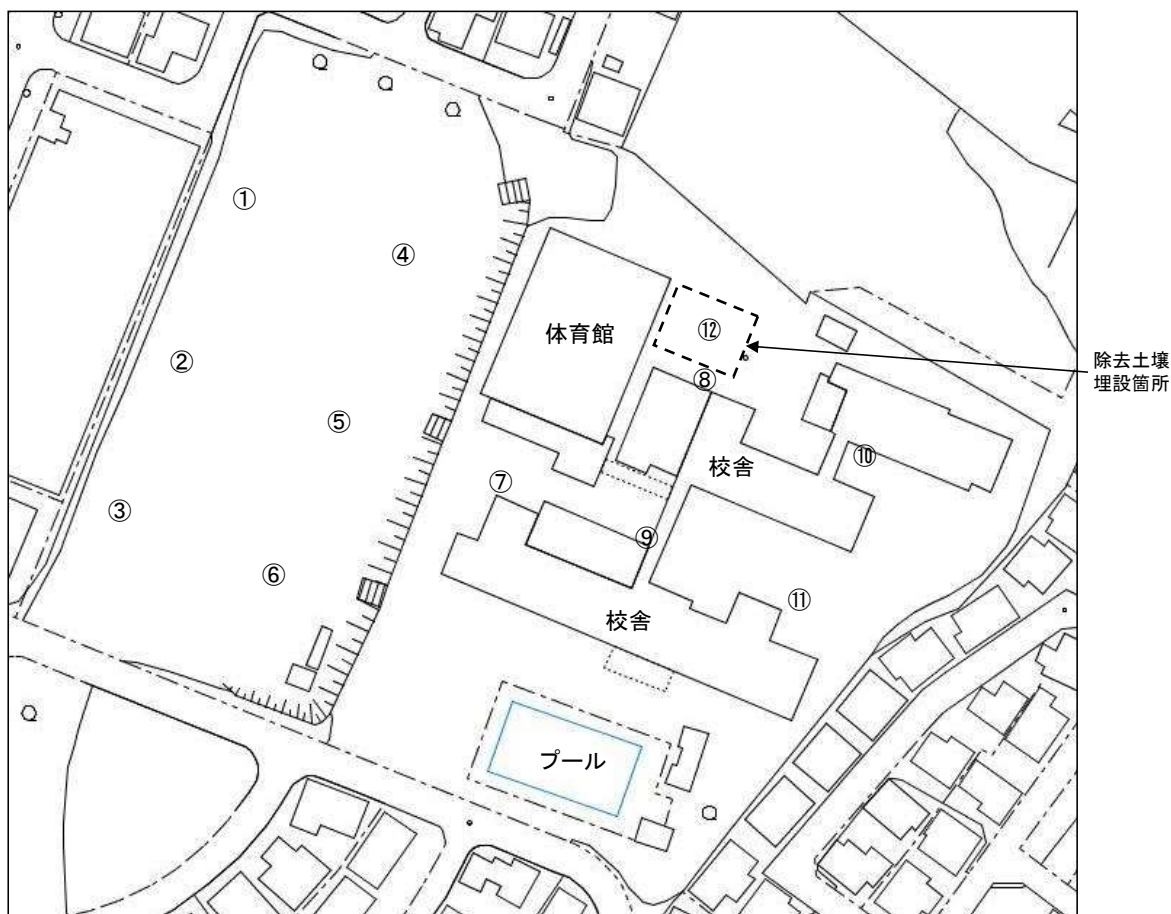

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成29年12月7日(前回:平成29年5月24日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.092	0.098	0.082	0.067	0.092	0.119
②	グラウンド	土	0.091	0.082	0.074	0.094	0.096	0.082
③	グラウンド	土	0.086	0.057	0.079	0.054	0.090	0.064
④	グラウンド	土	0.080	0.086	0.097	0.088	0.011	0.086
⑤	グラウンド	土	0.063	0.076	0.071	0.108	0.091	0.094
⑥	グラウンド	土	0.071	0.082	0.082	0.072	0.088	0.078
⑦	校舎前	舗装	0.068	0.089	0.051	0.090	0.033	0.079
⑧	校舎前	土	0.085	0.085	0.073	0.082	0.093	0.092
⑨	校舎前	舗装	0.069	0.072	0.105	0.089	0.077	0.080
⑩	校舎前	土	0.083	0.090	0.094	0.098	0.104	0.117
⑪	校舎前	土	0.066	0.087	0.063	0.106	0.066	0.114
⑫	校舎前	土	0.073	0.053	0.068	0.045	0.051	0.066
平均			0.077	0.080	0.078	0.083	0.074	0.089

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
