


### 放射線量マップ【花野井小学校】

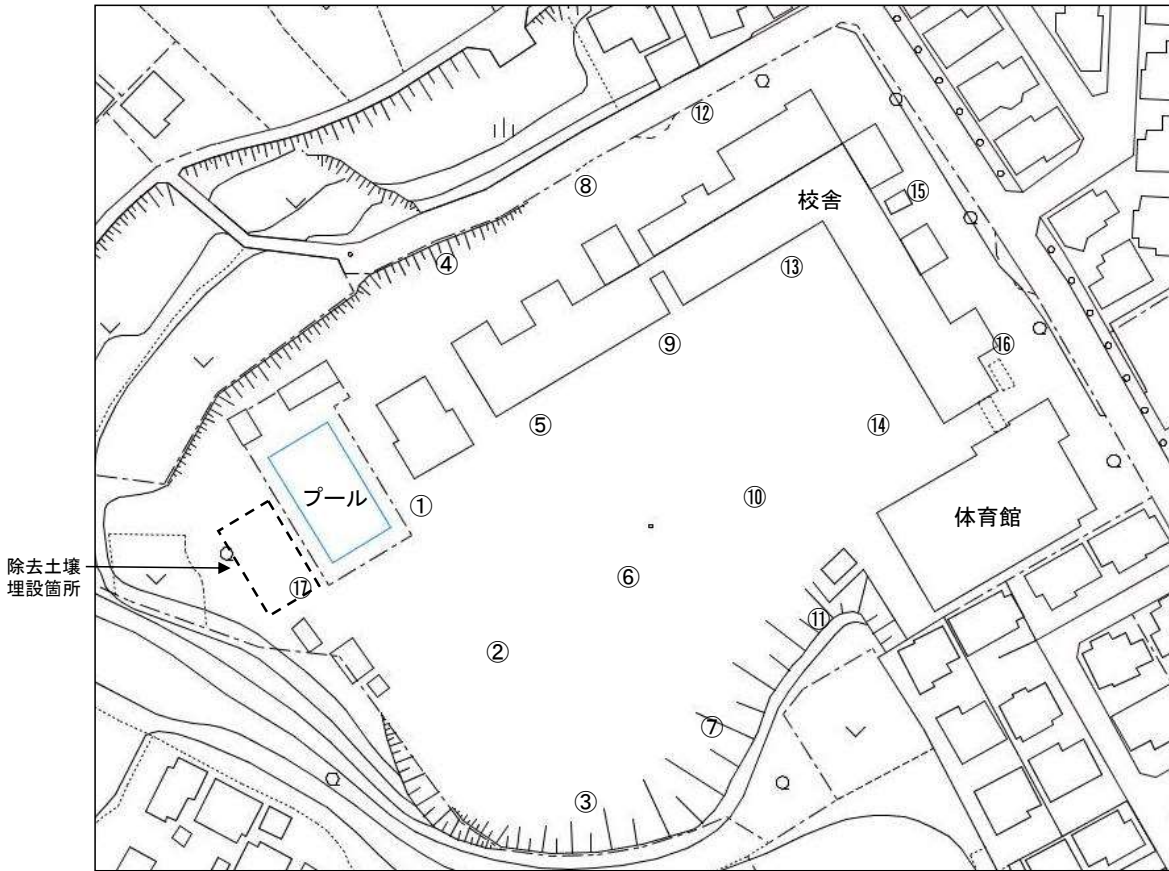

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成29年11月22日(前回:平成29年5月25日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |        | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |        | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |        | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | プール前  | 土      | 0.082   | 0.066 | 0.084 | 0.094 | 0.089  | 0.071 |
| ②    | グラウンド | 土      | 0.049   | 0.064 | 0.050 | 0.042 | 0.052  | 0.051 |
| ③    | グラウンド | 土      | 0.072   | 0.034 | 0.047 | 0.046 | 0.064  | 0.057 |
| ④    | 校舎裏   | 土      | 0.048   | 0.051 | 0.046 | 0.046 | 0.043  | 0.036 |
| ⑤    | 校舎前   | 土      | 0.066   | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.043  | 0.038 |
| ⑥    | グラウンド | 土      | 0.040   | 0.053 | 0.054 | 0.065 | 0.044  | 0.059 |
| ⑦    | グラウンド | 土      | 0.083   | 0.092 | 0.085 | 0.091 | 0.058  | 0.077 |
| ⑧    | 校舎裏   | アスファルト | 0.045   | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.045  | 0.043 |
| ⑨    | 校舎前   | 土      | 0.045   | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.055  | 0.062 |
| ⑩    | グラウンド | 土      | 0.041   | 0.039 | 0.051 | 0.037 | 0.064  | 0.049 |
| ⑪    | グラウンド | 土      | 0.053   | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.057  | 0.054 |
| ⑫    | 校舎裏   | アスファルト | 0.075   | 0.061 | 0.067 | 0.066 | 0.072  | 0.052 |
| ⑬    | 校舎前   | 土      | 0.061   | 0.060 | 0.054 | 0.070 | 0.074  | 0.049 |
| ⑭    | グラウンド | 土      | 0.063   | 0.047 | 0.059 | 0.057 | 0.045  | 0.036 |
| ⑮    | 校舎裏   | アスファルト | 0.056   | 0.054 | 0.060 | 0.057 | 0.062  | 0.075 |
| ⑯    | 校舎裏   | アスファルト | 0.051   | 0.057 | 0.049 | 0.070 | 0.055  | 0.057 |
| ⑰    | プール裏  | 土      | 0.073   | 0.075 | 0.080 | 0.082 | 0.072  | 0.098 |
| 平均   |       |        | 0.059   | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.058  | 0.057 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
