


### 放射線量マップ【手賀西小学校】

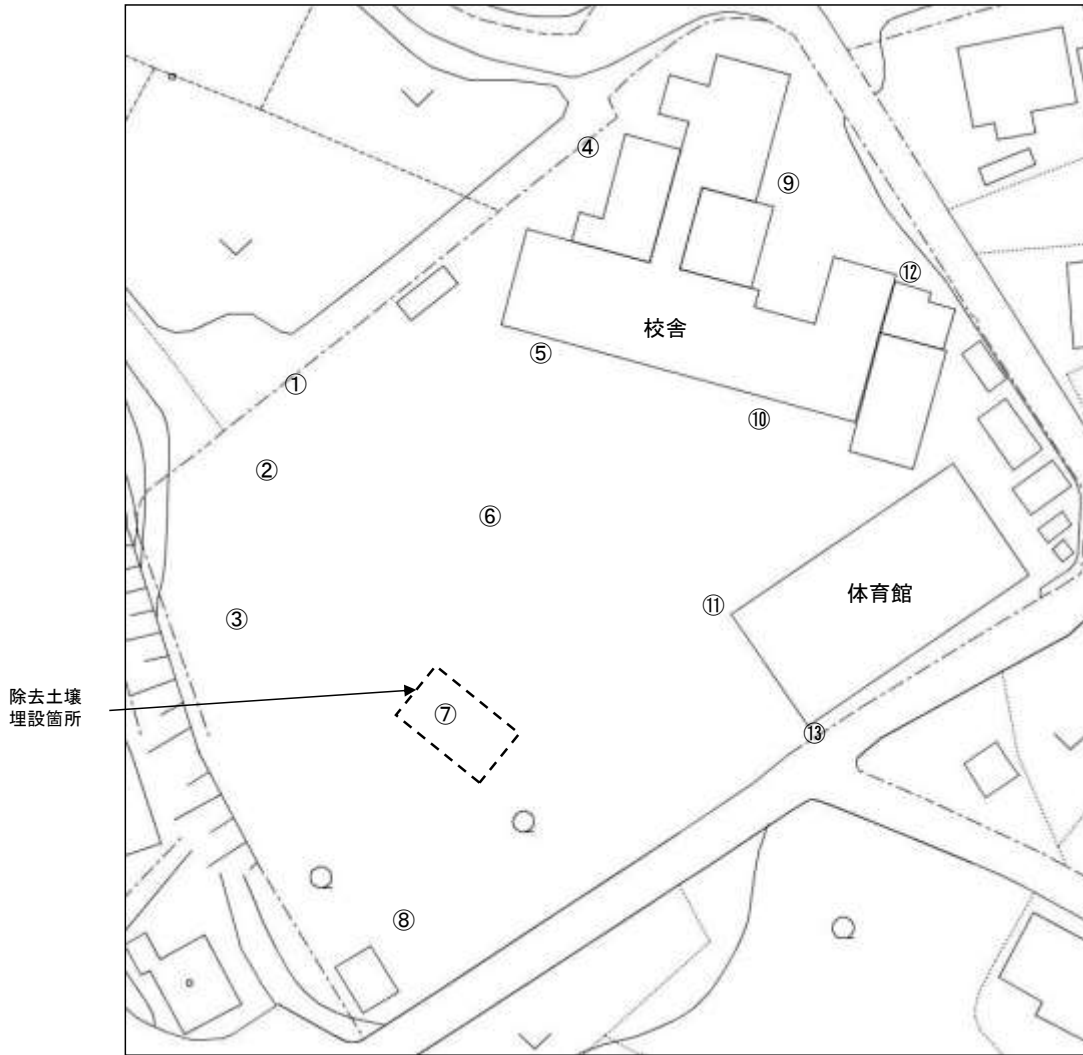

○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成29年12月11日(前回：平成29年5月22日) (単位：マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土  | 0.070   | 0.035 | 0.060 | 0.045 | 0.060  | 0.058 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.050   | 0.045 | 0.060 | 0.031 | 0.060  | 0.045 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.040   | 0.049 | 0.040 | 0.051 | 0.050  | 0.061 |
| ④    | 校舎裏   | 舗装 | 0.050   | 0.067 | 0.050 | 0.045 | 0.060  | 0.057 |
| ⑤    | 校舎前   | 土  | 0.060   | 0.057 | 0.060 | 0.064 | 0.060  | 0.044 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.030   | 0.034 | 0.040 | 0.041 | 0.050  | 0.036 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.040   | 0.049 | 0.040 | 0.053 | 0.040  | 0.057 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.050   | 0.056 | 0.050 | 0.049 | 0.040  | 0.039 |
| ⑨    | 校舎裏   | 舗装 | 0.080   | 0.067 | 0.080 | 0.072 | 0.080  | 0.074 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.060   | 0.077 | 0.060 | 0.058 | 0.040  | 0.045 |
| ⑪    | グラウンド | 舗装 | 0.060   | 0.054 | 0.050 | 0.055 | 0.060  | 0.045 |
| ⑫    | 校舎裏   | 側溝 | 0.080   | 0.067 | 0.090 | 0.077 | 0.100  | 0.089 |
| ⑬    | 体育館前  | 側溝 | 0.070   | 0.062 | 0.080 | 0.069 | 0.070  | 0.069 |
| 平均   |       |    | 0.057   | 0.055 | 0.058 | 0.055 | 0.059  | 0.055 |

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
