


放射線量マップ【手賀東小学校】

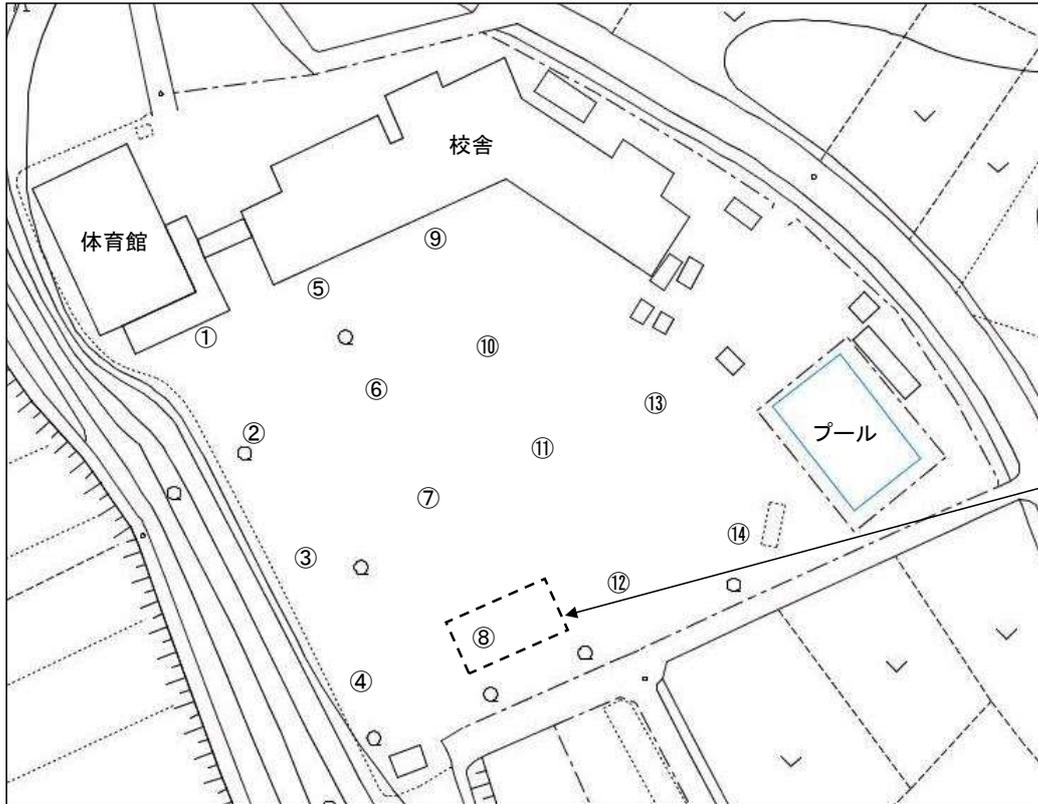

除去土壌埋設箇所

○除染完了日:平成24年6月28日

○測定日:平成29年12月11日(前回:平成29年5月22日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.050	0.072	0.070	0.082	0.060	0.107
②	グラウンド	土	0.050	0.060	0.060	0.081	0.060	0.074
③	グラウンド	土	0.050	0.056	0.050	0.061	0.070	0.055
④	グラウンド	土	0.060	0.077	0.060	0.064	0.060	0.088
⑤	グラウンド	舗装	0.050	0.065	0.060	0.063	0.060	0.067
⑥	グラウンド	土	0.050	0.043	0.040	0.050	0.050	0.060
⑦	グラウンド	土	0.040	0.037	0.040	0.041	0.030	0.040
⑧	グラウンド	土	0.050	0.050	0.040	0.049	0.060	0.050
⑨	グラウンド	舗装	0.050	0.066	0.050	0.061	0.070	0.065
⑩	グラウンド	土	0.050	0.047	0.050	0.037	0.060	0.059
⑪	グラウンド	土	0.050	0.026	0.050	0.034	0.050	0.040
⑫	グラウンド	土	0.040	0.024	0.030	0.037	0.030	0.039
⑬	グラウンド	土	0.040	0.032	0.040	0.042	0.040	0.025
⑭	グラウンド	土	0.040	0.033	0.050	0.044	0.050	0.048
平均			0.048	0.049	0.049	0.053	0.054	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
