


放射線量マップ【柏第三小学校】

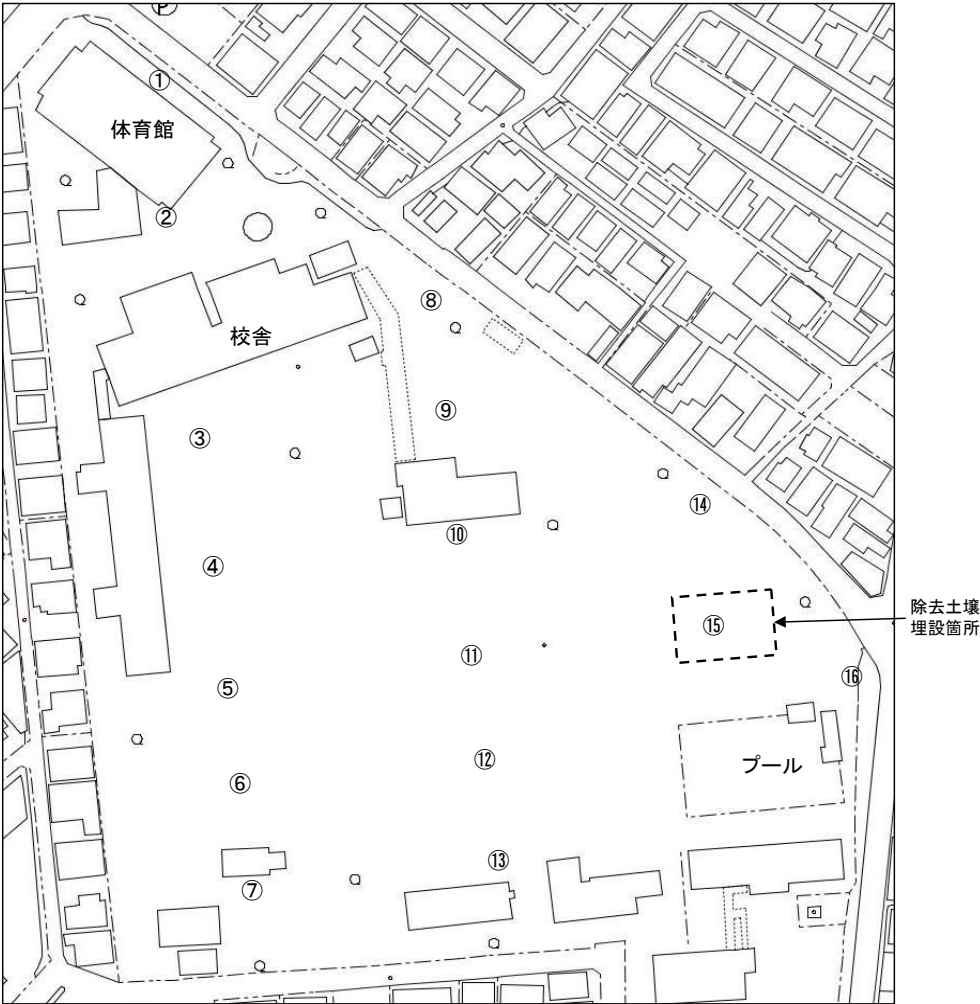

○除染完了日:平成24年3月29日
○測定日:平成30年 5月 29日(前回:平成29年11月22日)単位:マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館周り	アスファルト	0.068	0.067	0.070	0.048	0.058	0.066
②	体育館周り	コンクリート	0.057	0.067	0.070	0.074	0.061	0.053
③	校舎前	土	0.058	0.064	0.072	0.058	0.061	0.055
④	グラウンド	土	0.062	0.062	0.055	0.066	0.053	0.072
⑤	グラウンド	土	0.046	0.045	0.048	0.047	0.046	0.042
⑥	グラウンド	土	0.051	0.056	0.040	0.057	0.034	0.040
⑦	グラウンド	土	0.070	0.085	0.084	0.084	0.111	0.112
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.057	0.058	0.059	0.057	0.071	0.055
⑨	グラウンド	土	0.040	0.051	0.041	0.045	0.044	0.054
⑩	校舎前	土	0.056	0.048	0.048	0.049	0.060	0.042
⑪	グラウンド	土	0.023	0.037	0.040	0.044	0.042	0.042
⑫	グラウンド	土	0.049	0.033	0.032	0.041	0.051	0.032
⑬	グラウンド	土	0.056	0.038	0.035	0.042	0.046	0.033
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.064	0.048	0.077	0.048	0.060	0.059
⑮	グラウンド	土	0.045	0.038	0.050	0.041	0.049	0.043
⑯	プール横	アスファルト	0.050	0.057	0.063	0.045	0.069	0.027
平均			0.053	0.053	0.055	0.053	0.057	0.052

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
