


放射線量マップ【柏第五小学校】

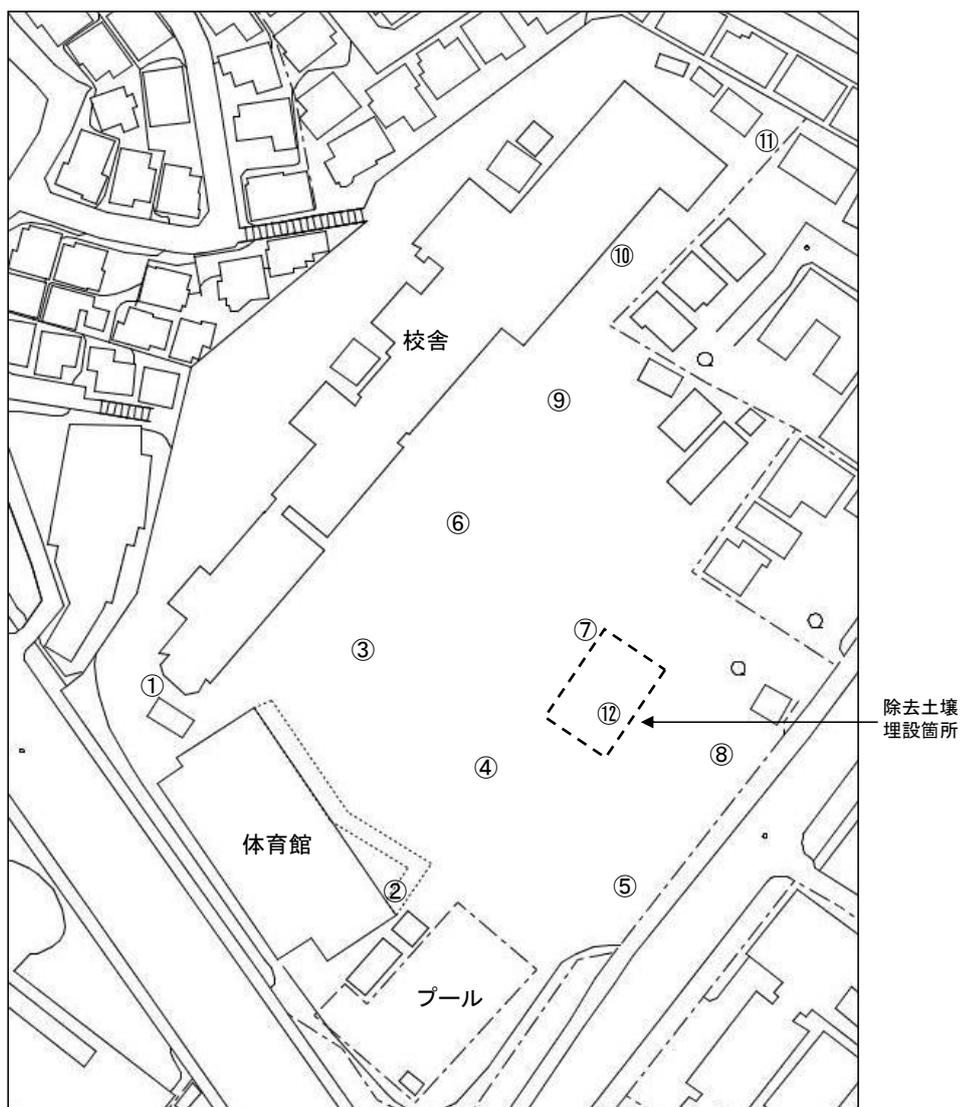

○除染完了日：平成24年8月30日

○測定日：平成30年 5月 29日(前回：平成29年12月20日)単位：マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎横	土	0.058	0.055	0.036	0.058	0.076	0.045
②	体育館前	土	0.038	0.058	0.055	0.068	0.038	0.061
③	グラウンド	土	0.030	0.033	0.036	0.049	0.025	0.040
④	グラウンド	土	0.026	0.028	0.028	0.026	0.041	0.034
⑤	グラウンド	土	0.037	0.023	0.045	0.048	0.032	0.051
⑥	グラウンド	土	0.039	0.046	0.033	0.041	0.047	0.051
⑦	グラウンド	土	0.026	0.034	0.036	0.027	0.036	0.041
⑧	グラウンド	土	0.048	0.044	0.031	0.039	0.047	0.043
⑨	グラウンド	土	0.055	0.032	0.058	0.037	0.056	0.050
⑩	校舎前	土	0.062	0.063	0.050	0.061	0.052	0.062
⑪	校舎横	舗装	0.077	0.066	0.061	0.071	0.073	0.072
⑫	グラウンド	土	0.034	0.025	0.028	0.033	0.043	0.035
平均			0.044	0.042	0.041	0.047	0.047	0.049

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
