


放射線量マップ【柏第七小学校】

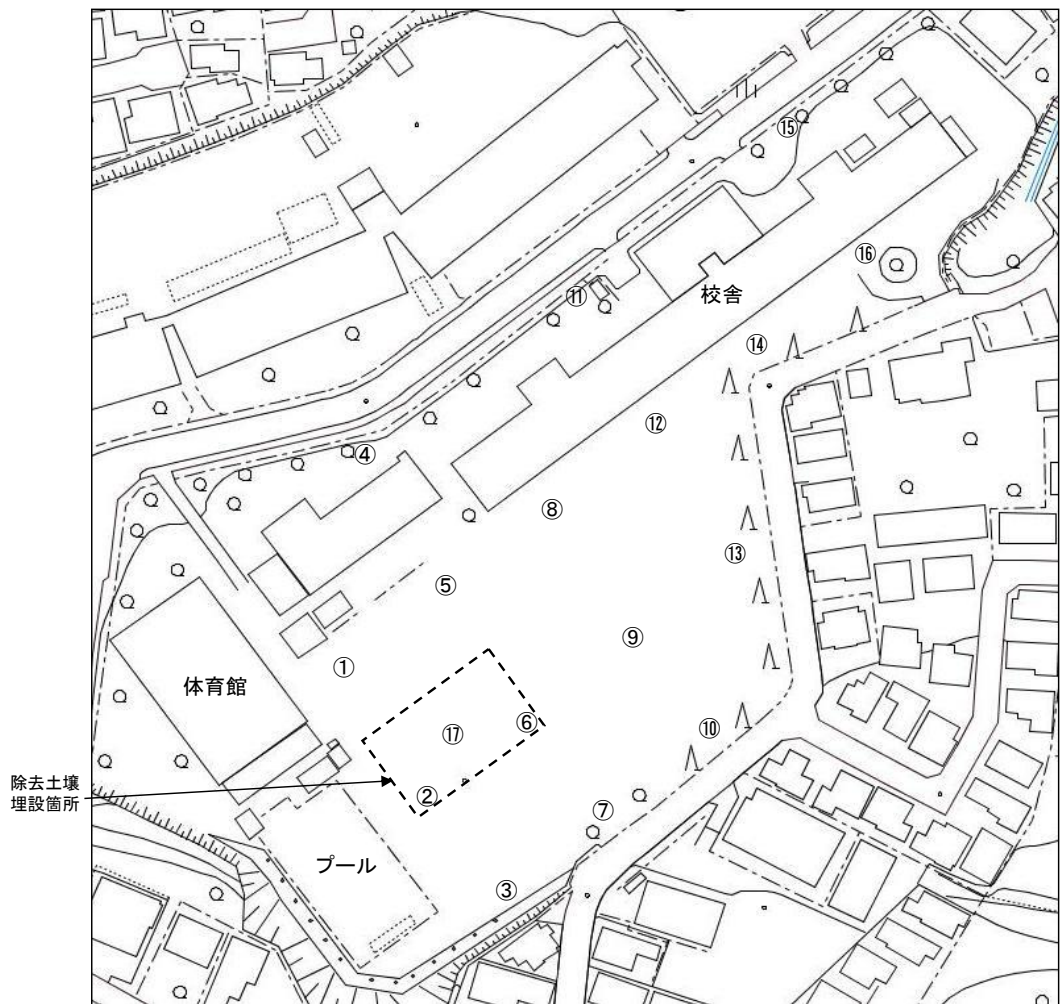

○除染完了日:平成24年5月9日
○測定日:平成30年 5 月 17 日(前回:平成29年11月24日)単位:マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.045	0.046	0.057	0.036	0.044	0.034
②	グラウンド	土	0.050	0.053	0.033	0.042	0.049	0.049
③	グラウンド	土	0.049	0.064	0.088	0.051	0.040	0.052
④	校舎裏	土	0.062	0.070	0.082	0.075	0.083	0.086
⑤	グラウンド	土	0.059	0.043	0.054	0.046	0.045	0.034
⑥	グラウンド	土	0.056	0.070	0.054	0.066	0.063	0.058
⑦	グラウンド	側溝	0.039	0.056	0.056	0.046	0.065	0.059
⑧	校舎前	土	0.056	0.051	0.041	0.048	0.048	0.041
⑨	グラウンド	土	0.060	0.041	0.060	0.048	0.061	0.067
⑩	グラウンド	土	0.062	0.047	0.042	0.051	0.047	0.065
⑪	校舎裏	土	0.061	0.107	0.054	0.101	0.064	0.092
⑫	校舎前	土	0.062	0.055	0.045	0.053	0.055	0.062
⑬	グラウンド	土	0.056	0.047	0.055	0.056	0.044	0.048
⑭	校舎前	アスファルト	0.075	0.072	0.083	0.073	0.085	0.083
⑮	校舎裏	土	0.083	0.064	0.080	0.061	0.081	0.060
⑯	校舎前	アスファルト	0.066	0.050	0.068	0.049	0.059	0.051
⑰	グラウンド	土	0.043	0.039	0.043	0.046	0.035	0.043
平均			0.058	0.057	0.059	0.056	0.057	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
