


### 放射線量マップ【市立柏高等学校】

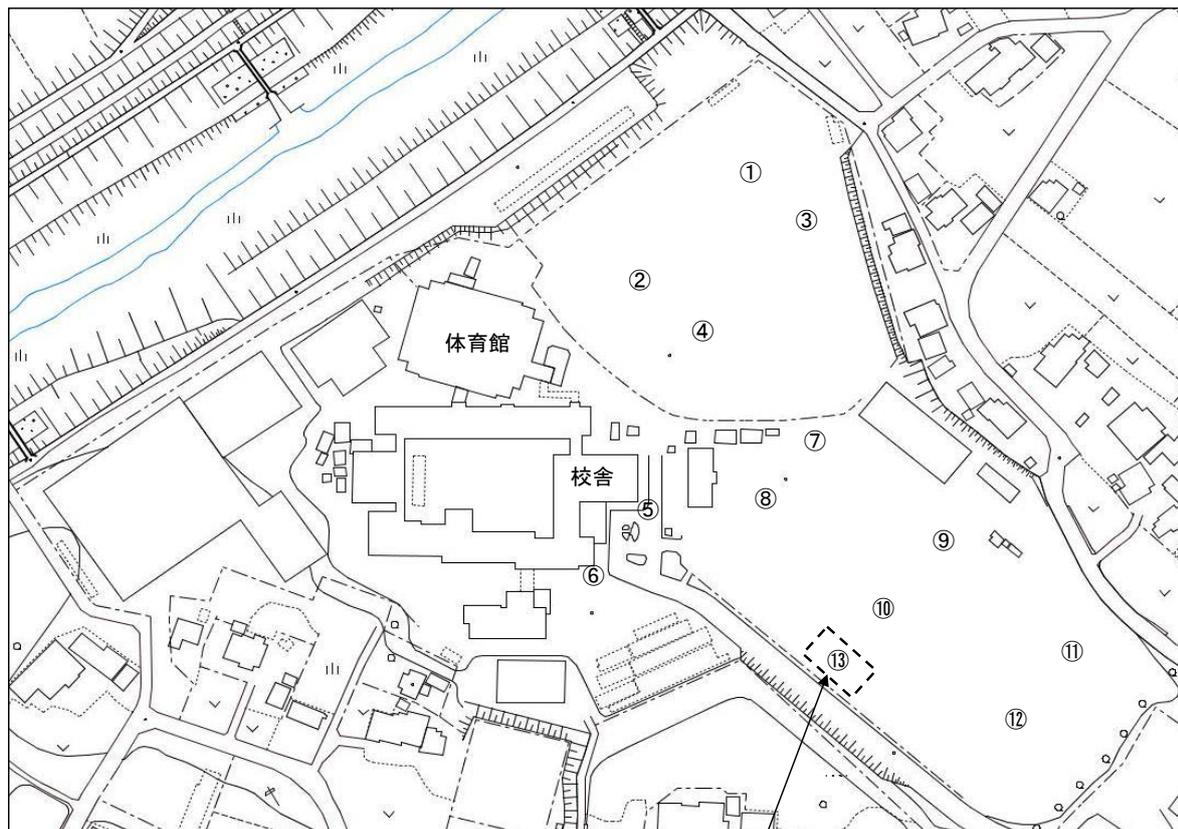

除去土壌  
埋設箇所

○除染完了日：平成25年2月23日

○測定日：平成30年 5月 24日（前回：平成29年11月29日）単位：マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	野球場	土	0.110	0.068	0.094	0.064	0.085	0.076
②	野球場	土	0.106	0.089	0.092	0.091	0.094	0.076
③	野球場	土	0.099	0.099	0.088	0.098	0.068	0.096
④	野球場	土	0.084	0.063	0.090	0.058	0.077	0.073
⑤	通路	舗装	0.093	0.083	0.105	0.094	0.104	0.090
⑥	通路	舗装	0.087	0.089	0.091	0.073	0.099	0.081
⑦	グラウンド	土	0.111	0.096	0.102	0.096	0.096	0.082
⑧	グラウンド	土	0.067	0.103	0.084	0.111	0.078	0.132
⑨	グラウンド	土	0.108	0.101	0.100	0.097	0.096	0.097
⑩	グラウンド	土	0.099	0.105	0.096	0.111	0.109	0.086
⑪	グラウンド	土	0.101	0.093	0.106	0.110	0.100	0.101
⑫	グラウンド	土	0.097	0.088	0.098	0.094	0.098	0.089
⑬	グラウンド	土	0.078	0.110	0.090	0.095	0.094	0.106
平均			0.095	0.091	0.095	0.092	0.092	0.091

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
