


放射線量マップ【花野井小学校】

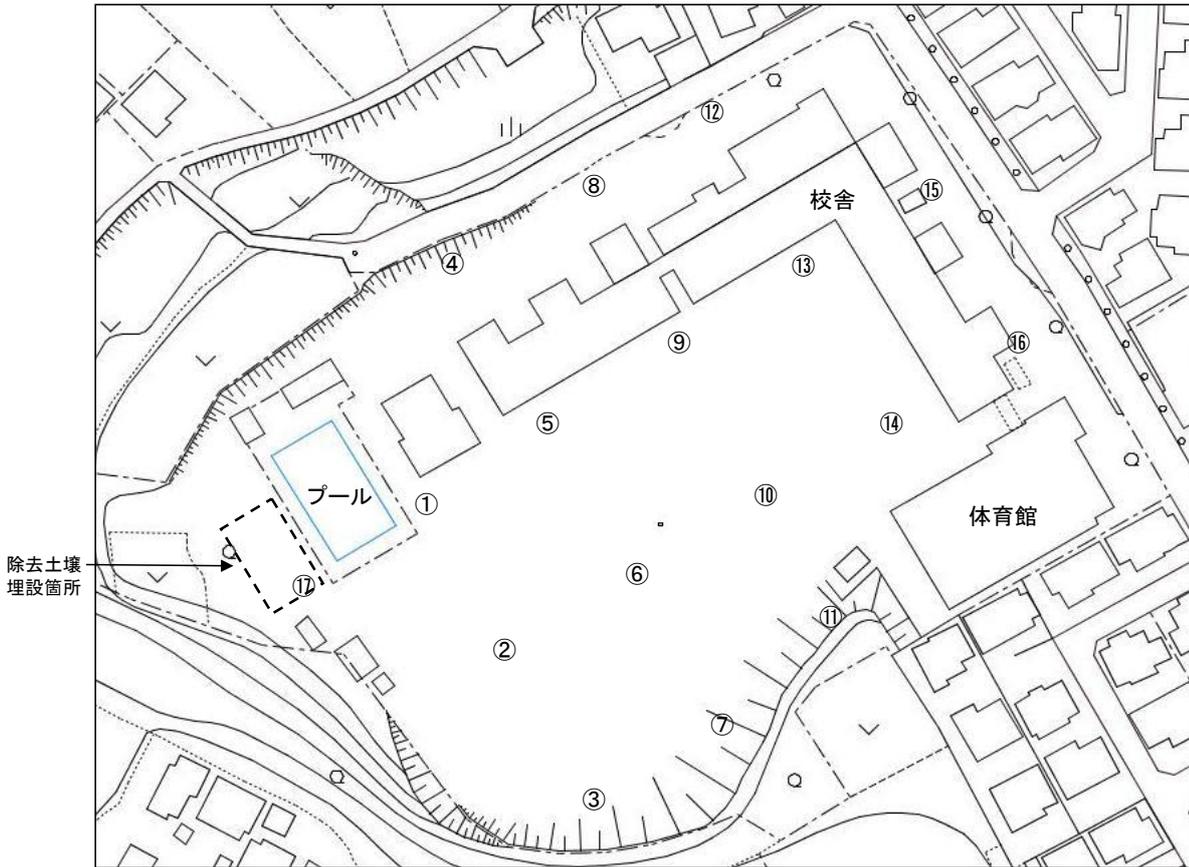

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成30年 5月 24日(前回:平成29年11月22日)単位:マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール前	土	0.057	0.082	0.062	0.084	0.083	0.089
②	グラウンド	土	0.037	0.049	0.050	0.050	0.046	0.052
③	グラウンド	土	0.048	0.072	0.061	0.047	0.049	0.064
④	校舎裏	土	0.060	0.048	0.060	0.046	0.058	0.043
⑤	校舎前	土	0.074	0.066	0.071	0.054	0.066	0.043
⑥	グラウンド	土	0.047	0.040	0.037	0.054	0.042	0.044
⑦	グラウンド	土	0.075	0.083	0.074	0.085	0.073	0.058
⑧	校舎裏	アスファルト	0.068	0.045	0.072	0.050	0.066	0.045
⑨	校舎前	土	0.064	0.045	0.071	0.055	0.081	0.055
⑩	グラウンド	土	0.052	0.041	0.058	0.051	0.044	0.064
⑪	グラウンド	土	0.061	0.053	0.055	0.059	0.037	0.057
⑫	校舎裏	アスファルト	0.062	0.075	0.058	0.067	0.058	0.072
⑬	校舎前	土	0.057	0.061	0.073	0.054	0.056	0.074
⑭	グラウンド	土	0.059	0.063	0.072	0.059	0.077	0.045
⑮	校舎裏	アスファルト	0.058	0.056	0.053	0.060	0.046	0.062
⑯	校舎裏	アスファルト	0.078	0.051	0.073	0.049	0.066	0.055
⑰	プール裏	土	0.069	0.073	0.065	0.080	0.068	0.072
平均			0.060	0.059	0.063	0.059	0.060	0.058

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
