


放射線量マップ【手賀西小学校】

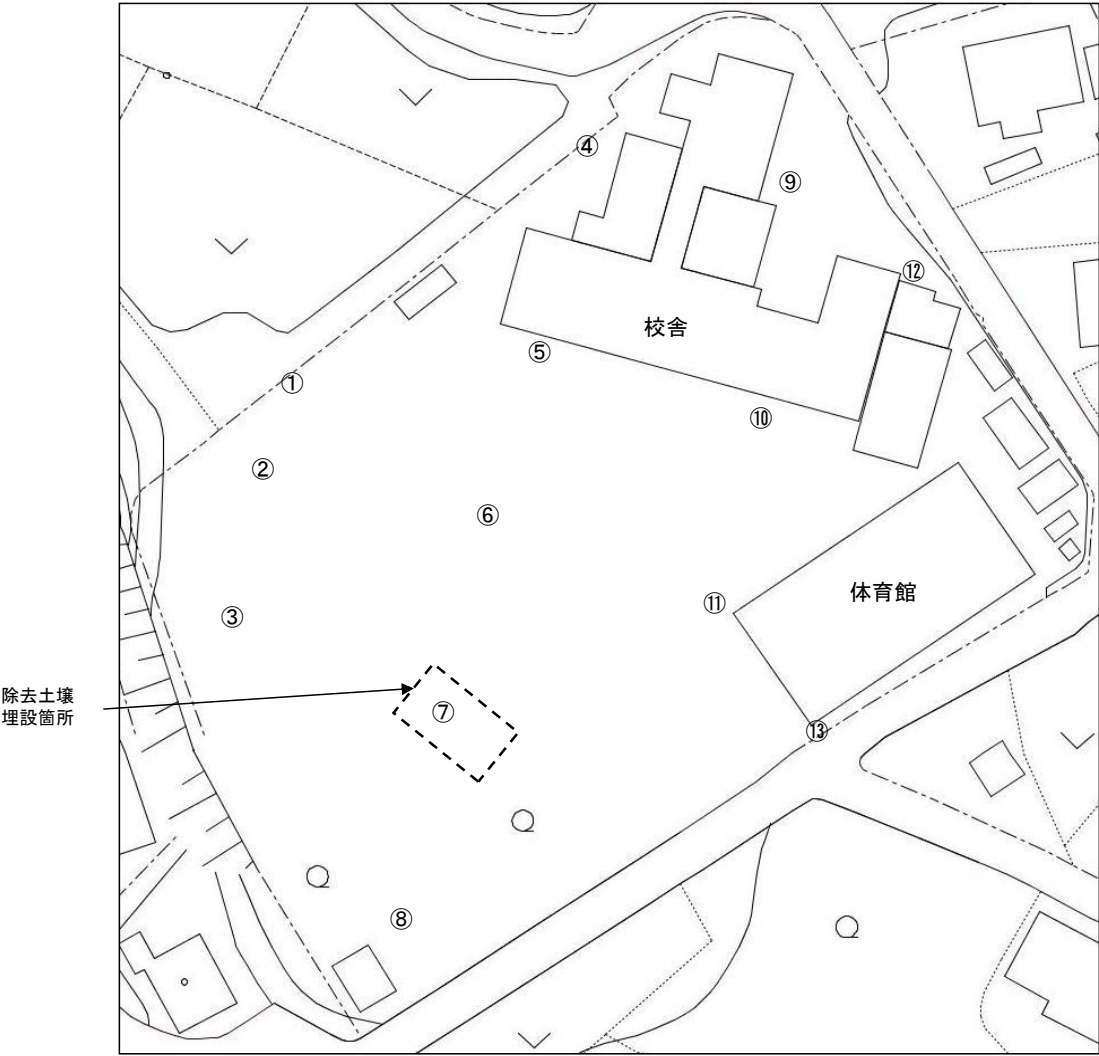

○除染完了日:平成24年6月28日
○測定日:平成30年 5月15日(前回:平成29年12月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.040	0.070	0.030	0.060	0.050	0.060
②	グラウンド	土	0.060	0.050	0.070	0.060	0.070	0.060
③	グラウンド	土	0.050	0.040	0.050	0.040	0.050	0.050
④	校舎裏	舗装	0.060	0.050	0.070	0.050	0.070	0.060
⑤	校舎前	土	0.040	0.060	0.080	0.060	0.070	0.060
⑥	グラウンド	土	0.040	0.030	0.040	0.040	0.040	0.050
⑦	グラウンド	土	0.040	0.040	0.060	0.040	0.060	0.040
⑧	グラウンド	土	0.050	0.050	0.050	0.050	0.070	0.040
⑨	校舎裏	舗装	0.060	0.080	0.070	0.080	0.060	0.080
⑩	グラウンド	土	0.070	0.060	0.060	0.060	0.070	0.040
⑪	グラウンド	舗装	0.050	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060
⑫	校舎裏	側溝	0.080	0.080	0.080	0.090	0.110	0.100
⑬	体育館前	側溝	0.080	0.070	0.080	0.080	0.100	0.070
平均			0.055	0.057	0.062	0.058	0.068	0.059

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
