


放射線量マップ【柏第六小学校】

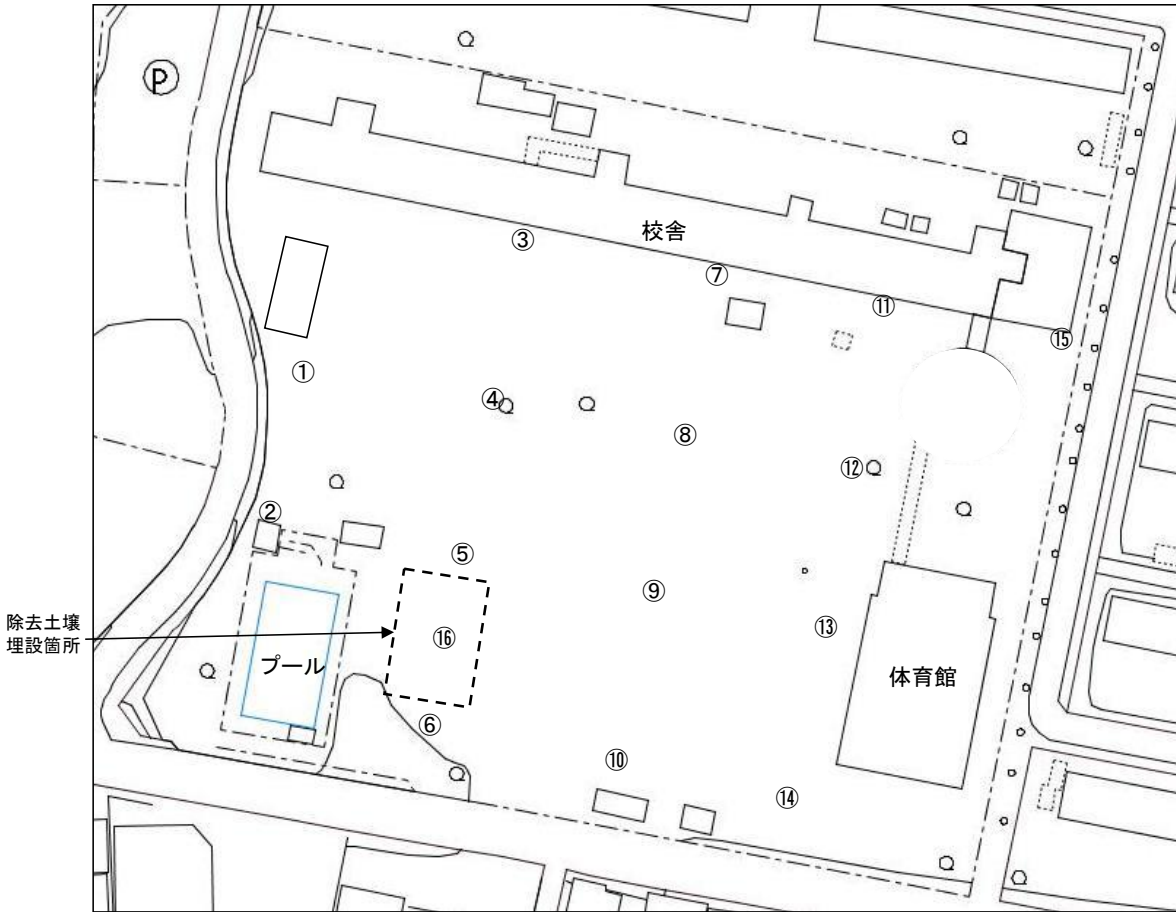

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成30年12月7日(前回:平成30年5月17日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.047	0.052	0.043	0.062	0.061	0.051
②	プール横	土	0.078	0.065	0.080	0.086	0.081	0.075
③	校舎前	土	0.070	0.066	0.069	0.070	0.066	0.060
④	グラウンド	土	0.063	0.084	0.080	0.082	0.091	0.087
⑤	グラウンド	土	0.034	0.027	0.046	0.036	0.034	0.035
⑥	グラウンド	土	0.045	0.078	0.063	0.085	0.062	0.116
⑦	校舎前	土	0.081	0.065	0.064	0.079	0.073	0.062
⑧	グラウンド	土	0.082	0.066	0.069	0.060	0.085	0.058
⑨	グラウンド	土	0.038	0.037	0.043	0.029	0.051	0.032
⑩	グラウンド	土	0.051	0.046	0.051	0.041	0.046	0.042
⑪	校舎前	アスファルト	0.059	0.070	0.052	0.063	0.064	0.047
⑫	グラウンド	土	0.054	0.057	0.048	0.082	0.057	0.076
⑬	グラウンド	土	0.059	0.050	0.043	0.063	0.048	0.051
⑭	グラウンド	土	0.044	0.058	0.034	0.067	0.043	0.060
⑮	校舎前	アスファルト	0.064	0.067	0.072	0.062	0.076	0.073
⑯	グラウンド	土	0.026	0.050	0.027	0.055	0.033	0.042
平均			0.056	0.059	0.055	0.064	0.061	0.060

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
