


放射線量マップ【富勢小学校】

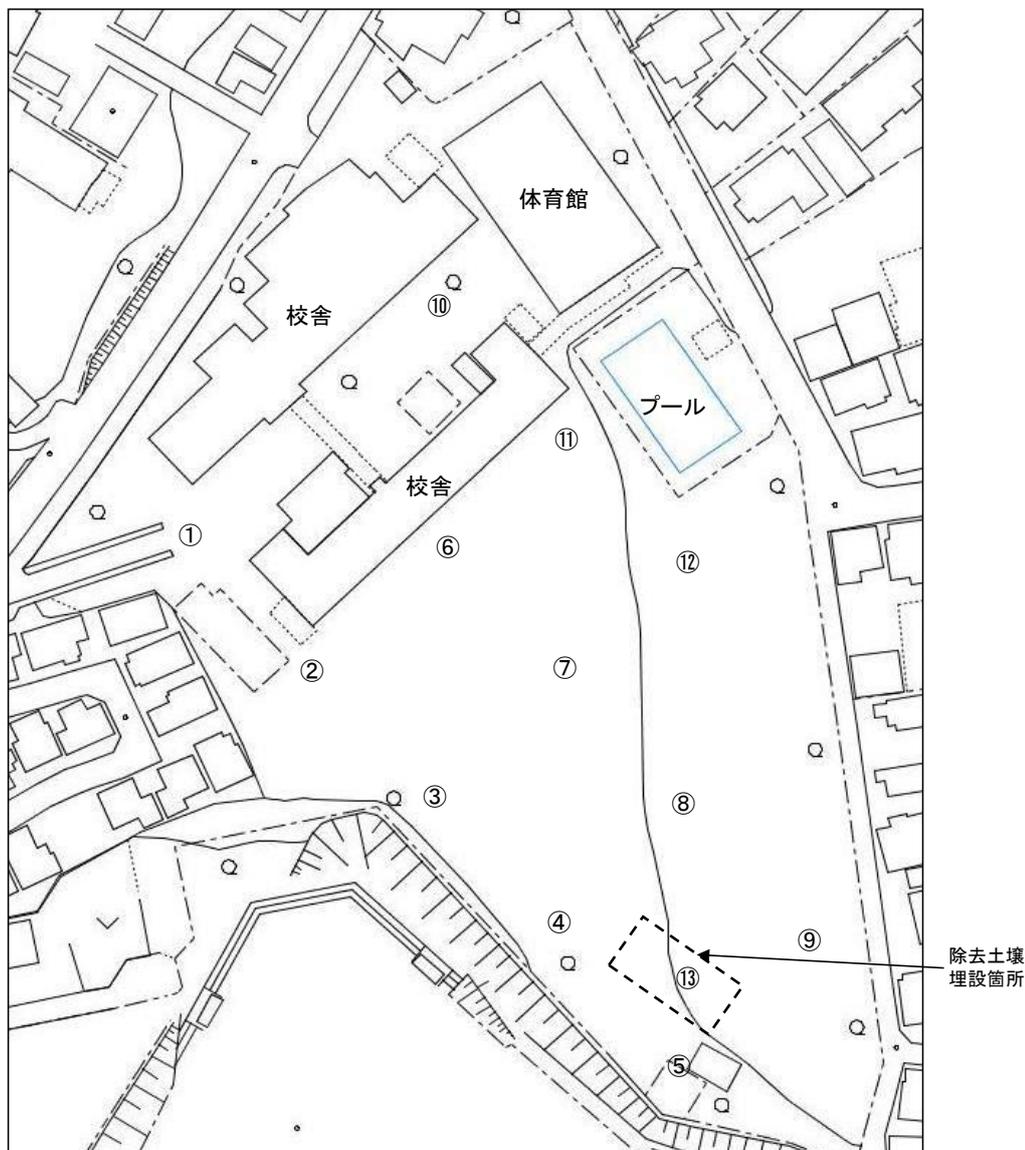

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成30年11月21日(前回:平成30年月5月24日)単位:マイクロシーベルト/毎時

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.046	0.041	0.036	0.063	0.057	0.045
②	グラウンド	土	0.029	0.045	0.039	0.042	0.047	0.053
③	グラウンド	土	0.039	0.031	0.031	0.038	0.042	0.030
④	グラウンド	土	0.044	0.034	0.041	0.025	0.036	0.028
⑤	グラウンド	土	0.052	0.059	0.042	0.053	0.043	0.047
⑥	グラウンド	土	0.037	0.053	0.053	0.049	0.057	0.040
⑦	グラウンド	土	0.041	0.048	0.040	0.058	0.041	0.057
⑧	グラウンド	土	0.031	0.038	0.041	0.038	0.039	0.039
⑨	グラウンド	土	0.051	0.034	0.031	0.038	0.057	0.040
⑩	校舎裏	舗装	0.063	0.066	0.080	0.074	0.078	0.051
⑪	グラウンド	土	0.050	0.054	0.047	0.051	0.043	0.050
⑫	グラウンド	土	0.041	0.028	0.042	0.037	0.039	0.052
⑬	グラウンド	土	0.040	0.034	0.037	0.036	0.030	0.046
平均			0.043	0.043	0.043	0.046	0.047	0.044

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
