


放射線量マップ【酒井根中学校】

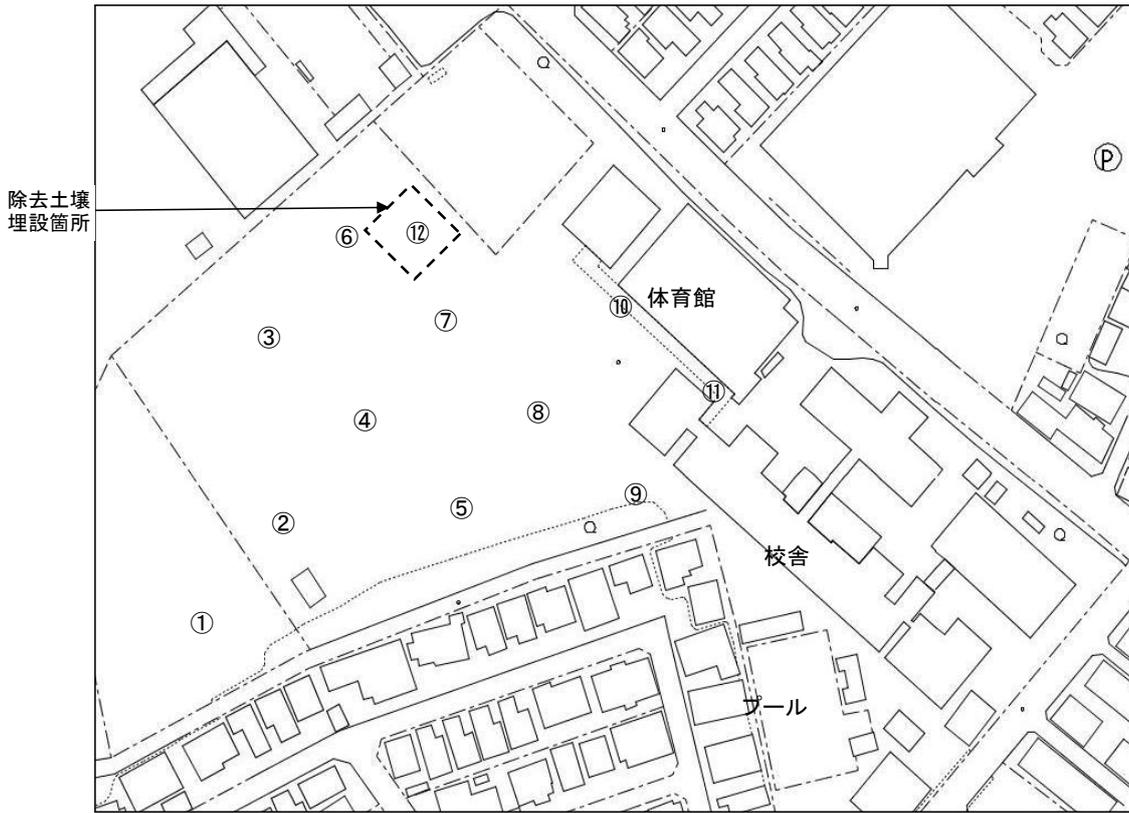

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成30年11月12日(前回:平成30年5月)(単値)マイクロシーベルト/毎時

| 測定箇所 | | | ※1環境省基準 | | ※2柏市目標 | | | |
|------|-------|----|---------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 100cm | | 50cm | | 5cm | |
| | | | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 |
| ① | グラウンド | 土 | 0.085 | 0.097 | 0.081 | 0.099 | 0.071 | 0.093 |
| ② | グラウンド | 土 | 0.066 | 0.098 | 0.066 | 0.096 | 0.066 | 0.092 |
| ③ | グラウンド | 土 | 0.079 | 0.094 | 0.080 | 0.100 | 0.083 | 0.083 |
| ④ | グラウンド | 土 | 0.094 | 0.088 | 0.064 | 0.073 | 0.087 | 0.082 |
| ⑤ | グラウンド | 土 | 0.082 | 0.084 | 0.068 | 0.081 | 0.098 | 0.084 |
| ⑥ | グラウンド | 土 | 0.055 | 0.061 | 0.049 | 0.053 | 0.072 | 0.044 |
| ⑦ | グラウンド | 土 | 0.070 | 0.085 | 0.073 | 0.076 | 0.077 | 0.072 |
| ⑧ | グラウンド | 土 | 0.073 | 0.079 | 0.059 | 0.068 | 0.070 | 0.071 |
| ⑨ | グラウンド | 土 | 0.058 | 0.091 | 0.060 | 0.065 | 0.053 | 0.056 |
| ⑩ | 体育館前 | 土 | 0.051 | 0.047 | 0.063 | 0.066 | 0.070 | 0.071 |
| ⑪ | 体育館前 | 舗装 | 0.066 | 0.088 | 0.076 | 0.091 | 0.074 | 0.091 |
| ⑫ | グラウンド | 土 | 0.060 | 0.058 | 0.067 | 0.050 | 0.071 | 0.056 |
| 平均 | | | 0.070 | 0.081 | 0.067 | 0.077 | 0.074 | 0.075 |

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
