


放射線量マップ【風早南部小学校】

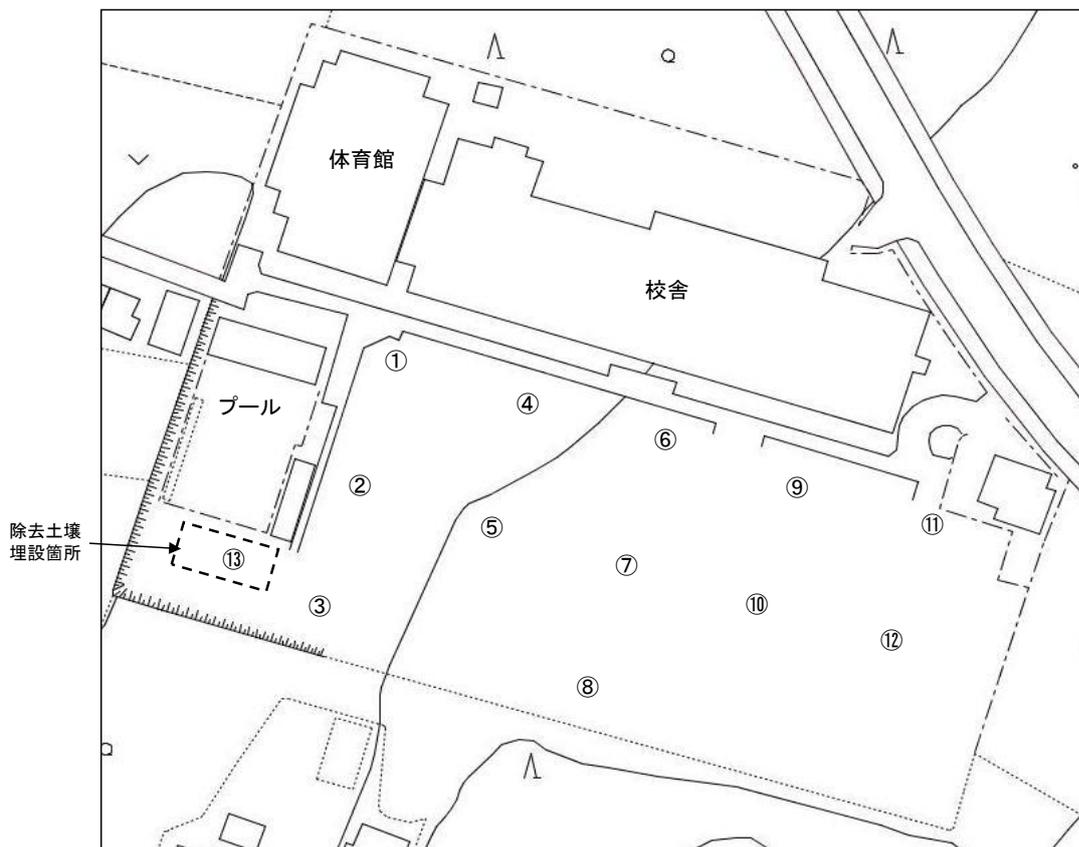

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成30年11月5日(前回:平成30年5月11日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	側溝	0.080	0.074	0.082	0.075	0.084	0.079
②	グラウンド	側溝	0.063	0.062	0.060	0.062	0.064	0.074
③	グラウンド	側溝	0.047	0.050	0.070	0.076	0.065	0.058
④	グラウンド	土	0.064	0.059	0.042	0.050	0.043	0.045
⑤	グラウンド	土	0.053	0.050	0.047	0.060	0.052	0.046
⑥	グラウンド	土	0.040	0.040	0.045	0.040	0.029	0.045
⑦	グラウンド	土	0.053	0.044	0.054	0.048	0.046	0.063
⑧	グラウンド	側溝	0.041	0.059	0.056	0.048	0.064	0.066
⑨	グラウンド	土	0.043	0.056	0.040	0.042	0.038	0.027
⑩	グラウンド	土	0.039	0.040	0.046	0.045	0.064	0.044
⑪	グラウンド	土	0.048	0.059	0.043	0.059	0.032	0.061
⑫	グラウンド	土	0.061	0.062	0.060	0.058	0.070	0.058
⑬	バスケット	土	0.084	0.057	0.062	0.073	0.069	0.056
平均			0.055	0.055	0.054	0.057	0.055	0.056

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
