


### 放射線量マップ【柏中学校】

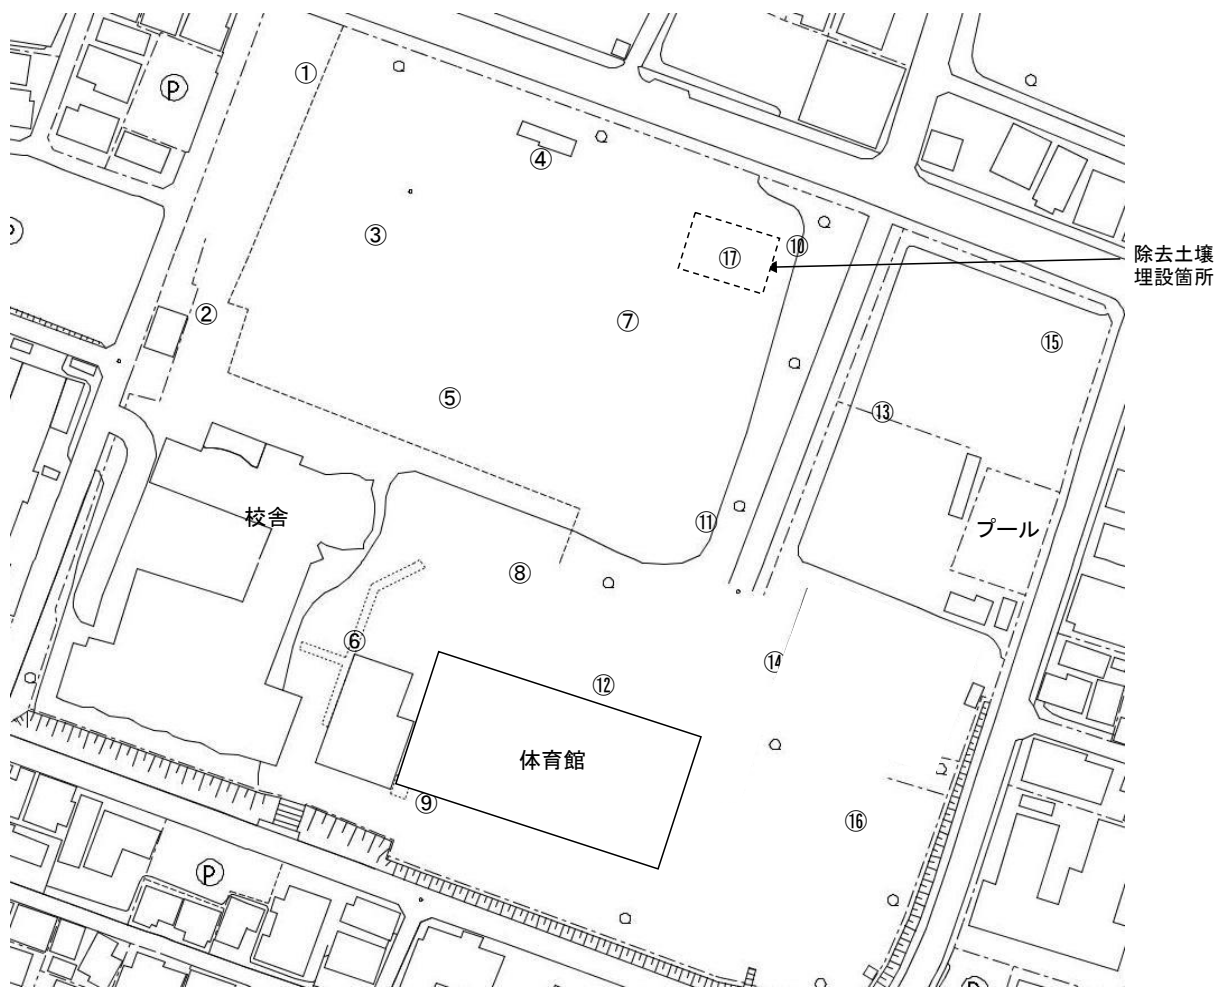

○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:令和元年5月31日(前回:平成30年12月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		今回	前回
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.065	0.101	0.096	0.115	0.102	0.099
②	グラウンド	土	0.088	0.070	0.082	0.075	0.089	0.093
③	グラウンド	土	0.075	0.086	0.092	0.078	0.084	0.085
④	グラウンド	土	0.069	0.076	0.090	0.097	0.088	0.081
⑤	グラウンド	土	0.068	0.084	0.077	0.070	0.077	0.076
⑥	校舎前	舗装	0.055	0.056	0.067	0.050	0.064	0.074
⑦	グラウンド	土	0.052	0.097	0.080	0.075	0.075	0.078
⑧	通路	舗装	0.058	0.077	0.108	0.078	0.065	0.059
⑨	体育館裏	土	0.046	0.064	0.042	0.059	0.041	0.060
⑩	グラウンド	土	0.073	0.090	0.091	0.097	0.077	0.092
⑪	グラウンド	土	0.091	0.102	0.110	0.111	0.105	0.102
⑫	体育館下	土	0.052	0.040	0.062	0.038	0.057	0.049
⑬	バレーコート	土	0.042	0.038	0.055	0.035	0.045	0.029
⑭	グラウンド	土	0.054	0.068	0.060	0.051	0.063	0.037
⑮	テニスコート	土	0.045	0.040	0.042	0.032	0.037	0.033
⑯	グラウンド	土	0.066	0.064	0.077	0.064	0.057	0.081
⑰	バスケコート	土	0.050	0.064	0.060	0.057	0.068	0.060
平均			0.062	0.072	0.076	0.070	0.070	0.070

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
