


放射線量マップ【田中北小学校】

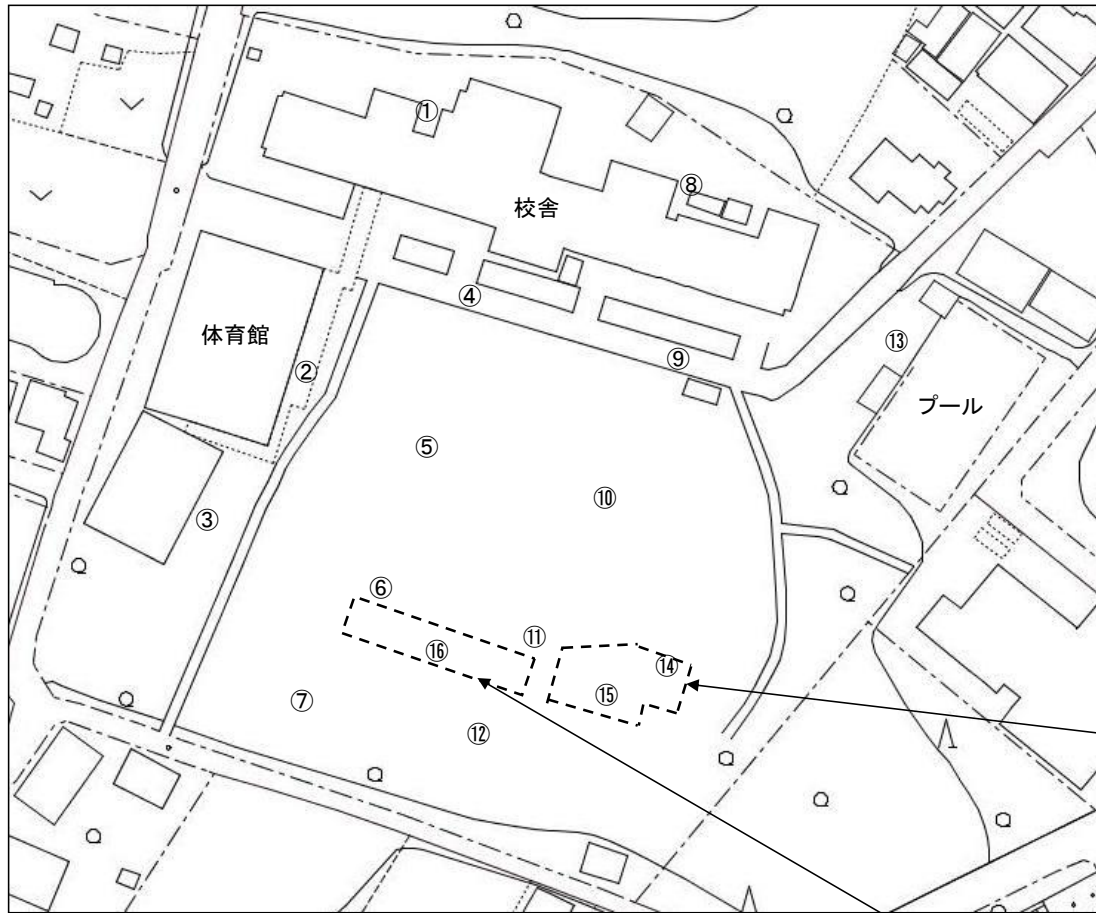

除去土壤埋設箇所

除去土壤埋設箇所

○除染完了日:平成24年1月16日

○測定日:令和元年5月16日(前回:平成30年11月20日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	コンクリート	0.076	0.079	0.082	0.070	0.079	0.065
②	体育館前	アスファルト	0.069	0.049	0.045	0.054	0.049	0.051
③	グラウンド	土	0.061	0.071	0.069	0.089	0.103	0.048
④	校舎前	アスファルト	0.055	0.044	0.062	0.039	0.052	0.042
⑤	グラウンド	土	0.033	0.032	0.043	0.045	0.030	0.027
⑥	グラウンド	土	0.033	0.025	0.035	0.039	0.031	0.041
⑦	グラウンド	土	0.044	0.033	0.044	0.040	0.024	0.055
⑧	校舎裏	土	0.084	0.072	0.068	0.063	0.062	0.066
⑨	校舎前	アスファルト	0.078	0.053	0.049	0.036	0.054	0.040
⑩	グラウンド	土	0.037	0.023	0.037	0.027	0.037	0.036
⑪	グラウンド	土	0.029	0.031	0.032	0.042	0.032	0.039
⑫	グラウンド	土	0.040	0.027	0.042	0.030	0.043	0.031
⑬	プール横	土	0.065	0.059	0.064	0.064	0.071	0.089
⑭	グラウンド	土	0.043	0.031	0.046	0.030	0.052	0.035
⑮	グラウンド	土	0.048	0.038	0.044	0.038	0.038	0.032
⑯	グラウンド	土	0.063	0.029	0.051	0.027	0.053	0.027
平均			0.054	0.044	0.051	0.046	0.051	0.045

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
