


放射線量マップ【高柳中学校】

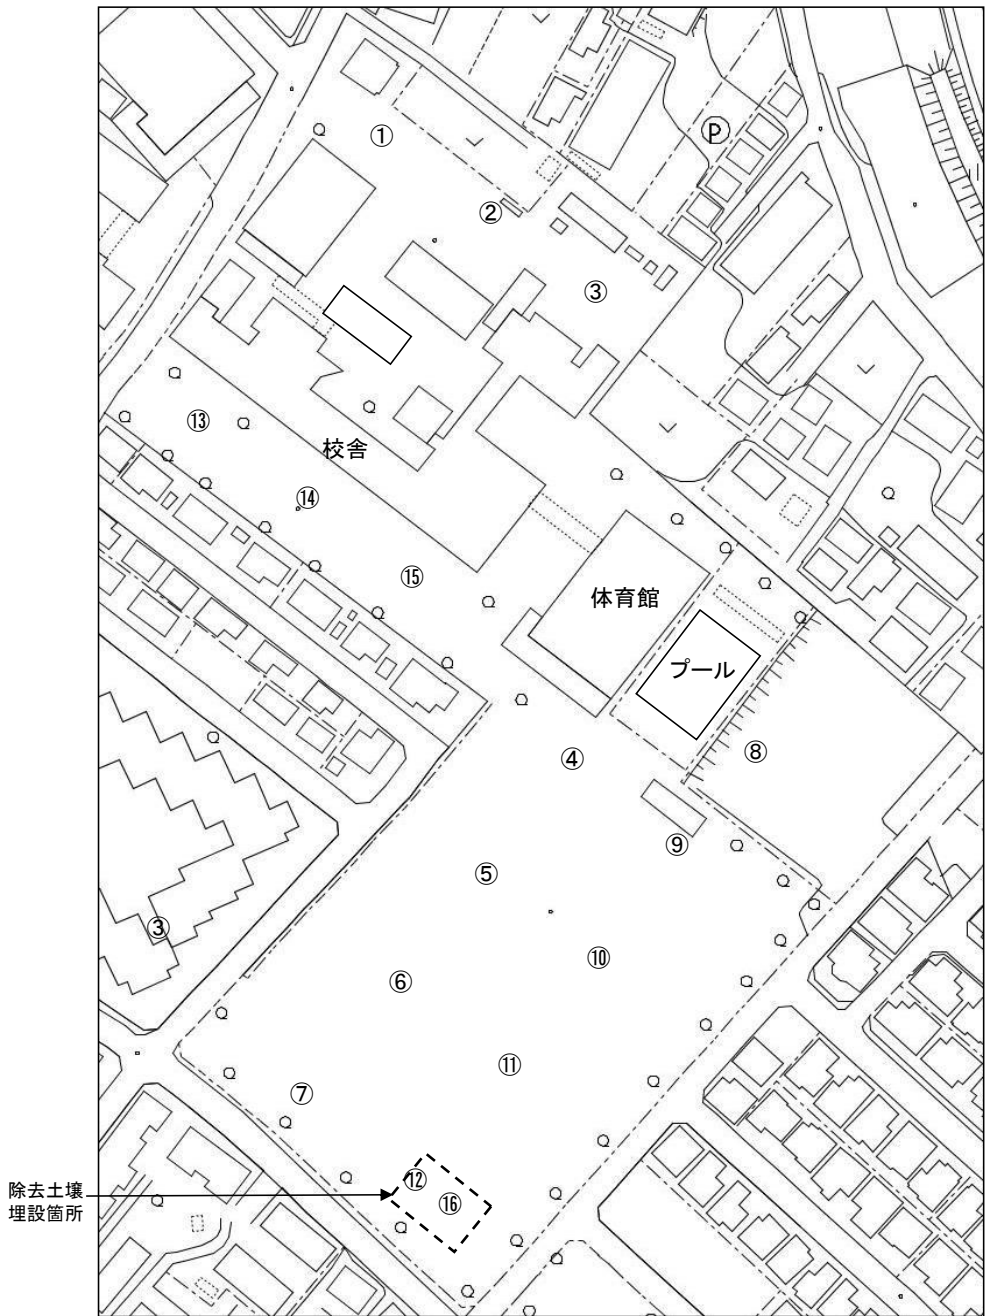

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:令和元年5月30日(前回:平成30年11月12日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.051	0.068	0.058	0.054	0.063	0.050
②	通路	舗装	0.050	0.057	0.054	0.061	0.060	0.062
③	通路	舗装	0.052	0.051	0.060	0.049	0.059	0.058
④	グラウンド	土	0.042	0.050	0.047	0.042	0.050	0.047
⑤	グラウンド	土	0.051	0.058	0.064	0.060	0.074	0.053
⑥	グラウンド	土	0.062	0.057	0.075	0.056	0.067	0.050
⑦	グラウンド	土	0.057	0.050	0.067	0.046	0.052	0.051
⑧	グラウンド	土	0.045	0.052	0.041	0.055	0.068	0.041
⑨	グラウンド	土	0.053	0.058	0.067	0.064	0.066	0.067
⑩	グラウンド	土	0.066	0.075	0.058	0.111	0.088	0.132
⑪	グラウンド	土	0.077	0.046	0.046	0.055	0.047	0.054
⑫	グラウンド	土	0.050	0.049	0.060	0.059	0.057	0.049
⑬	通路	舗装	0.073	0.071	0.067	0.069	0.074	0.076
⑭	通路	舗装	0.084	0.060	0.063	0.064	0.056	0.065
⑮	通路	舗装	0.060	0.063	0.055	0.044	0.049	0.043
⑯	グラウンド	土	0.066	0.058	0.070	0.060	0.079	0.051
平均			0.059	0.058	0.060	0.059	0.063	0.059

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
