


放射線量マップ【旭小学校】

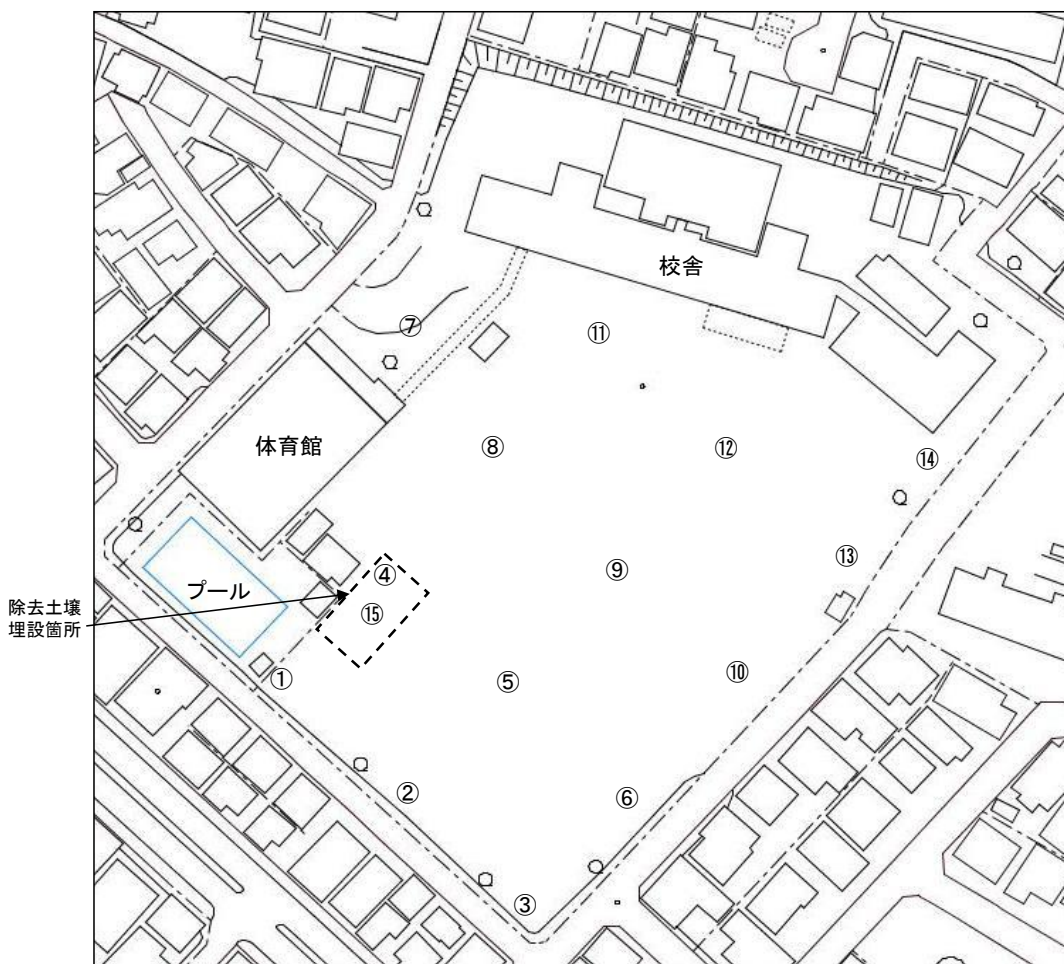

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年5月30日(前回:平成30年12月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.080	0.036	0.091	0.043	0.098	0.039
②	グラウンド	土	0.050	0.036	0.051	0.051	0.050	0.042
③	グラウンド	土	0.053	0.055	0.039	0.063	0.042	0.058
④	グラウンド	土	0.032	0.037	0.041	0.034	0.042	0.046
⑤	グラウンド	土	0.034	0.039	0.043	0.026	0.034	0.022
⑥	グラウンド	土	0.037	0.042	0.043	0.044	0.039	0.056
⑦	通路	アスファルト	0.050	0.049	0.053	0.057	0.051	0.049
⑧	グラウンド	土	0.034	0.026	0.037	0.021	0.041	0.029
⑨	グラウンド	土	0.033	0.047	0.032	0.033	0.044	0.044
⑩	グラウンド	土	0.046	0.043	0.043	0.040	0.041	0.034
⑪	グラウンド	土	0.037	0.070	0.042	0.058	0.035	0.063
⑫	グラウンド	土	0.029	0.038	0.040	0.036	0.035	0.037
⑬	グラウンド	土	0.045	0.041	0.029	0.030	0.057	0.023
⑭	校舎横	側溝	0.043	0.057	0.056	0.051	0.071	0.070
⑮	グラウンド	土	0.035	0.039	0.034	0.037	0.046	0.041
平均			0.043	0.044	0.045	0.042	0.048	0.044

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
