


放射線量マップ【十余二小学校】

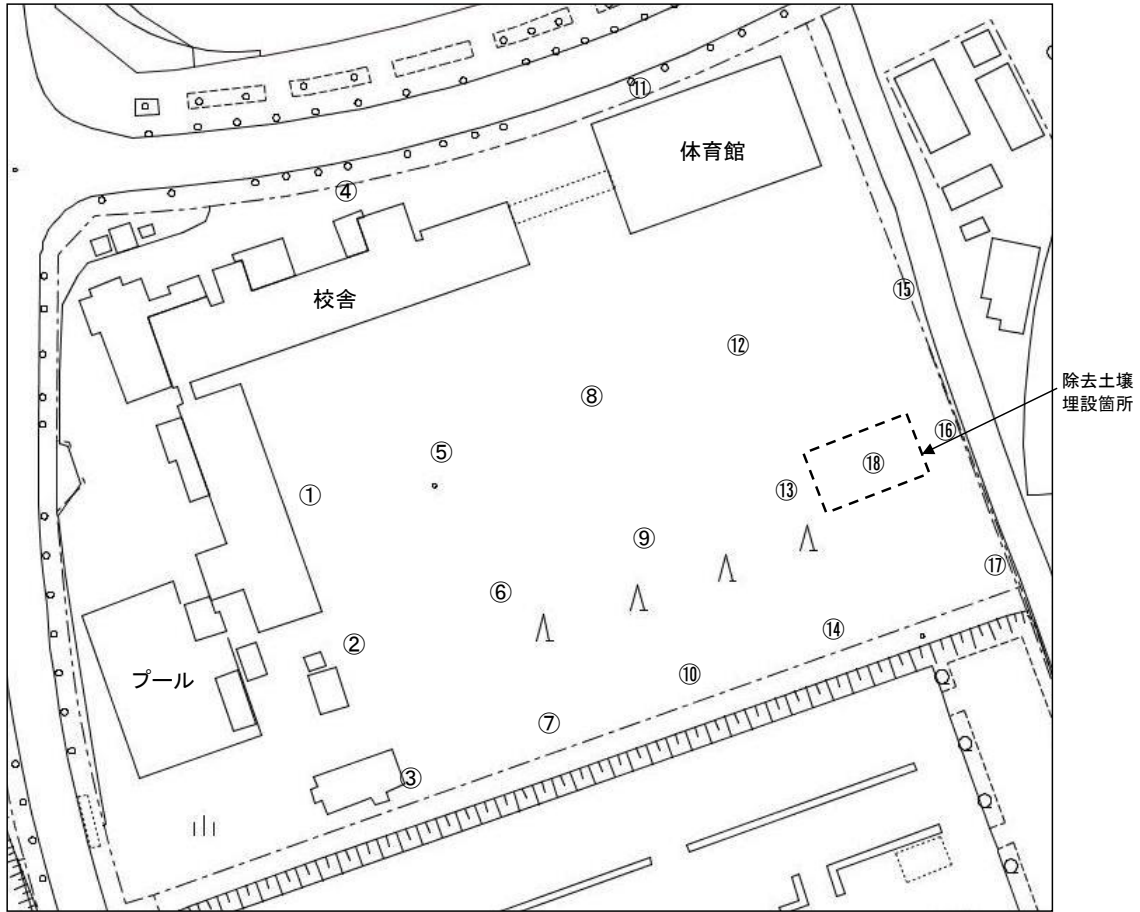

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年6月4日(前回:平成30年11月20日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.082	0.067	0.086	0.063	0.087	0.058
②	グラウンド	土	0.052	0.041	0.040	0.042	0.029	0.033
③	グラウンド	土	0.077	0.082	0.079	0.069	0.079	0.101
④	校舎裏	アスファルト	0.058	0.048	0.050	0.036	0.030	0.047
⑤	グラウンド	土	0.067	0.072	0.070	0.072	0.084	0.071
⑥	グラウンド	土	0.083	0.088	0.094	0.089	0.096	0.086
⑦	グラウンド	土	0.089	0.070	0.081	0.093	0.084	0.075
⑧	グラウンド	土	0.076	0.073	0.070	0.081	0.081	0.095
⑨	グラウンド	土	0.075	0.073	0.072	0.073	0.074	0.077
⑩	グラウンド	土	0.077	0.088	0.077	0.076	0.088	0.078
⑪	体育館裏	土	0.068	0.056	0.065	0.057	0.058	0.059
⑫	グラウンド	土	0.071	0.068	0.076	0.076	0.089	0.071
⑬	グラウンド	土	0.055	0.070	0.065	0.046	0.052	0.073
⑭	グラウンド	土	0.068	0.065	0.092	0.066	0.075	0.074
⑮	グラウンド	土	0.049	0.048	0.063	0.051	0.047	0.054
⑯	グラウンド	土	0.079	0.063	0.074	0.062	0.072	0.065
⑰	グラウンド	土	0.087	0.060	0.071	0.061	0.075	0.072
⑱	グラウンド	土	0.056	0.042	0.062	0.044	0.056	0.049
平均			0.071	0.065	0.072	0.064	0.070	0.069

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
