


### 放射線量マップ【大津ヶ丘第一小学校】

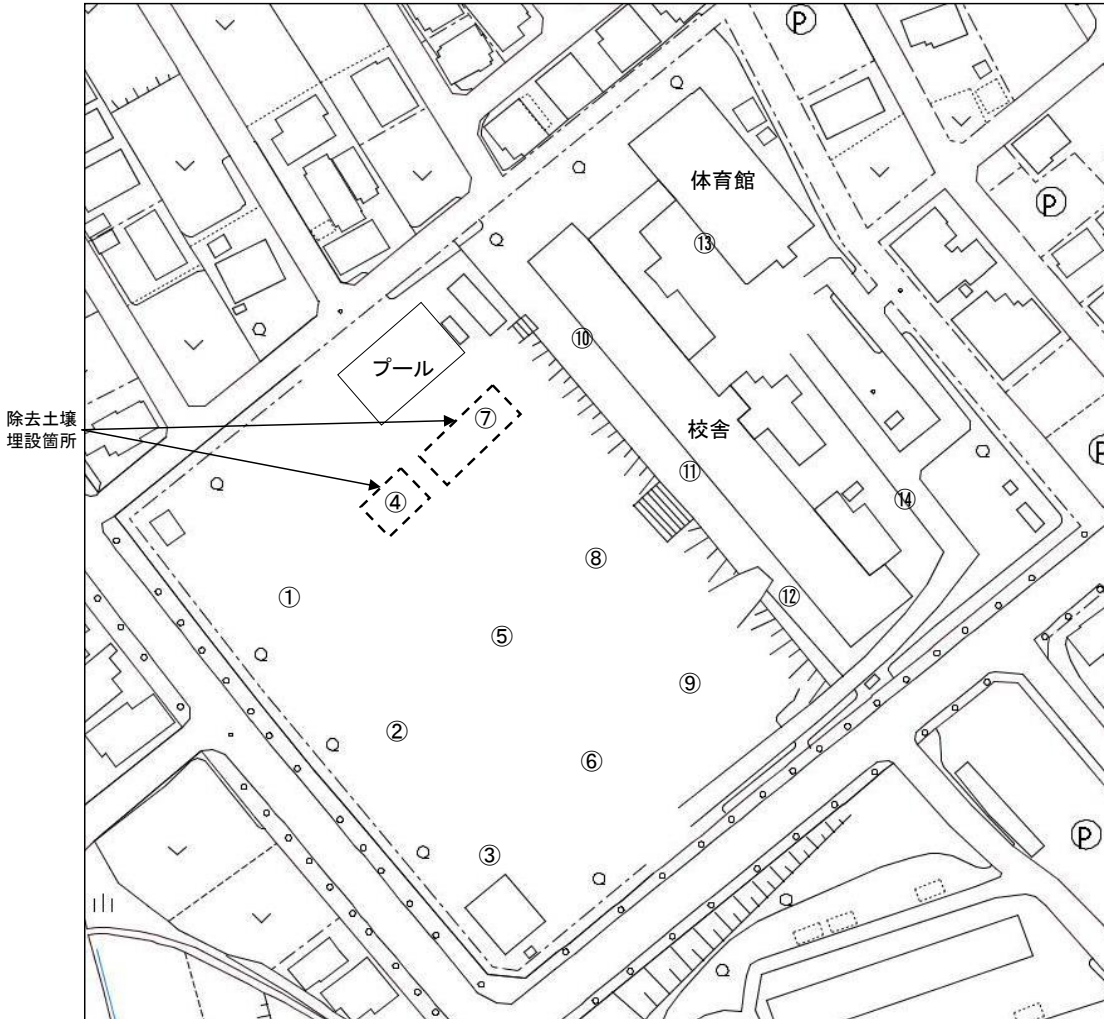

○除染完了日：平成24年4月9日

○測定日：令和元年5月30日（前回：平成30年11月21日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.054	0.055	0.063	0.063	0.061	0.088
②	グラウンド	土	0.040	0.032	0.030	0.030	0.041	0.051
③	グラウンド	土	0.039	0.059	0.056	0.054	0.056	0.054
④	グラウンド	土	0.055	0.054	0.041	0.049	0.046	0.037
⑤	グラウンド	土	0.034	0.047	0.052	0.043	0.047	0.043
⑥	グラウンド	土	0.042	0.045	0.039	0.046	0.053	0.048
⑦	グラウンド	土	0.048	0.050	0.057	0.044	0.070	0.058
⑧	グラウンド	土	0.048	0.043	0.052	0.037	0.035	0.049
⑨	グラウンド	土	0.049	0.051	0.041	0.043	0.057	0.050
⑩	校舎前	土	0.052	0.061	0.076	0.072	0.051	0.083
⑪	校舎前	土	0.056	0.076	0.066	0.076	0.067	0.066
⑫	校舎前	土	0.080	0.058	0.062	0.052	0.072	0.064
⑬	通路	舗装	0.081	工事中	0.062	工事中	0.068	工事中
⑭	通路	舗装	0.078	0.072	0.076	0.073	0.096	0.084
平均			0.054	0.054	0.055	0.052	0.059	0.060

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
