


### 放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

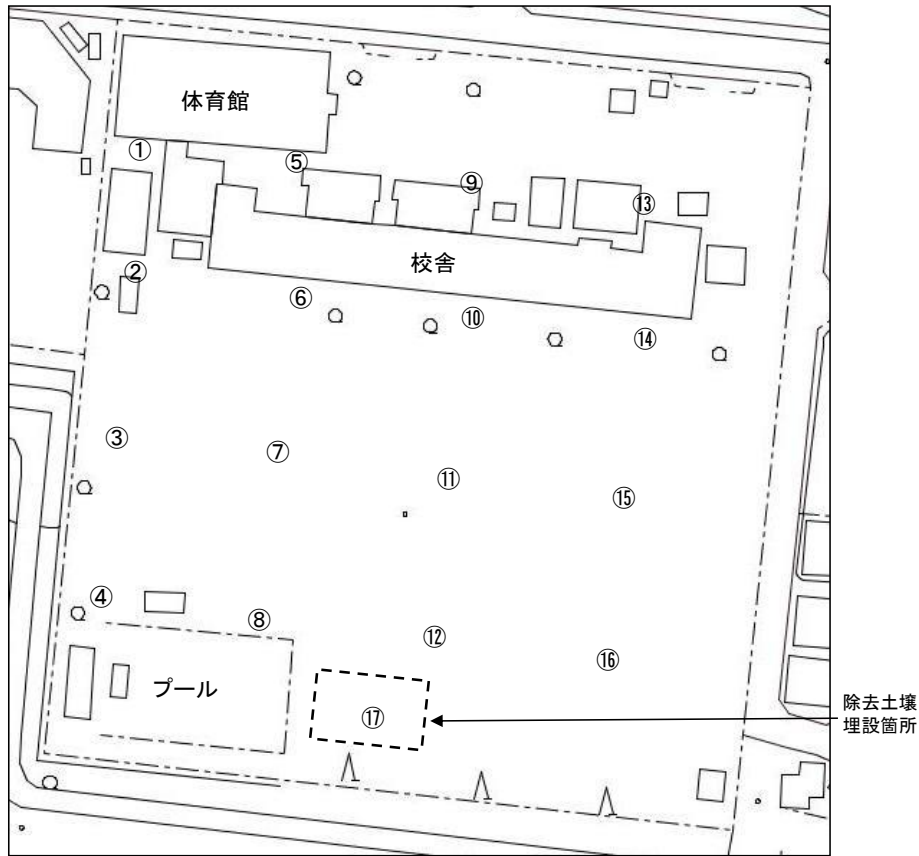

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年5月30日(前回:平成30年11月20日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.081	0.060	0.070	0.070	0.085	0.110
②	グラウンド	土	0.056	0.070	0.058	0.070	0.073	0.070
③	グラウンド	土	0.077	0.050	0.054	0.060	0.057	0.060
④	グラウンド	土	0.042	0.040	0.045	0.080	0.051	0.070
⑤	校舎裏	舗装	0.088	0.100	0.095	0.100	0.089	0.090
⑥	グラウンド	土	0.042	0.060	0.050	0.060	0.054	0.070
⑦	グラウンド	土	0.043	0.080	0.031	0.030	0.036	0.050
⑧	グラウンド	土	0.037	0.060	0.033	0.080	0.041	0.070
⑨	校舎裏	舗装	0.093	0.080	0.064	0.080	0.084	0.090
⑩	グラウンド	土	0.062	0.050	0.059	0.060	0.059	0.070
⑪	グラウンド	土	0.060	0.040	0.055	0.060	0.055	0.050
⑫	グラウンド	土	0.040	0.060	0.050	0.050	0.054	0.070
⑬	校舎裏	土	0.076	0.100	0.069	0.110	0.072	0.120
⑭	グラウンド	土	0.072	0.070	0.072	0.070	0.079	0.070
⑮	グラウンド	土	0.054	0.070	0.071	0.070	0.059	0.070
⑯	グラウンド	土	0.028	0.050	0.040	0.050	0.039	0.050
⑰	グラウンド	土	0.046	0.050	0.042	0.040	0.043	0.030
平均			0.059	0.064	0.056	0.067	0.061	0.071

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
