


放射線量マップ【柏第六小学校】

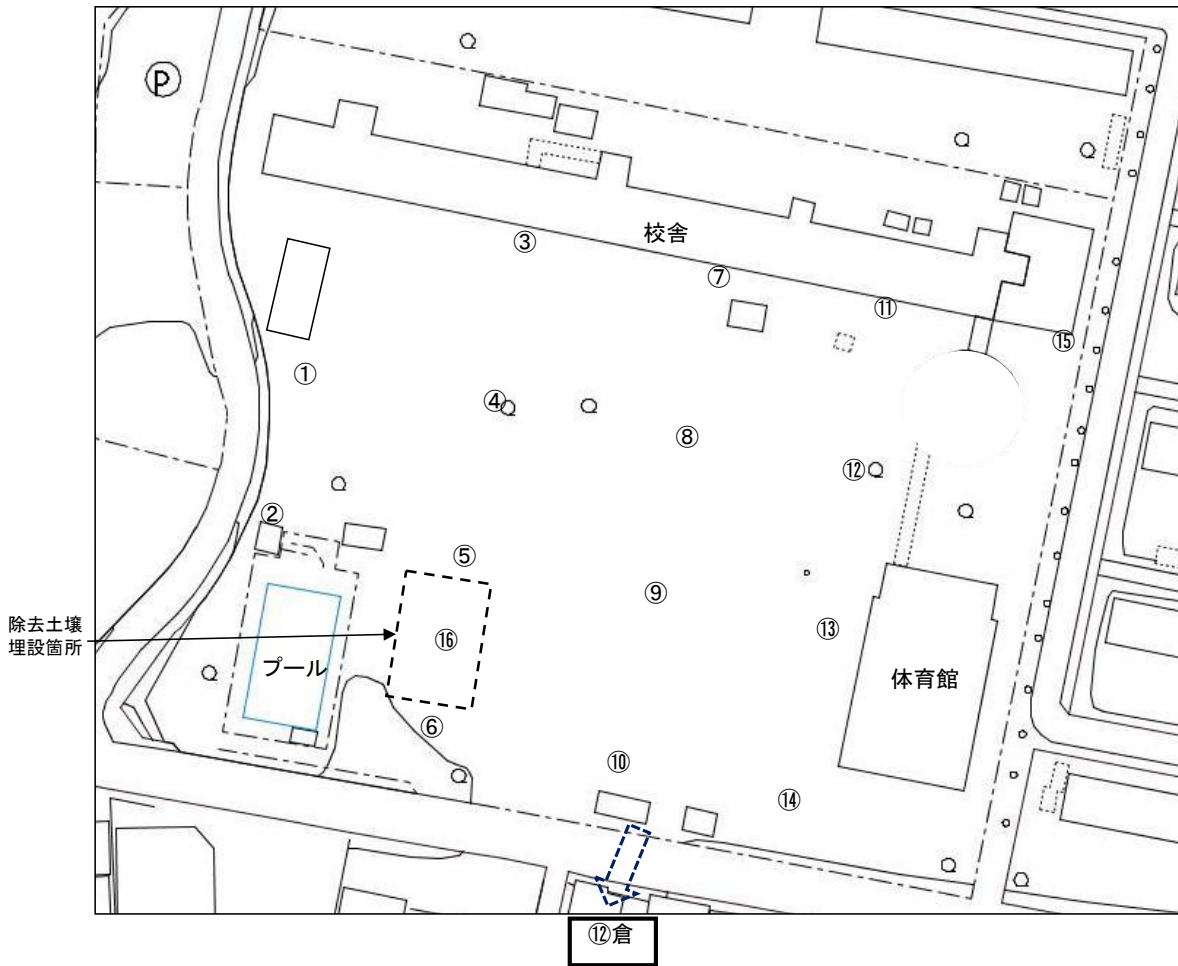

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月1日(前回:令和元年5月30日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	こどもルーム前	土	0.057	0.052	0.065	0.087	0.079	0.112
②	プール横	土	0.066	0.084	0.067	0.084	0.067	0.066
③	校舎前	土	0.053	0.054	0.053	0.065	0.050	0.038
④	グラウンド	土	0.029	0.053	0.039	0.059	0.042	0.080
⑤	グラウンド	土	0.026	0.029	0.037	0.028	0.032	0.033
⑥	グラウンド	土	0.070	0.052	0.094	0.050	0.118	0.052
⑦	校舎前	土	0.060	0.059	0.049	0.061	0.059	0.076
⑧	グラウンド	土	0.061	0.054	0.058	0.071	0.042	0.050
⑨	グラウンド	土	0.039	0.030	0.046	0.035	0.045	0.049
⑩	グラウンド	土	0.048	0.054	0.026	0.054	0.044	0.056
⑪	校舎前	アスファルト	0.075	0.058	0.055	0.060	0.046	0.054
⑫	グラウンド	土	0.045	0.050	0.057	0.052	0.049	0.035
⑬	グラウンド	土	0.047	0.054	0.040	0.056	0.042	0.043
⑭	グラウンド	土	0.060	0.049	0.055	0.042	0.052	0.055
⑮	校舎前	アスファルト	0.099	0.073	0.077	0.082	0.091	0.075
⑯	グラウンド	土	0.039	0.032	0.043	0.039	0.036	0.030
平均			0.055	0.052	0.054	0.058	0.056	0.057

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
