


## 放射線量マップ【土小学校】

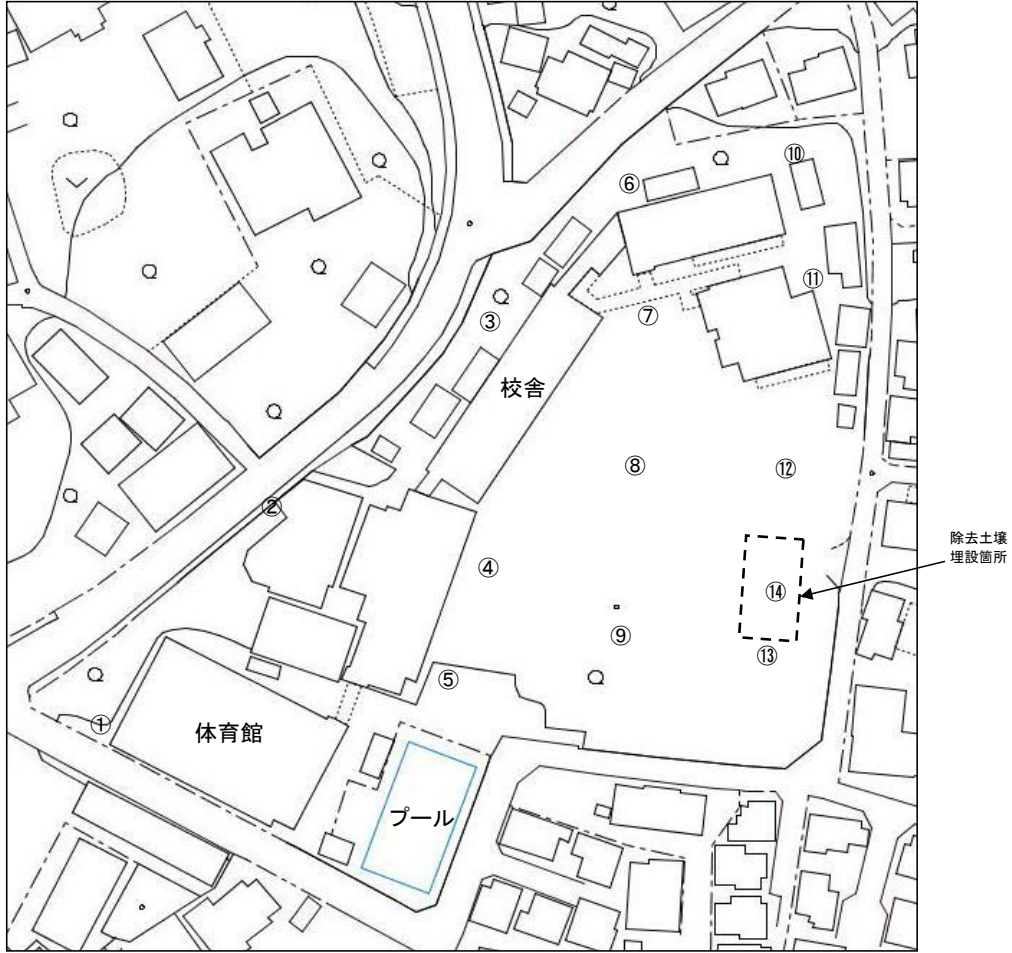

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月15日(前回:令和元年5月24日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館横	土	0.054	0.046	0.054	0.056	0.061	0.057
②	校舎前	アスファルト	0.052	0.053	0.061	0.045	0.065	0.056
③	校舎前	土	0.068	0.065	0.073	0.084	0.078	0.078
④	グラウンド	土	0.052	0.064	0.055	0.069	0.043	0.076
⑤	グラウンド	池横の芝	0.066	0.038	0.079	0.041	0.088	0.053
⑥	校舎裏	土	0.079	0.079	0.082	0.089	0.087	0.088
⑦	校舎前	土	0.076	0.073	0.107	0.068	0.177	0.075
⑧	グラウンド	土	0.038	0.041	0.042	0.039	0.053	0.054
⑨	グラウンド	土	0.043	0.061	0.056	0.060	0.050	0.055
⑩	グラウンド	土	0.064	0.076	0.067	0.087	0.061	0.094
⑪	校舎前	土	0.086	0.070	0.078	0.076	0.072	0.065
⑫	グラウンド	アスファルト	0.045	0.066	0.043	0.074	0.050	0.077
⑬	グラウンド	土	0.049	0.051	0.041	0.062	0.051	0.056
⑭	グラウンド	土	0.034	0.050	0.048	0.049	0.053	0.050
平均			0.058	0.060	0.063	0.064	0.071	0.067

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
