


放射線量マップ【柏第七小学校】

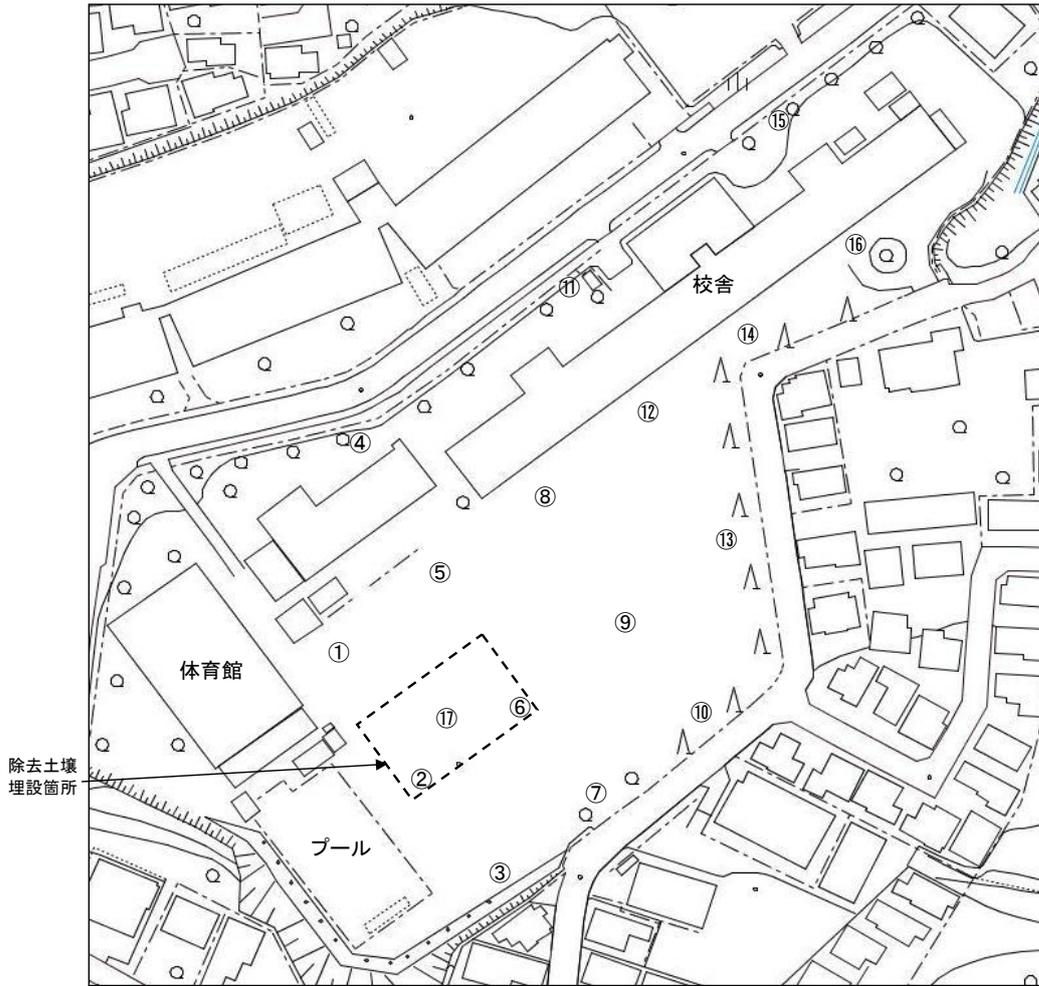

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月 1日(前回:令和元年5月20日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.046	0.042	0.038	0.051	0.057	0.040
②	グラウンド	土	0.046	0.037	0.047	0.045	0.051	0.038
③	グラウンド	土	0.052	0.039	0.040	0.046	0.045	0.038
④	校舎裏	土	0.084	0.072	0.079	0.080	0.076	0.084
⑤	グラウンド	土	0.054	0.056	0.056	0.051	0.047	0.054
⑥	グラウンド	土	0.047	0.040	0.060	0.037	0.063	0.043
⑦	グラウンド	側溝	0.062	0.046	0.048	0.050	0.066	0.043
⑧	校舎前	土	0.052	0.057	0.046	0.063	0.048	0.051
⑨	グラウンド	土	0.052	0.061	0.054	0.059	0.062	0.042
⑩	グラウンド	土	0.044	0.035	0.063	0.041	0.065	0.045
⑪	校舎裏	土	0.078	0.077	0.091	0.095	0.091	0.080
⑫	校舎前	土	0.053	0.060	0.051	0.050	0.059	0.048
⑬	グラウンド	土	0.041	0.057	0.050	0.062	0.054	0.066
⑭	校舎前	アスファルト	0.082	0.091	0.072	0.087	0.074	0.085
⑮	校舎裏	土	0.074	0.072	0.101	0.083	0.126	0.077
⑯	校舎前	アスファルト	0.056	0.078	0.039	0.102	0.046	0.085
⑰	グラウンド	土	0.055	0.029	0.045	0.037	0.039	0.055
平均			0.058	0.056	0.058	0.061	0.063	0.057

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
