


放射線量マップ【旭小学校】

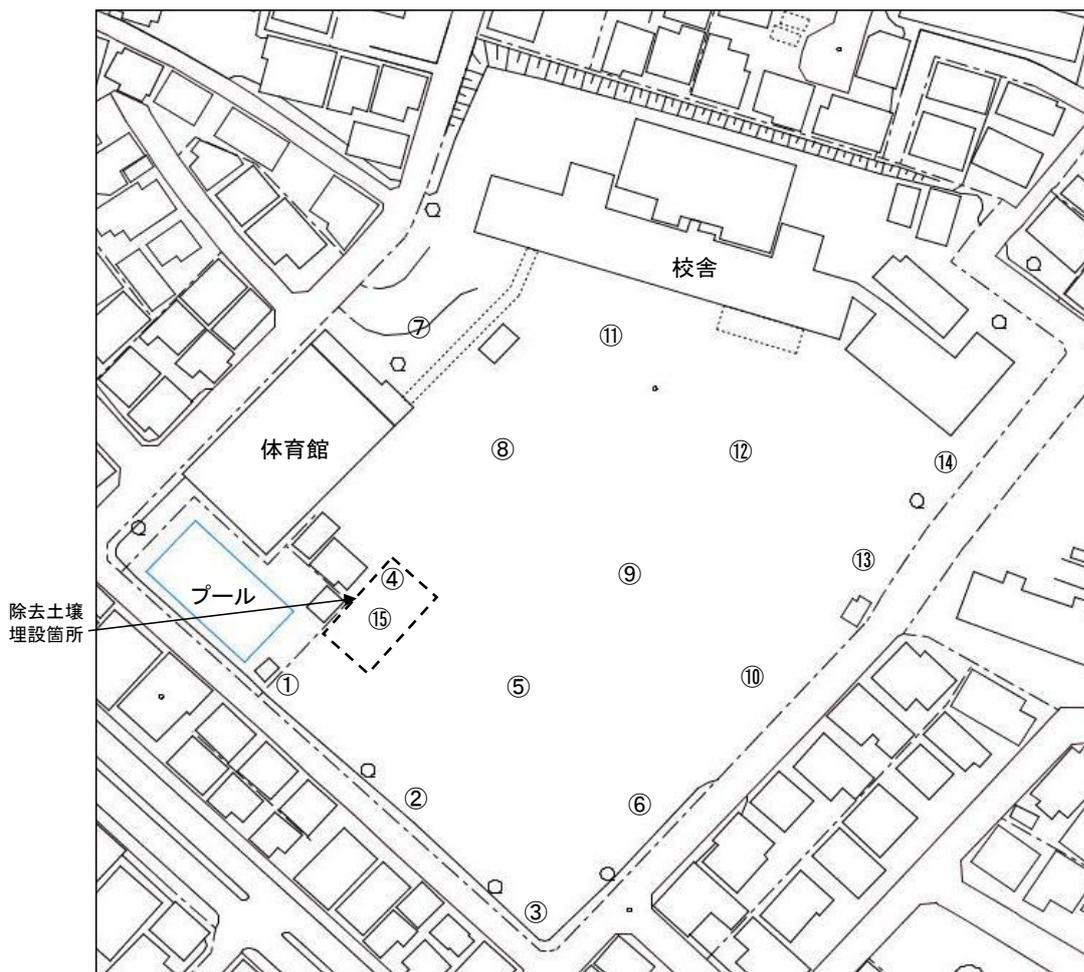

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月1日(前回:令和元年5月30日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール横	樋	0.052	0.080	0.045	0.091	0.050	0.098
②	グラウンド	土	0.057	0.050	0.058	0.051	0.039	0.050
③	グラウンド	土	0.047	0.053	0.051	0.039	0.037	0.042
④	グラウンド	土	0.032	0.032	0.040	0.041	0.022	0.042
⑤	グラウンド	土	0.038	0.034	0.048	0.043	0.056	0.034
⑥	グラウンド	土	0.058	0.037	0.036	0.043	0.047	0.039
⑦	通路	アスファルト	0.053	0.050	0.047	0.053	0.048	0.051
⑧	グラウンド	土	0.037	0.034	0.031	0.037	0.050	0.041
⑨	グラウンド	土	0.037	0.033	0.025	0.032	0.031	0.044
⑩	グラウンド	土	0.044	0.046	0.057	0.043	0.049	0.041
⑪	グラウンド	土	0.061	0.037	0.040	0.042	0.051	0.035
⑫	グラウンド	土	0.042	0.029	0.032	0.040	0.044	0.035
⑬	グラウンド	土	0.042	0.045	0.052	0.029	0.035	0.057
⑭	校舎横	側溝	0.081	0.043	0.062	0.056	0.071	0.071
⑮	グラウンド	土	0.039	0.035	0.035	0.034	0.039	0.046
平均			0.048	0.043	0.044	0.045	0.045	0.048

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
