


放射線量マップ【藤心小学校】

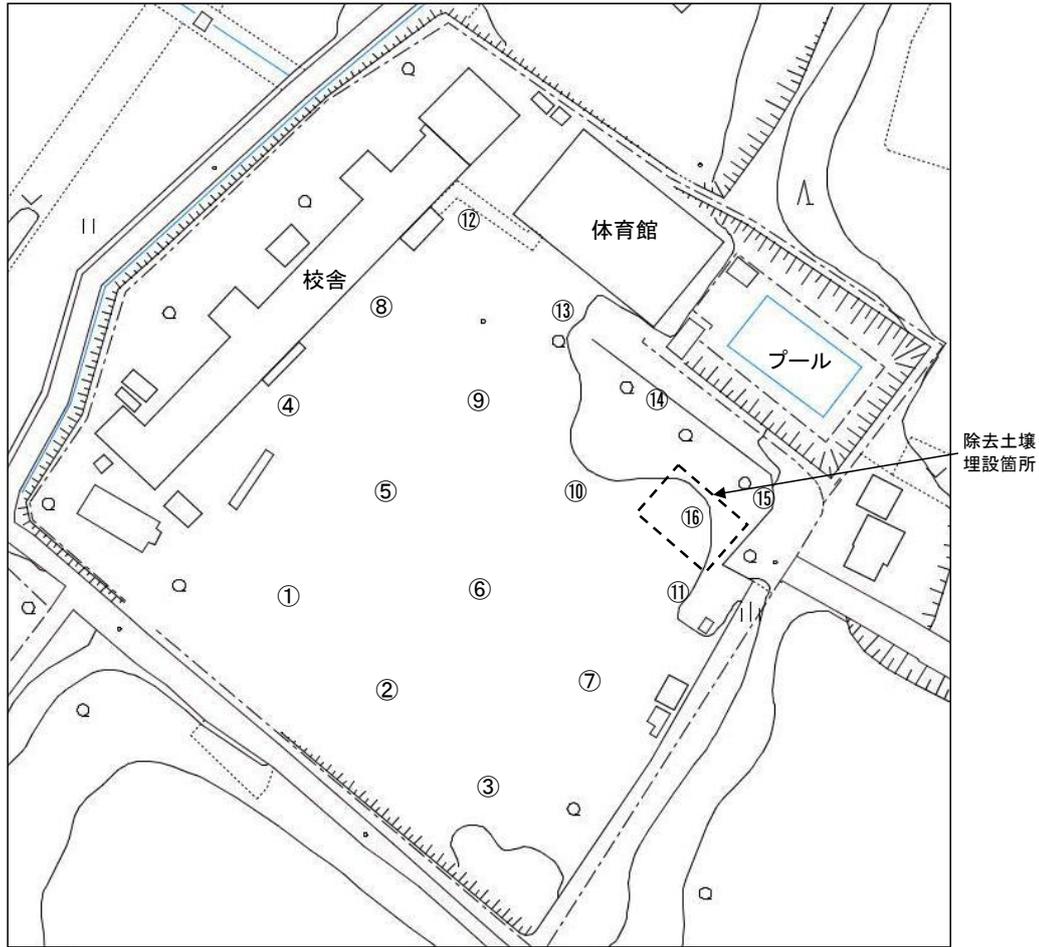

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:令和元年11月7日(前回:令和元年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.030	0.040	0.029	0.030	0.020	0.022
②	グラウンド	土	0.037	0.039	0.035	0.024	0.036	0.029
③	グラウンド	土	0.024	0.043	0.024	0.027	0.024	0.044
④	グラウンド	土	0.059	0.035	0.050	0.044	0.045	0.031
⑤	グラウンド	土	0.047	0.025	0.027	0.027	0.026	0.037
⑥	グラウンド	土	0.034	0.026	0.023	0.043	0.028	0.038
⑦	グラウンド	土	0.073	0.030	0.024	0.028	0.040	0.034
⑧	グラウンド	舗装	0.041	0.044	0.036	0.044	0.041	0.040
⑨	グラウンド	土	0.039	0.030	0.030	0.026	0.032	0.026
⑩	グラウンド	土	0.036	0.044	0.030	0.041	0.048	0.042
⑪	グラウンド	土	0.032	0.046	0.034	0.047	0.055	0.048
⑫	グラウンド	舗装	0.059	0.060	0.055	0.054	0.055	0.045
⑬	グラウンド	土	0.048	0.039	0.045	0.042	0.040	0.038
⑭	グラウンド	土	0.050	0.037	0.056	0.036	0.057	0.034
⑮	グラウンド	土	0.030	0.026	0.053	0.042	0.043	0.049
⑯	グラウンド	土	0.034	0.035	0.027	0.053	0.030	0.039
平均			0.042	0.037	0.036	0.038	0.039	0.037

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
