


放射線量マップ【高田小学校】

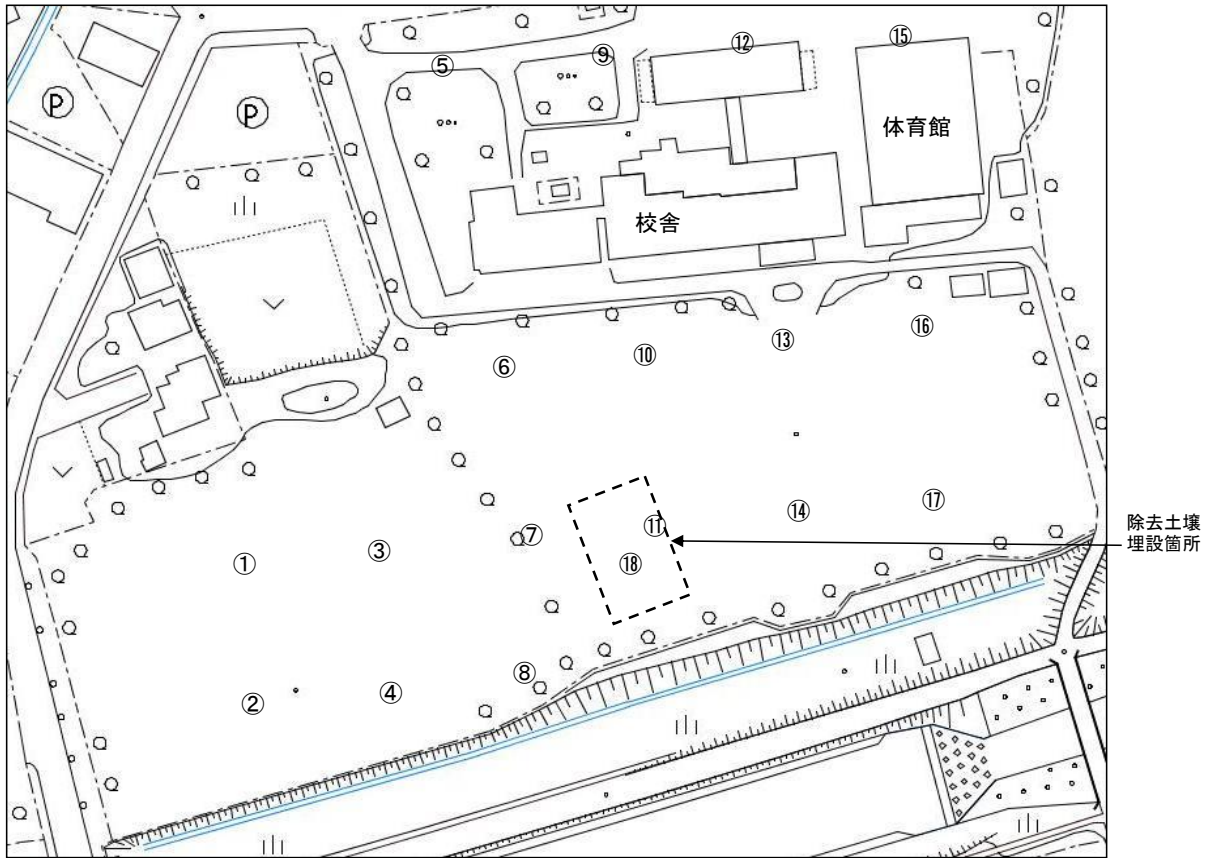

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月1日(前回:令和元年5月14日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.042	0.059	0.059	0.057	0.058	0.059
②	グラウンド	土	0.056	0.063	0.046	0.057	0.068	0.054
③	グラウンド	土	0.050	0.037	0.047	0.044	0.064	0.053
④	グラウンド	土	0.049	0.050	0.043	0.040	0.053	0.045
⑤	花壇付近	土	0.039	0.049	0.057	0.060	0.045	0.069
⑥	グラウンド	土	0.029	0.028	0.031	0.045	0.042	0.028
⑦	グラウンド	土	0.039	0.037	0.045	0.051	0.041	0.053
⑧	グラウンド	土	0.054	0.034	0.060	0.030	0.065	0.046
⑨	花壇脇	土	0.060	0.053	0.051	0.058	0.056	0.062
⑩	グラウンド	土	0.044	0.038	0.037	0.031	0.058	0.028
⑪	グラウンド	土	0.051	0.030	0.029	0.038	0.042	0.021
⑫	校舎裏	土	0.076	0.048	0.073	0.044	0.072	0.042
⑬	グラウンド	土	0.035	0.036	0.039	0.039	0.046	0.036
⑭	グラウンド	土	0.047	0.040	0.052	0.028	0.056	0.028
⑮	体育館裏	土	0.043	0.050	0.060	0.050	0.077	0.036
⑯	グラウンド	土	0.034	0.042	0.036	0.048	0.040	0.028
⑰	グラウンド	土	0.032	0.040	0.042	0.043	0.034	0.057
⑱	グラウンド	土	0.026	0.037	0.030	0.032	0.032	0.045
平均			0.045	0.043	0.047	0.044	0.053	0.044

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
