


### 放射線量マップ【逆井小学校】

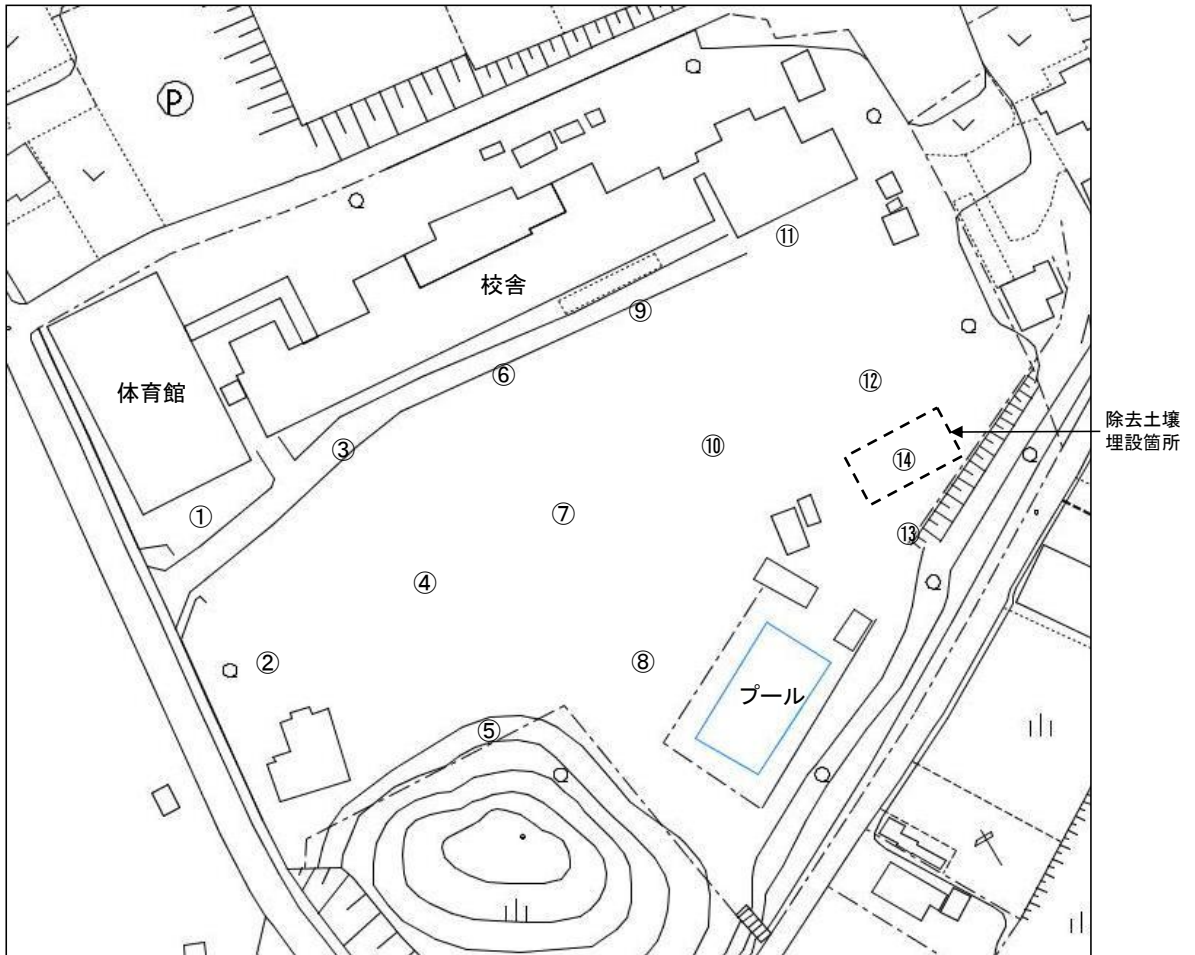

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:令和元年11月 11日(前回:令和元年5月24日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土  | 0.074   | 0.045 | 0.072 | 0.063 | 0.084  | 0.053 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.048   | 0.061 | 0.049 | 0.060 | 0.038  | 0.061 |
| ③    | グラウンド | 舗装 | 0.046   | 0.039 | 0.043 | 0.036 | 0.040  | 0.039 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.043   | 0.047 | 0.035 | 0.056 | 0.036  | 0.058 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.065   | 0.070 | 0.067 | 0.075 | 0.070  | 0.077 |
| ⑥    | グラウンド | 舗装 | 0.048   | 0.052 | 0.052 | 0.045 | 0.039  | 0.042 |
| ⑦    | グラウンド | 土  | 0.042   | 0.064 | 0.028 | 0.053 | 0.032  | 0.053 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.070   | 0.048 | 0.071 | 0.053 | 0.068  | 0.046 |
| ⑨    | グラウンド | 舗装 | 0.044   | 0.049 | 0.044 | 0.052 | 0.056  | 0.063 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.062   | 0.059 | 0.080 | 0.060 | 0.074  | 0.056 |
| ⑪    | グラウンド | 舗装 | 0.052   | 0.046 | 0.055 | 0.051 | 0.047  | 0.051 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.050   | 0.047 | 0.050 | 0.050 | 0.060  | 0.052 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.051   | 0.061 | 0.066 | 0.059 | 0.055  | 0.058 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.040   | 0.047 | 0.040 | 0.052 | 0.036  | 0.054 |
| 平均   |       |    | 0.053   | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.053  | 0.055 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
