


### 放射線量マップ【花野井小学校】

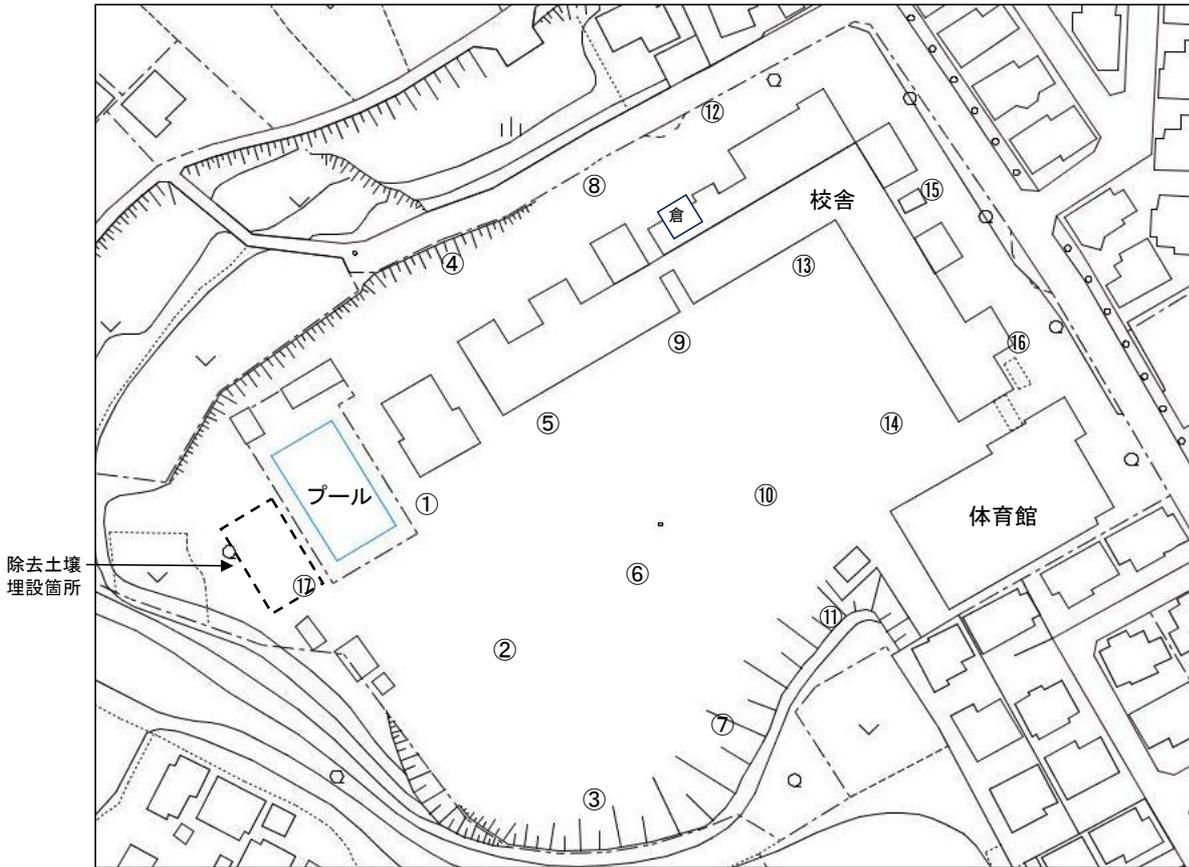

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月21日(前回:令和元年5月24日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール前	土	0.071	0.077	0.065	0.071	0.083	0.066
②	グラウンド	土	0.056	0.063	0.048	0.068	0.035	0.065
③	グラウンド	土	0.052	0.057	0.063	0.066	0.052	0.062
④	校舎裏	土	0.088	0.054	0.086	0.044	0.106	0.046
⑤	校舎前	土	0.054	0.061	0.045	0.079	0.055	0.097
⑥	グラウンド	土	0.041	0.052	0.046	0.050	0.028	0.051
⑦	グラウンド	土	0.067	0.082	0.076	0.065	0.074	0.073
⑧	校舎裏	アスファルト	0.036	0.047	0.055	0.046	0.041	0.047
⑨	校舎前	土	0.042	0.059	0.060	0.061	0.052	0.049
⑩	グラウンド	土	0.043	0.050	0.067	0.052	0.042	0.055
⑪	グラウンド	土	0.056	0.077	0.055	0.061	0.054	0.060
⑫	校舎裏	アスファルト	0.065	0.083	0.085	0.080	0.090	0.082
⑬	校舎前	土	0.065	0.089	0.056	0.095	0.050	0.130
⑭	グラウンド	土	0.050	0.048	0.061	0.049	0.059	0.058
⑮	校舎裏	アスファルト	0.042	0.071	0.054	0.053	0.060	0.059
⑯	校舎裏	アスファルト	0.062	0.056	0.062	0.052	0.063	0.045
⑰	プール裏	土	0.056	0.077	0.066	0.077	0.063	0.060
平均			0.056	0.065	0.062	0.063	0.059	0.065

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
