


放射線量マップ【手賀東小学校】

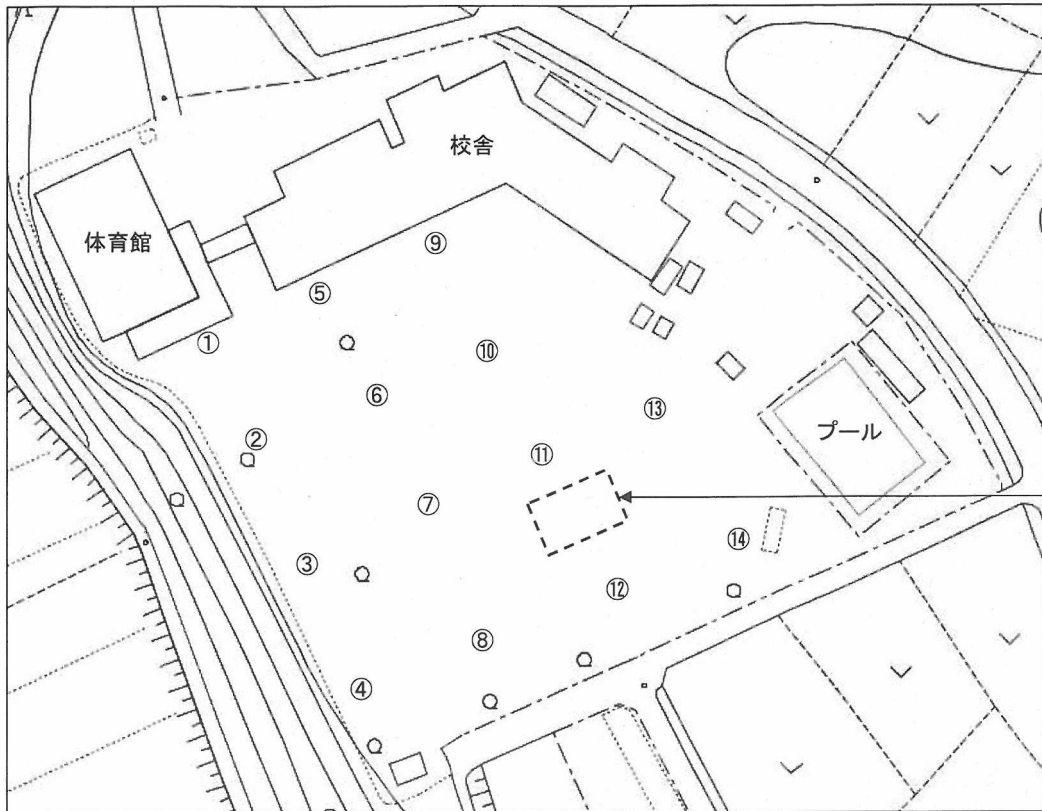

○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成25年5月7日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標	
			100cm		5cm	
			今回	今回	今回	
①	グラウンド	土	0.094	0.114	0.077	
②	グラウンド	土	0.087	0.088	0.092	
③	グラウンド	土	0.098	0.118	0.097	
④	グラウンド	土	0.059	0.075	0.070	
⑤	グラウンド	舗装	0.084	0.078	0.078	
⑥	グラウンド	土	0.046	0.062	0.041	
⑦	グラウンド	土	0.044	0.049	0.046	
⑧	グラウンド	土	0.049	0.078	0.078	
⑨	グラウンド	舗装	0.082	0.069	0.069	
⑩	グラウンド	土	0.046	0.045	0.042	
⑪	グラウンド	土	0.049	0.038	0.045	
⑫	グラウンド	土	0.043	0.055	0.044	
⑬	グラウンド	土	0.042	0.041	0.042	
⑭	グラウンド	土	0.037	0.037	0.038	
平均			0.061	0.068	0.061	

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
