


放射線量マップ【逆井中学校】

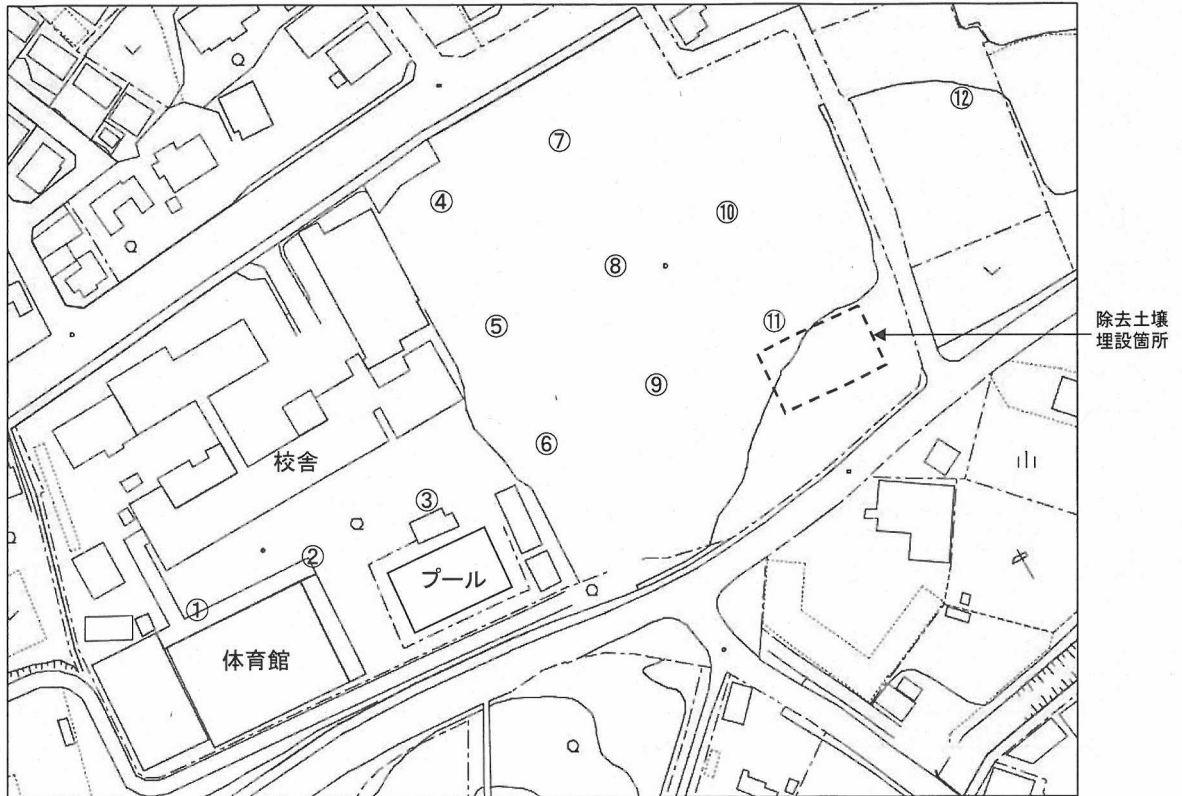

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年5月7日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回		今回		今回	
①	体育館前	土	0.100		0.093		0.108	
②	体育館前	舗装	0.066		0.067		0.060	
③	プール前	土	0.117		0.140		0.138	
④	グラウンド	土	0.086		0.095		0.098	
⑤	グラウンド	土	0.081		0.082		0.104	
⑥	グラウンド	土	0.097		0.109		0.091	
⑦	グラウンド	土	0.089		0.078		0.079	
⑧	グラウンド	土	0.093		0.090		0.099	
⑨	グラウンド	土	0.078		0.096		0.084	
⑩	グラウンド	土	0.063		0.062		0.084	
⑪	グラウンド	土	0.079		0.090		0.099	
⑫	テニスコート	土	0.073		0.081		0.063	
平均			0.085		0.090		0.092	

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
