


放射線量マップ【富勢西小学校】

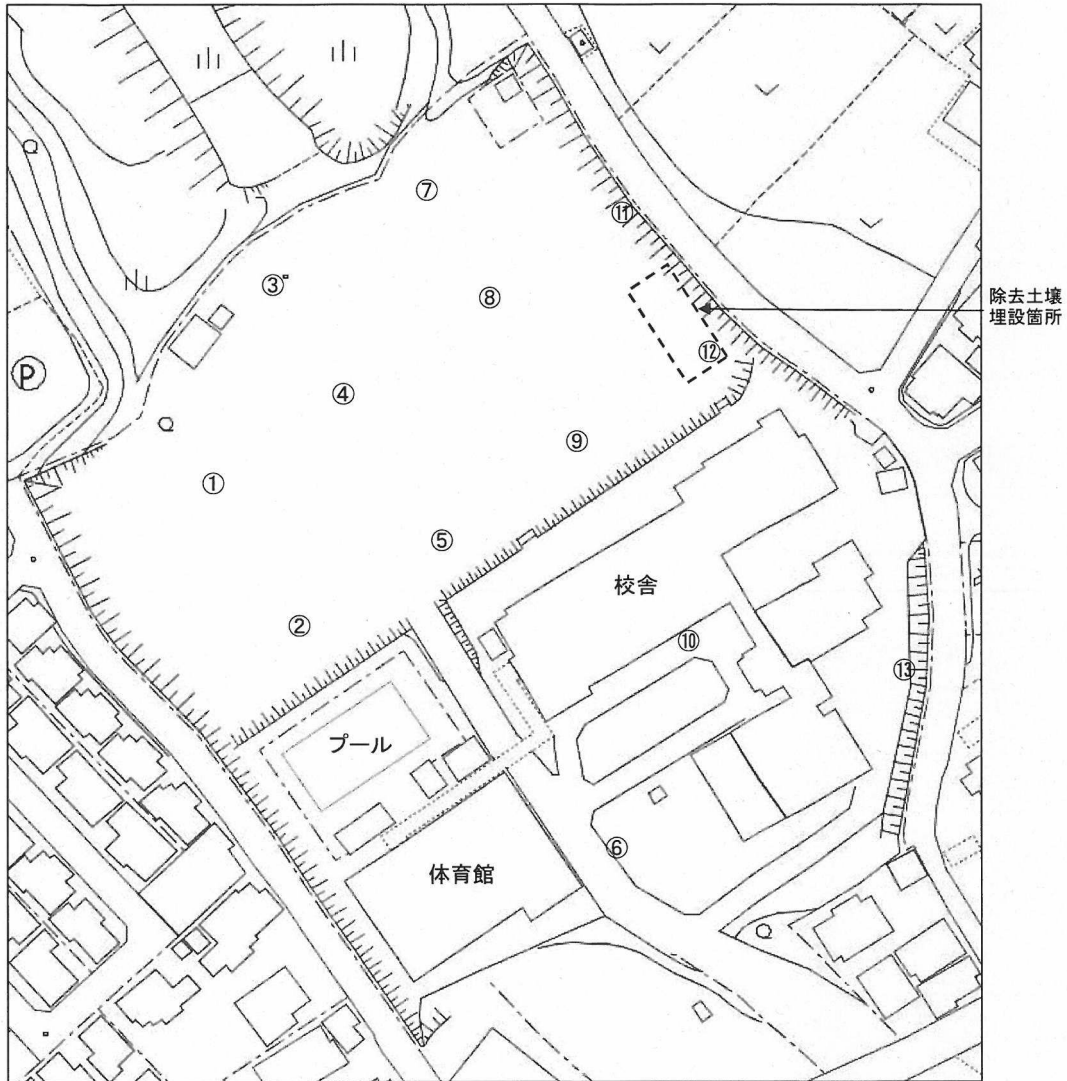

○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成25年8月2日(前回:平成25年5月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.097	0.101	0.101	0.088	0.104	0.095
②	グラウンド	土	0.074	0.084	0.083	0.082	0.092	0.073
③	グラウンド	土	0.093	0.117	0.088	0.095	0.100	0.102
④	グラウンド	土	0.080	0.075	0.080	0.094	0.086	0.071
⑤	グラウンド	土	0.076	0.125	0.090	0.124	0.083	0.133
⑥	通路端	土	0.114	0.155	0.099	0.156	0.101	0.206
⑦	グラウンド	土	0.083	0.071	0.096	0.054	0.086	0.049
⑧	グラウンド	土	0.058	0.066	0.082	0.075	0.058	0.062
⑨	グラウンド	土	0.092	0.096	0.085	0.077	0.078	0.076
⑩	校舎前	土	0.094	0.091	0.095	0.096	0.080	0.083
⑪	グラウンド	土	0.115	0.126	0.125	0.120	0.103	0.155
⑫	校舎前	土	0.080	0.091	0.087	0.102	0.092	0.095
⑬	校舎横	土	0.114	0.139	0.125	0.106	0.105	0.136
平均			0.090	0.103	0.095	0.098	0.090	0.103

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
