


放射線量マップ【十余二小学校】

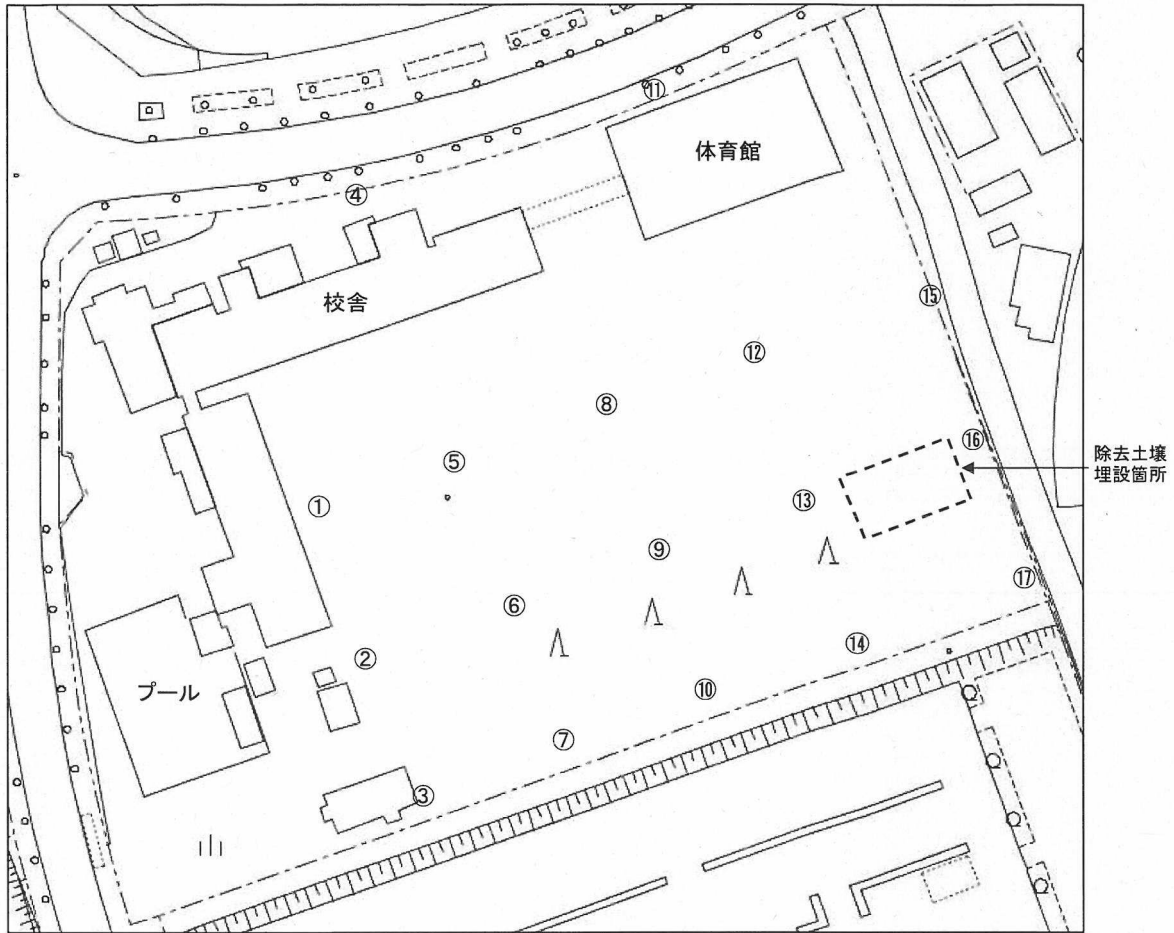

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年8月1日(前回:平成25年5月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.068	0.067	0.063	0.060	0.073	0.061
②	グラウンド	土	0.068	0.073	0.067	0.081	0.061	0.081
③	グラウンド	土	0.110	0.100	0.111	0.111	0.104	0.112
④	校舎裏	アスファルト	0.082	0.088	0.070	0.089	0.064	0.073
⑤	グラウンド	土	0.099	0.097	0.095	0.121	0.088	0.092
⑥	グラウンド	土	0.086	0.067	0.061	0.080	0.077	0.063
⑦	グラウンド	土	0.078	0.111	0.064	0.102	0.082	0.088
⑧	グラウンド	土	0.100	0.071	0.094	0.091	0.079	0.078
⑨	グラウンド	土	0.104	0.085	0.084	0.093	0.101	0.085
⑩	グラウンド	土	0.093	0.129	0.081	0.093	0.084	0.108
⑪	体育館裏	土	0.092	0.090	0.091	0.086	0.083	0.079
⑫	グラウンド	土	0.082	0.075	0.087	0.063	0.085	0.071
⑬	グラウンド	土	0.073	0.070	0.060	0.065	0.070	0.082
⑭	グラウンド	土	0.088	0.110	0.086	0.121	0.081	0.118
⑮	グラウンド	土	0.071	0.094	0.079	0.092	0.068	0.070
⑯	グラウンド	土	0.117	0.096	0.110	0.107	0.119	0.092
⑰	グラウンド	土	0.117	0.125	0.097	0.127	0.074	0.111
平均			0.090	0.091	0.082	0.093	0.082	0.086

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
