


放射線量マップ【高柳中学校】

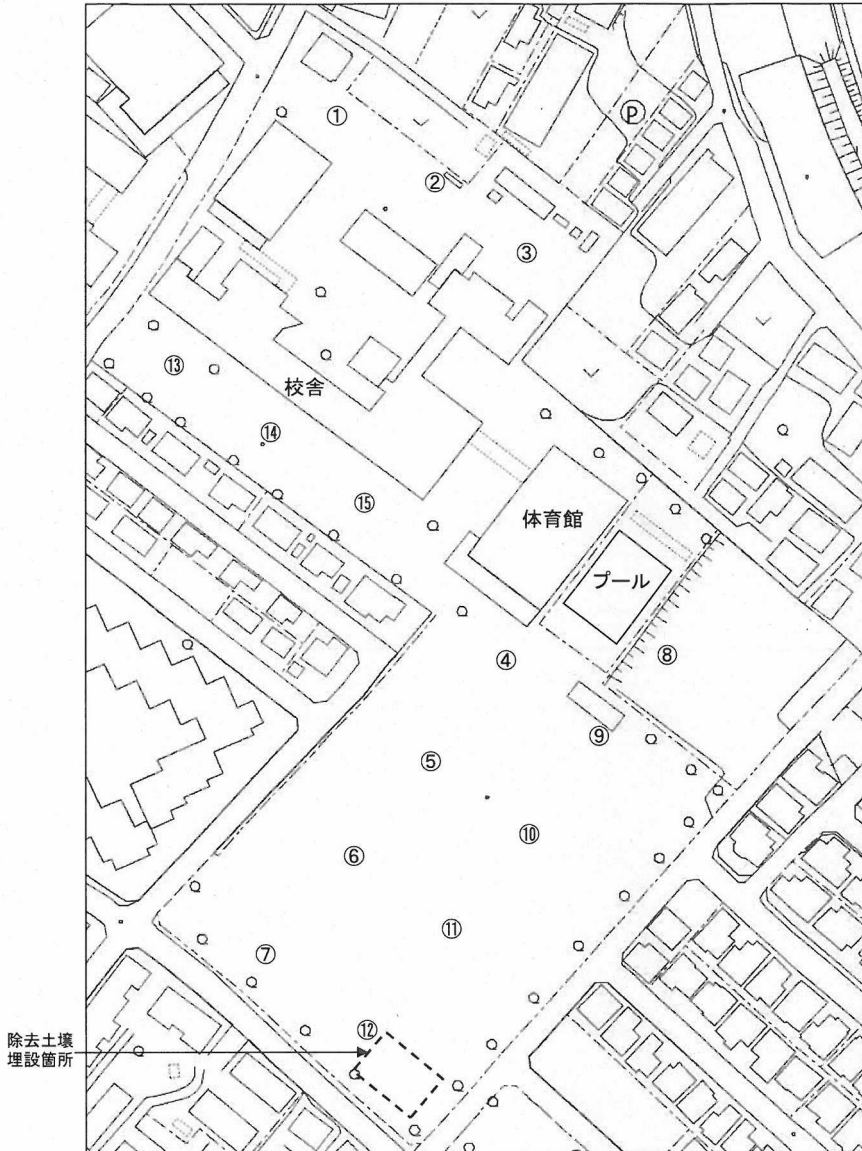

○除染完了日:平成25年1月15日

○測定日:平成25年8月14日(前回:平成25年5月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	通路	舗装	0.081	0.077	0.098	0.080	0.113	0.078
②	通路	舗装	0.073	0.083	0.094	0.088	0.098	0.078
③	通路	舗装	0.079	0.093	0.075	0.081	0.088	0.078
④	グラウンド	土	0.068	0.070	0.051	0.050	0.056	0.058
⑤	グラウンド	土	0.076	0.070	0.074	0.060	0.081	0.055
⑥	グラウンド	土	0.045	0.068	0.056	0.080	0.067	0.064
⑦	グラウンド	土	0.079	0.102	0.063	0.118	0.072	0.082
⑧	グラウンド	土	0.066	0.086	0.058	0.084	0.066	0.065
⑨	グラウンド	土	0.079	0.075	0.079	0.083	0.097	0.067
⑩	グラウンド	土	0.086	0.099	0.085	0.108	0.073	0.130
⑪	グラウンド	土	0.064	0.077	0.083	0.062	0.075	0.062
⑫	グラウンド	土	0.059	0.065	0.052	0.056	0.053	0.080
⑬	通路	舗装	0.079	0.089	0.079	0.100	0.092	0.091
⑭	通路	舗装	0.073	0.085	0.055	0.088	0.076	0.079
⑮	通路	舗装	0.070	0.075	0.063	0.077	0.075	0.072
平均			0.072	0.081	0.071	0.081	0.079	0.076

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
