


放射線量マップ【柏第三小学校】

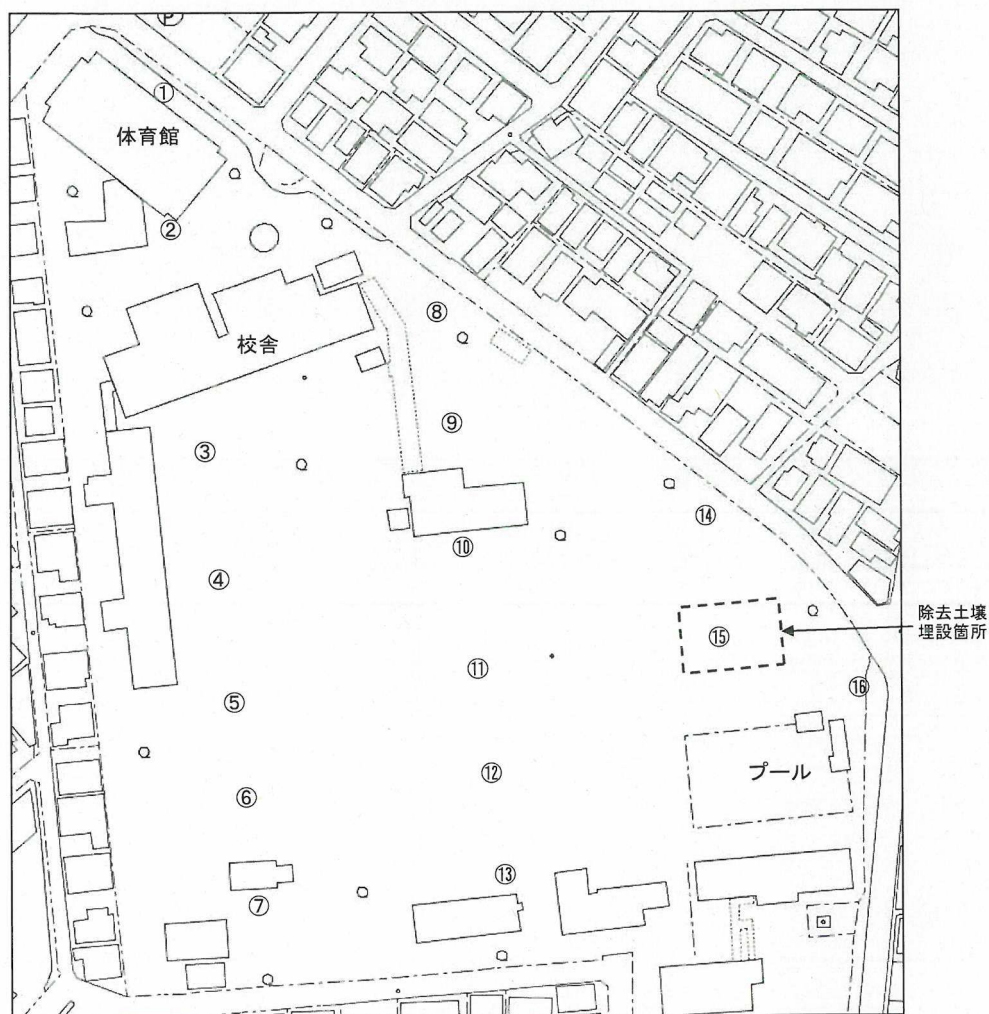

○除染完了日:平成24年3月29日

○測定日:平成25年11月1日(前回:平成25年8月2日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館周り	アスファルト	0.087	0.084	0.090	0.102	0.077	0.103
②	体育館周り	アスファルト	0.088	0.104	0.113	0.108	0.093	0.098
③	校舎前	土	0.053	0.060	0.055	0.063	0.053	0.060
④	グラウンド	土	0.047	0.043	0.053	0.055	0.040	0.055
⑤	グラウンド	土	0.037	0.036	0.040	0.044	0.044	0.044
⑥	グラウンド	土	0.048	0.037	0.039	0.057	0.040	0.055
⑦	グラウンド	土	0.087	0.103	0.091	0.124	0.076	0.161
⑧	グラウンド隅	アスファルト	0.065	0.088	0.059	0.058	0.078	0.098
⑨	グラウンド	土	0.066	0.081	0.102	0.102	0.067	0.100
⑩	校舎前	土	0.060	0.070	0.059	0.083	0.046	0.068
⑪	グラウンド	土	0.039	0.031	0.040	0.037	0.028	0.049
⑫	グラウンド	土	0.029	0.031	0.034	0.033	0.040	0.035
⑬	グラウンド	土	0.056	0.079	0.051	0.086	0.030	0.088
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.071	0.081	0.078	0.068	0.071	0.088
⑮	グラウンド	土	0.054	0.051	0.051	0.051	0.051	0.052
⑯	プール横	アスファルト	0.072	0.062	0.061	0.060	0.066	0.077
平均			0.060	0.065	0.064	0.071	0.056	0.077

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
