


放射線量マップ【西原小学校】

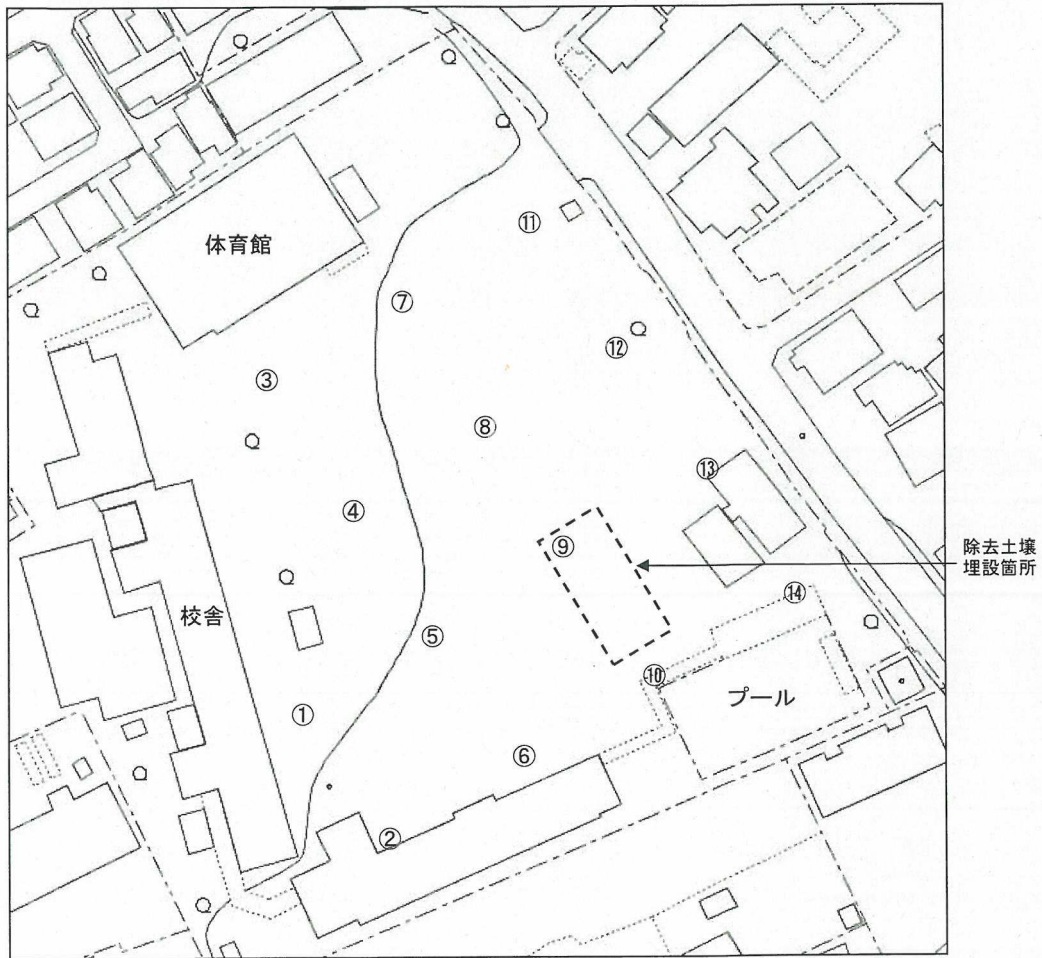

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成25年11月12日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土  | 0.071   | 0.062 | 0.084 | 0.054 | 0.079  | 0.052 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.067   | 0.075 | 0.074 | 0.088 | 0.072  | 0.071 |
| ③    | グラウンド | 舗装 | 0.075   | 0.081 | 0.066 | 0.071 | 0.052  | 0.063 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.034   | 0.038 | 0.043 | 0.052 | 0.045  | 0.039 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.042   | 0.030 | 0.031 | 0.042 | 0.061  | 0.034 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.060   | 0.059 | 0.050 | 0.050 | 0.051  | 0.049 |
| ⑦    | グラウンド | 舗装 | 0.045   | 0.060 | 0.054 | 0.054 | 0.052  | 0.054 |
| ⑧    | グラウンド | 土  | 0.033   | 0.036 | 0.029 | 0.053 | 0.045  | 0.038 |
| ⑨    | グラウンド | 土  | 0.045   | 0.039 | 0.026 | 0.046 | 0.030  | 0.044 |
| ⑩    | グラウンド | 土  | 0.050   | 0.057 | 0.051 | 0.071 | 0.044  | 0.053 |
| ⑪    | グラウンド | 舗装 | 0.064   | 0.074 | 0.063 | 0.073 | 0.058  | 0.069 |
| ⑫    | グラウンド | 土  | 0.044   | 0.058 | 0.047 | 0.061 | 0.050  | 0.054 |
| ⑬    | グラウンド | 土  | 0.053   | 0.055 | 0.055 | 0.061 | 0.052  | 0.051 |
| ⑭    | グラウンド | 土  | 0.065   | 0.054 | 0.067 | 0.084 | 0.059  | 0.065 |
| 平均   |       |    | 0.053   | 0.056 | 0.053 | 0.061 | 0.054  | 0.053 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
