


# 放射線量マップ【増尾西小学校】

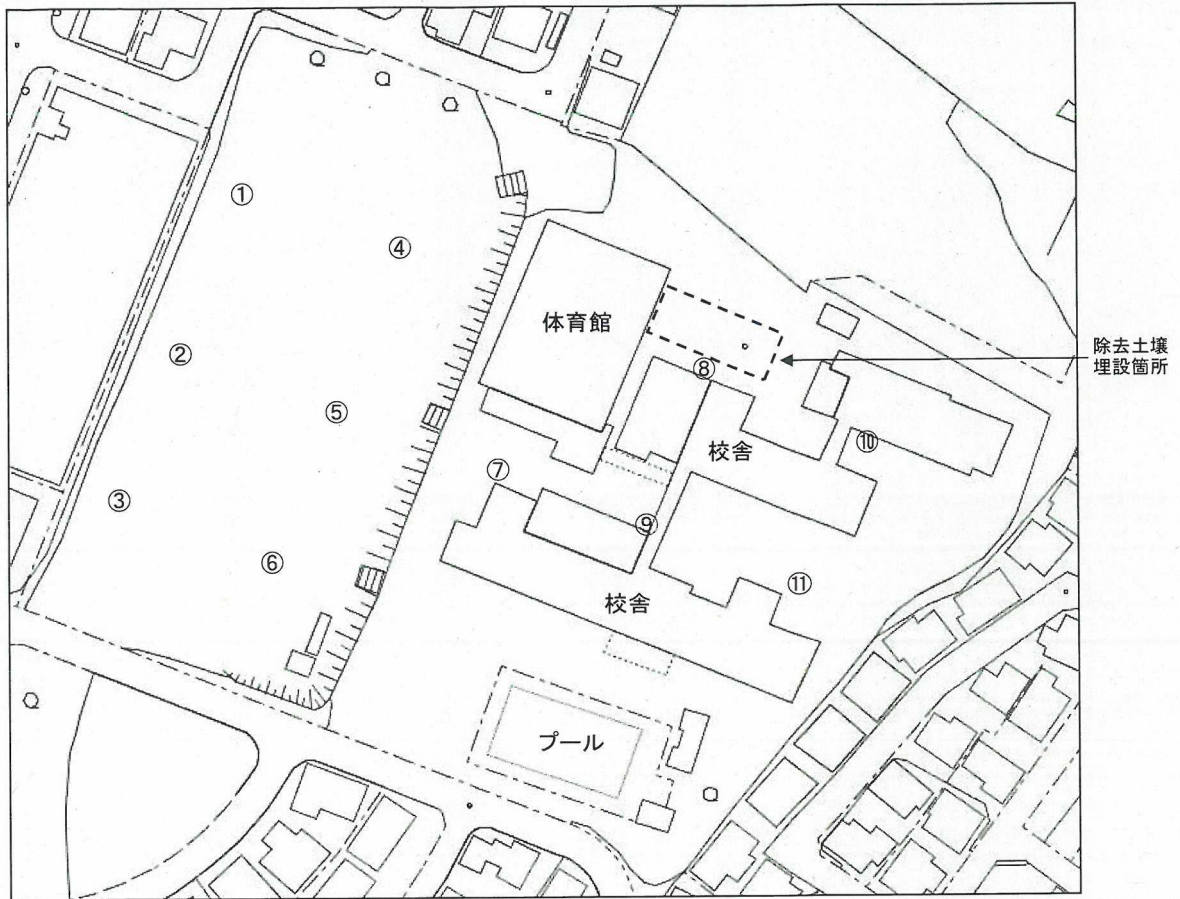

○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成25年11月11日(前回:平成25年8月13日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |       |    | ※1環境省基準 |       |       |       | ※2柏市目標 |       |
|------|-------|----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      |       |    | 100cm   |       | 50cm  |       | 5cm    |       |
|      |       |    | 今回      | 前回    | 今回    | 前回    | 今回     | 前回    |
| ①    | グラウンド | 土  | 0.074   | 0.080 | 0.098 | 0.104 | 0.095  | 0.091 |
| ②    | グラウンド | 土  | 0.095   | 0.109 | 0.082 | 0.124 | 0.091  | 0.077 |
| ③    | グラウンド | 土  | 0.081   | 0.086 | 0.090 | 0.093 | 0.088  | 0.090 |
| ④    | グラウンド | 土  | 0.095   | 0.090 | 0.087 | 0.117 | 0.093  | 0.095 |
| ⑤    | グラウンド | 土  | 0.082   | 0.093 | 0.091 | 0.109 | 0.085  | 0.085 |
| ⑥    | グラウンド | 土  | 0.072   | 0.086 | 0.082 | 0.097 | 0.084  | 0.068 |
| ⑦    | 校舎前   | 舗装 | 0.059   | 0.065 | 0.059 | 0.079 | 0.059  | 0.052 |
| ⑧    | 校舎前   | 土  | 0.052   | 0.062 | 0.070 | 0.072 | 0.069  | 0.075 |
| ⑨    | 校舎前   | 舗装 | 0.073   | 0.075 | 0.063 | 0.104 | 0.077  | 0.075 |
| ⑩    | 校舎前   | 土  | 0.092   | 0.102 | 0.120 | 0.131 | 0.158  | 0.163 |
| ⑪    | 校舎前   | 土  | 0.085   | 0.108 | 0.088 | 0.134 | 0.071  | 0.132 |
| 平均   |       |    | 0.078   | 0.087 | 0.085 | 0.106 | 0.088  | 0.091 |

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
