


放射線量マップ【花野井小学校】

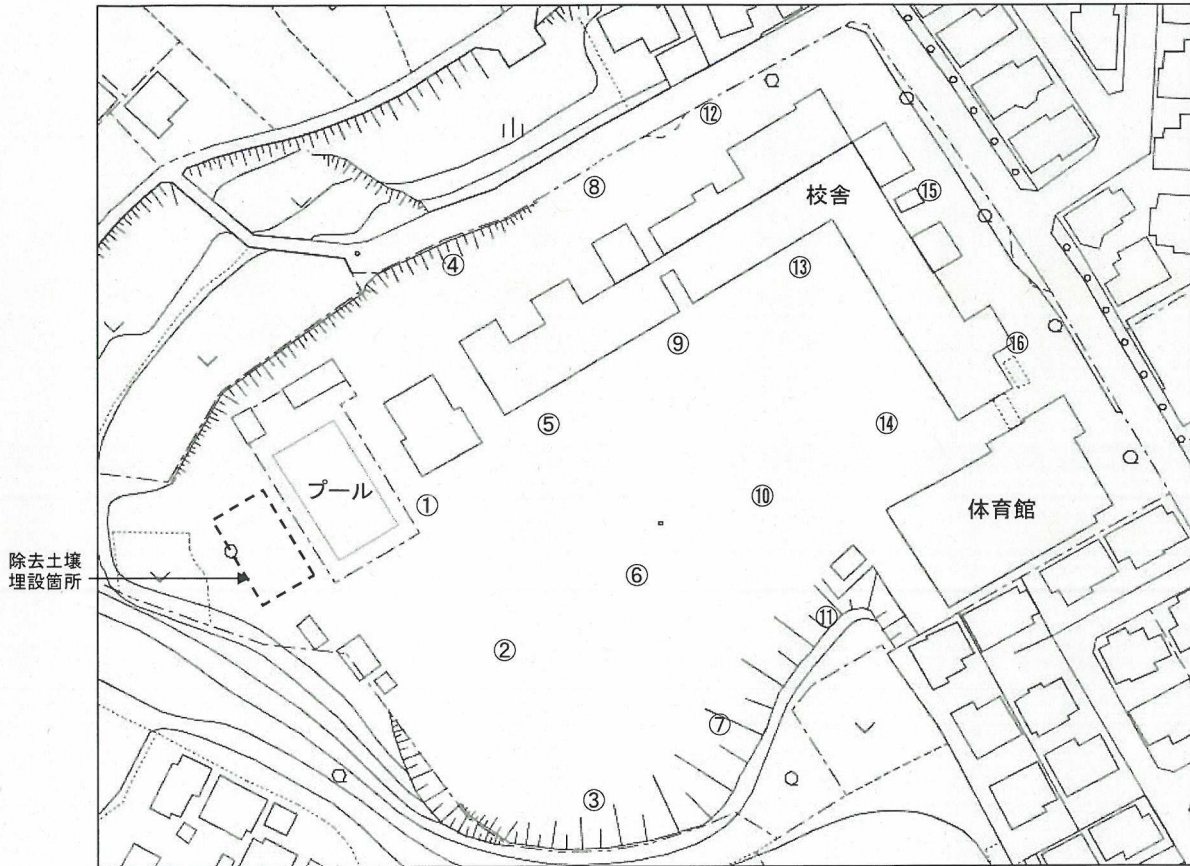

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成25年11月12日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	プール前	土	0.100	0.105	0.102	0.096	0.126	0.114
②	グラウンド	土	0.072	0.068	0.082	0.061	0.071	0.075
③	グラウンド	土	0.058	0.101	0.063	0.099	0.047	0.160
④	校舎裏	土	0.083	0.108	0.086	0.087	0.089	0.109
⑤	校舎前	土	0.051	0.079	0.060	0.078	0.051	0.125
⑥	グラウンド	土	0.057	0.064	0.062	0.062	0.040	0.059
⑦	グラウンド	土	0.090	0.121	0.099	0.130	0.097	0.135
⑧	校舎裏	アスファルト	0.071	0.084	0.078	0.088	0.068	0.075
⑨	校舎前	土	0.054	0.057	0.066	0.069	0.063	0.064
⑩	グラウンド	土	0.048	0.067	0.053	0.071	0.057	0.049
⑪	グラウンド	土	0.086	0.088	0.095	0.084	0.084	0.088
⑫	校舎裏	アスファルト	0.122	0.105	0.127	0.129	0.132	0.156
⑬	校舎前	土	0.064	0.082	0.069	0.097	0.048	0.083
⑭	グラウンド	土	0.055	0.076	0.058	0.084	0.050	0.078
⑮	校舎裏	アスファルト	0.076	0.091	0.090	0.081	0.075	0.098
⑯	校舎裏	アスファルト	0.080	0.088	0.078	0.071	0.084	0.082
平均			0.073	0.087	0.079	0.087	0.074	0.097

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
