


放射線量マップ【十余二小学校】

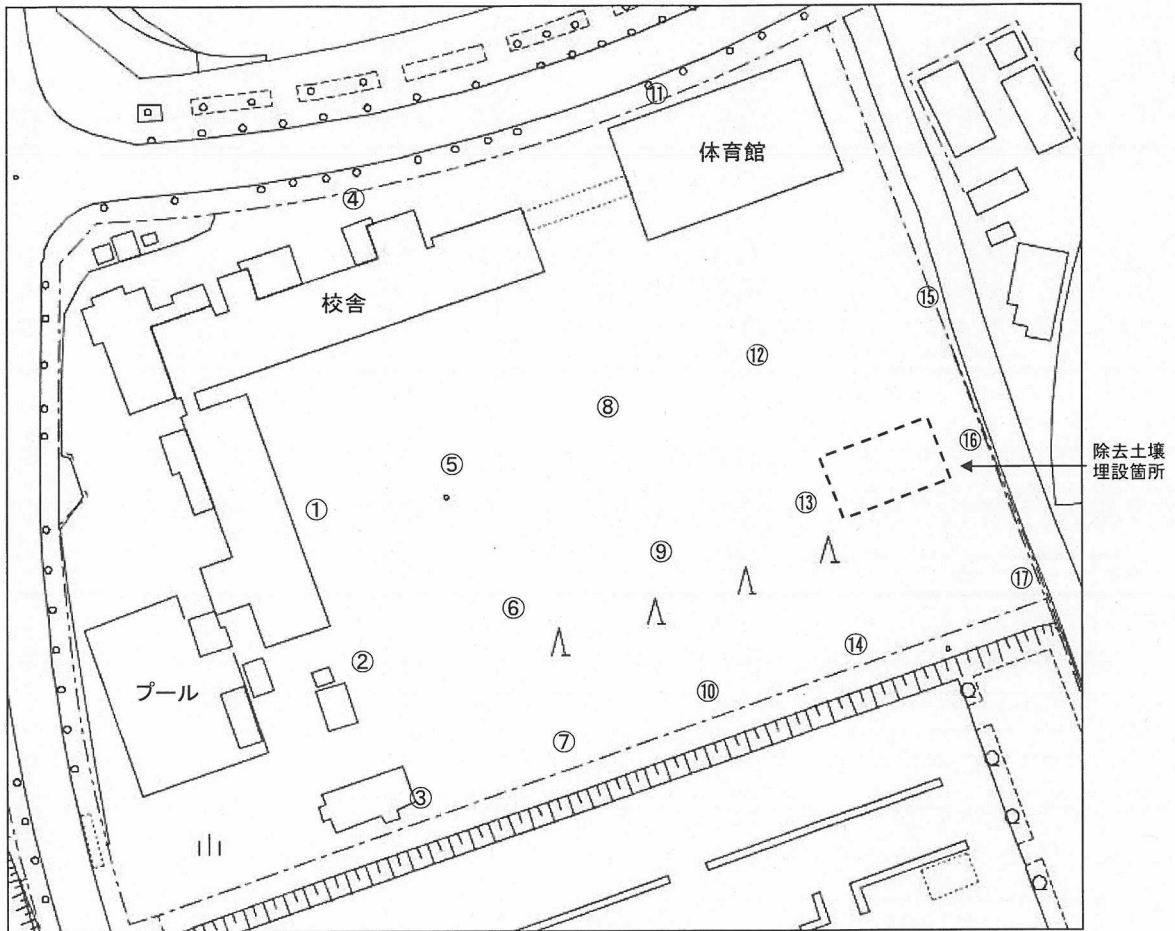

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成26年2月7日(前回:平成25年11月12日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.060	0.064	0.066	0.069	0.057	0.067
②	グラウンド	土	0.063	0.055	0.058	0.052	0.048	0.052
③	グラウンド	土	0.086	0.101	0.105	0.089	0.079	0.097
④	校舎裏	アスファルト	0.067	0.066	0.060	0.056	0.059	0.044
⑤	グラウンド	土	0.080	0.078	0.109	0.070	0.131	0.065
⑥	グラウンド	土	0.074	0.069	0.067	0.081	0.070	0.083
⑦	グラウンド	土	0.076	0.093	0.067	0.068	0.073	0.071
⑧	グラウンド	土	0.070	0.062	0.083	0.087	0.058	0.088
⑨	グラウンド	土	0.089	0.085	0.115	0.088	0.125	0.100
⑩	グラウンド	土	0.063	0.087	0.088	0.094	0.069	0.074
⑪	体育館裏	土	0.070	0.079	0.077	0.074	0.073	0.102
⑫	グラウンド	土	0.054	0.068	0.081	0.085	0.077	0.064
⑬	グラウンド	土	0.061	0.063	0.080	0.076	0.077	0.055
⑭	グラウンド	土	0.079	0.070	0.094	0.073	0.070	0.085
⑮	グラウンド	土	0.061	0.056	0.070	0.065	0.066	0.064
⑯	グラウンド	土	0.098	0.108	0.073	0.113	0.077	0.111
⑰	グラウンド	土	0.093	0.099	0.088	0.101	0.106	0.101
平均			0.073	0.077	0.081	0.079	0.077	0.078

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
