


放射線量マップ【大津ヶ丘第二小学校】

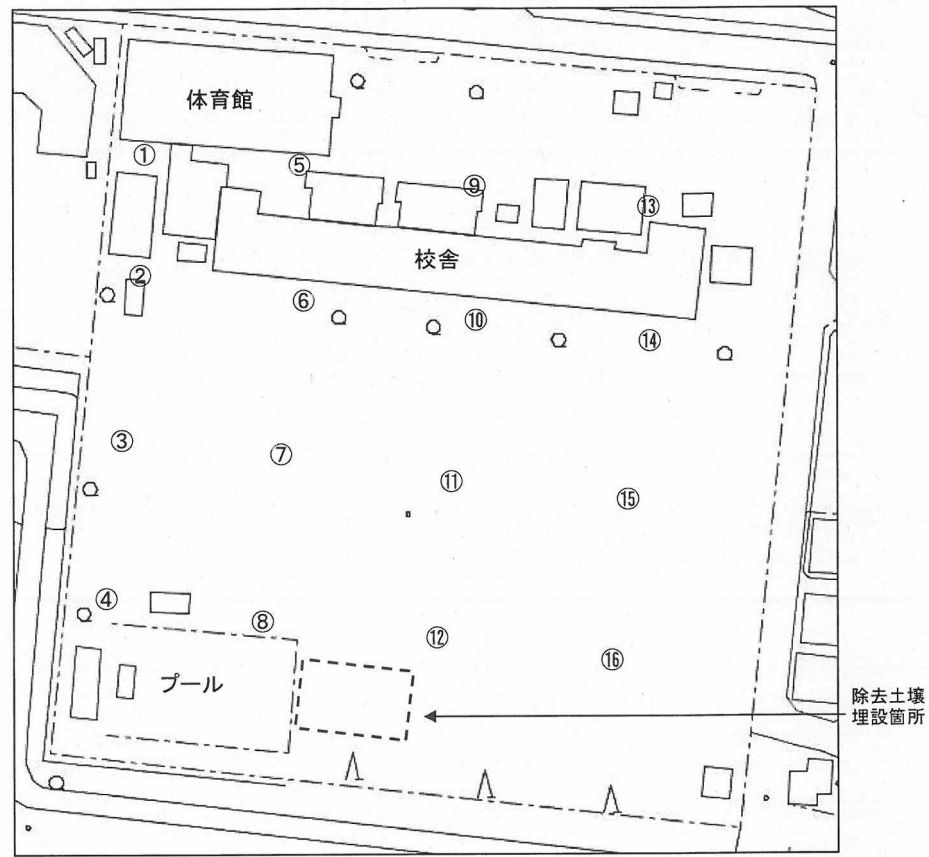

○除染完了日:平成24年7月12日

○測定日:平成26年2月6日(前回:平成25年11月8日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	土	0.074	0.093	0.084	0.109	0.077	0.081
②	グラウンド	土	0.033	0.049	0.044	0.044	0.044	0.055
③	グラウンド	土	0.059	0.046	0.054	0.057	0.059	0.052
④	グラウンド	土	0.060	0.068	0.068	0.087	0.061	0.080
⑤	校舎裏	舗装	0.070	0.084	0.081	0.087	0.078	0.076
⑥	グラウンド	土	0.031	0.063	0.054	0.050	0.050	0.043
⑦	グラウンド	土	0.028	0.037	0.039	0.044	0.040	0.047
⑧	グラウンド	土	0.049	0.059	0.033	0.070	0.042	0.067
⑨	校舎裏	舗装	0.077	0.116	0.120	0.127	0.149	0.125
⑩	グラウンド	土	0.048	0.045	0.042	0.053	0.059	0.041
⑪	グラウンド	土	0.046	0.044	0.042	0.043	0.045	0.047
⑫	グラウンド	土	0.043	0.066	0.047	0.062	0.051	0.053
⑬	校舎裏	土	0.078	0.088	0.098	0.067	0.091	0.081
⑭	グラウンド	土	0.045	0.055	0.055	0.052	0.050	0.047
⑮	グラウンド	土	0.061	0.059	0.050	0.052	0.060	0.060
⑯	グラウンド	土	0.068	0.041	0.079	0.046	0.058	0.049
平均			0.054	0.063	0.062	0.066	0.063	0.063

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
