


除染後放射線量マップ【富勢小学校】

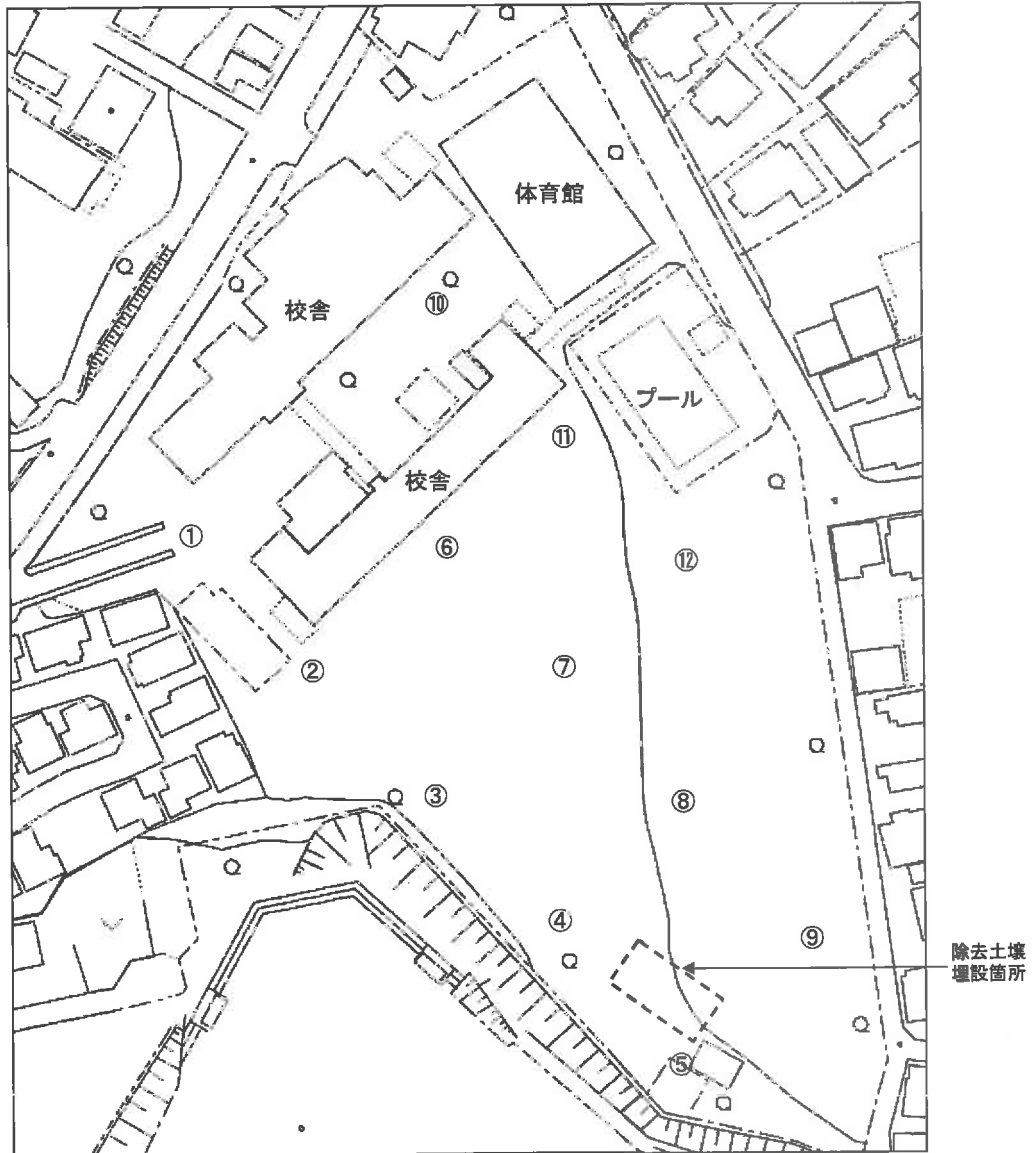

除去土壌
埋設箇所

○除染前測定日:平成24年6月26日

○除染後測定日:平成24年8月17日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	舗装	0.149	0.132	0.153	0.135	0.164	0.136
②	グラウンド	土	0.094	0.076	0.099	0.065	0.079	0.069
③	グラウンド	土	0.133	0.068	0.136	0.071	0.147	0.066
④	グラウンド	土	0.138	0.073	0.114	0.072	0.108	0.067
⑤	グラウンド	土	0.222	0.090	0.260	0.087	0.353	0.087
⑥	グラウンド	土	0.167	0.051	0.117	0.059	0.140	0.050
⑦	グラウンド	土	0.157	0.058	0.137	0.067	0.133	0.055
⑧	グラウンド	土	0.159	0.062	0.157	0.057	0.144	0.066
⑨	グラウンド	土	0.202	0.064	0.202	0.060	0.213	0.057
⑩	校舎裏	舗装	0.130	0.077	0.129	0.081	0.122	0.085
⑪	グラウンド	土	0.133	0.056	0.118	0.060	0.098	0.057
⑫	グラウンド	土	0.194	0.103	0.233	0.092	0.284	0.102
平均			0.157	0.078	0.155	0.076	0.165	0.075

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
